



年月日	2024. 9. 27
工事部位	倉庫D棟
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2024. 9. 27
工事部位	倉庫D棟
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2024. 9. 27
工事部位	倉庫D棟
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を高圧水洗浄



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	小屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を 高圧水洗浄



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	重量シャッター
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすとともに高圧水洗 浄で落とせなかった不純物 を除去し、細かい傷をつけて 塗装下地の足付け作業の実 施



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	同上




年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	破風
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	同上



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根、破風
使用材料	ハイボン20ファイン 色:ブラウン色
工事内容	材料搬入 16 ^{キロ} ×20セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ハイボン20ファイン
工事内容	先行塗り
備考	ローラーで塗れない箇所を刷毛で先行塗り

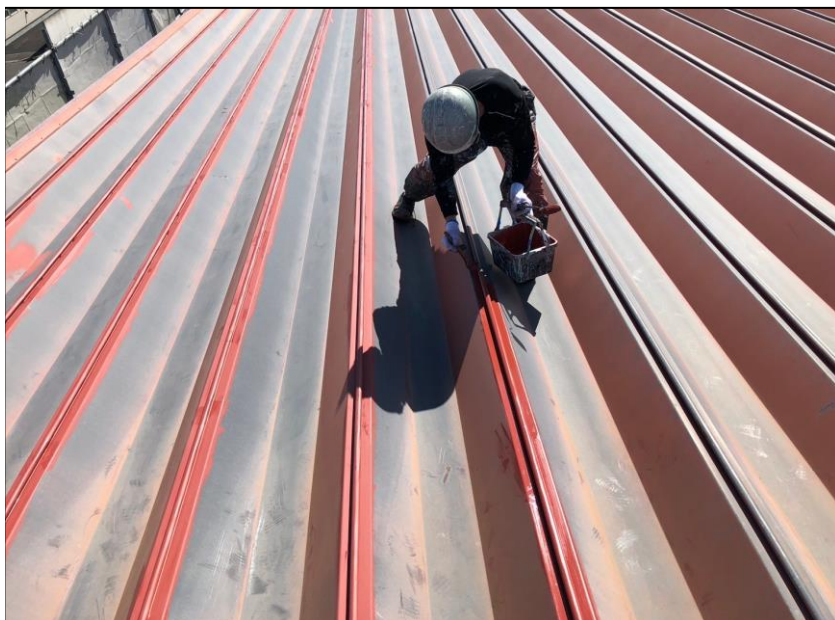


年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ハイボン20ファイン
工事内容	先行塗り
備考	同上




年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	補修塗り

備考 錆びていた箇所もタッチアップ塗装を行い、塗膜の膜厚確保

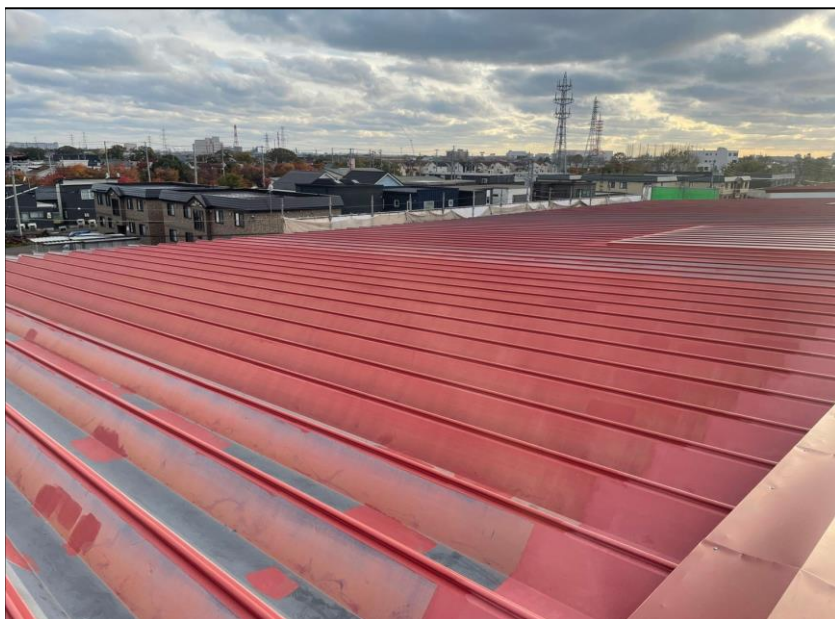

年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	先行塗り 補修塗り

備考 完了

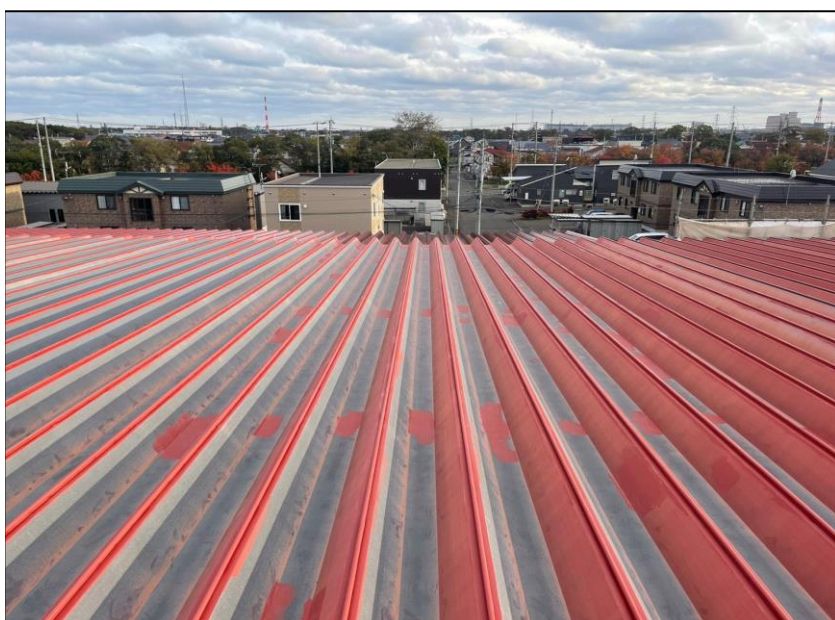


年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	先行塗り 補修塗り

備考 完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	

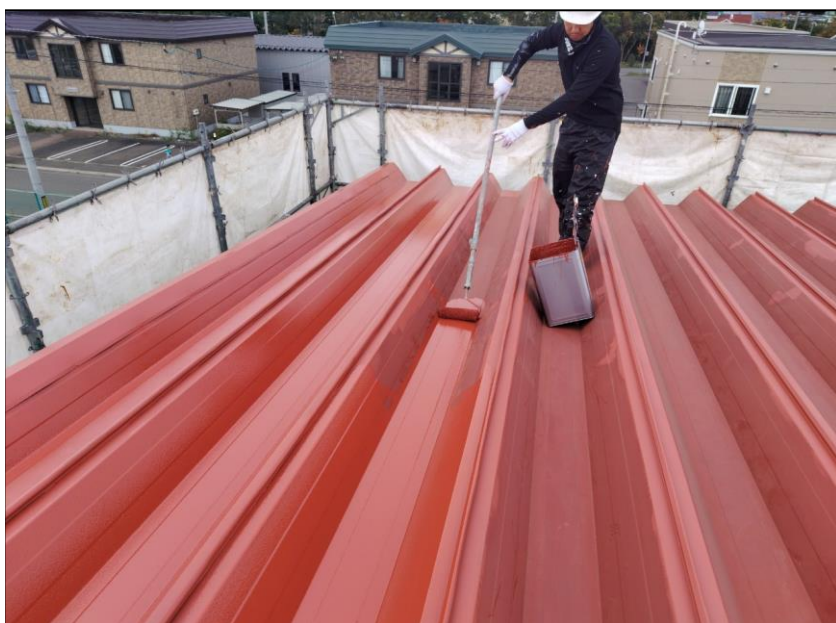

年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	破風
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了




年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	破風
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根、破風
使用材料	ファインルーフSI 色番:サニーレッド
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×20セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂ト タン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用に より、優れた耐候性及び耐 久性を発揮します。

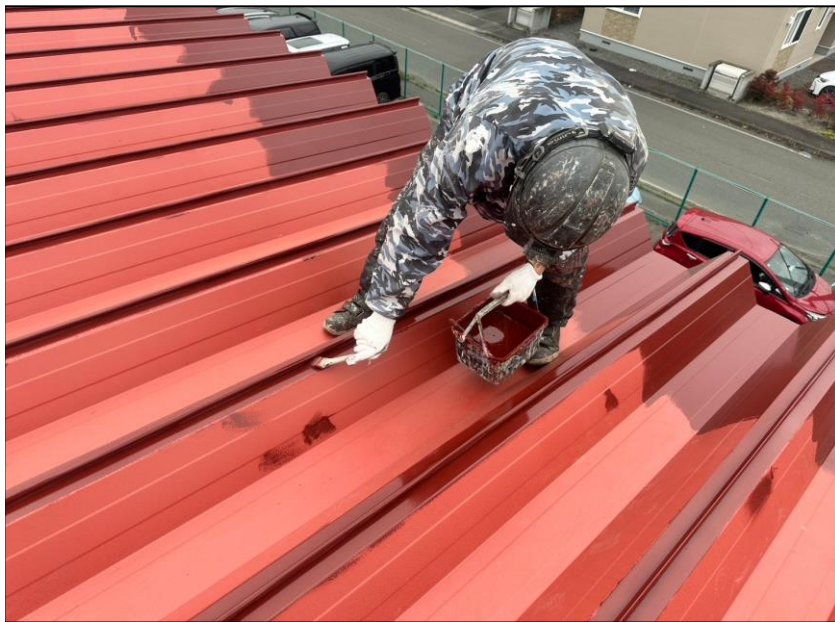

年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	先行塗り
備考	




年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	先行塗り
備考	



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	先行塗り
備考	




年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	

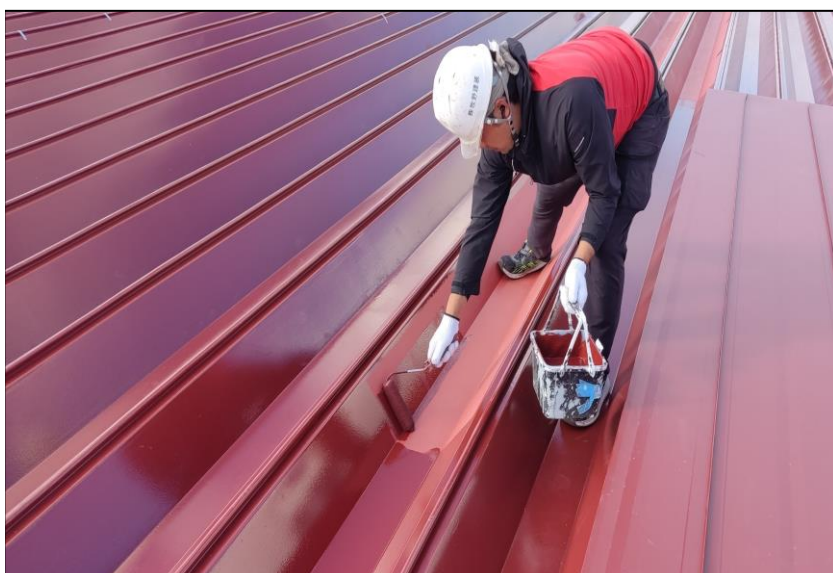

年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	

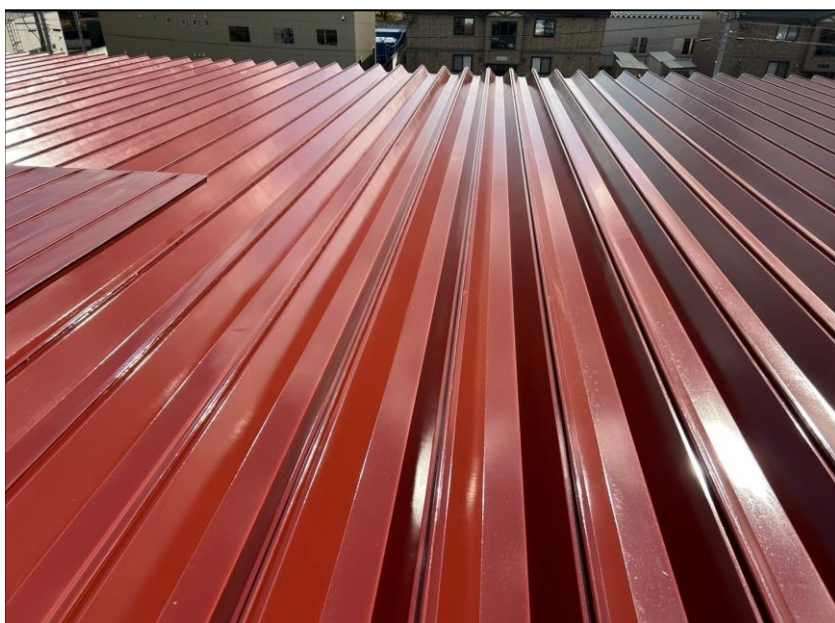


年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了

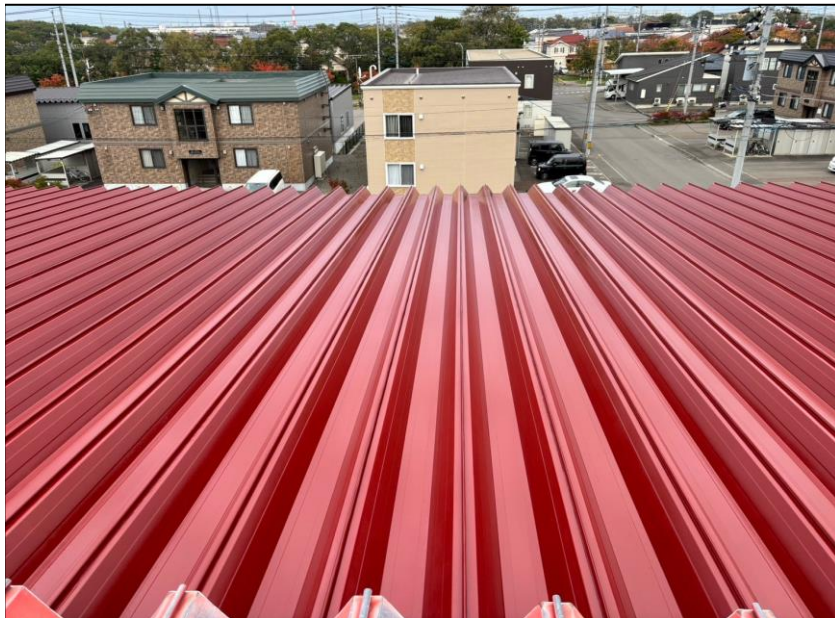

年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了

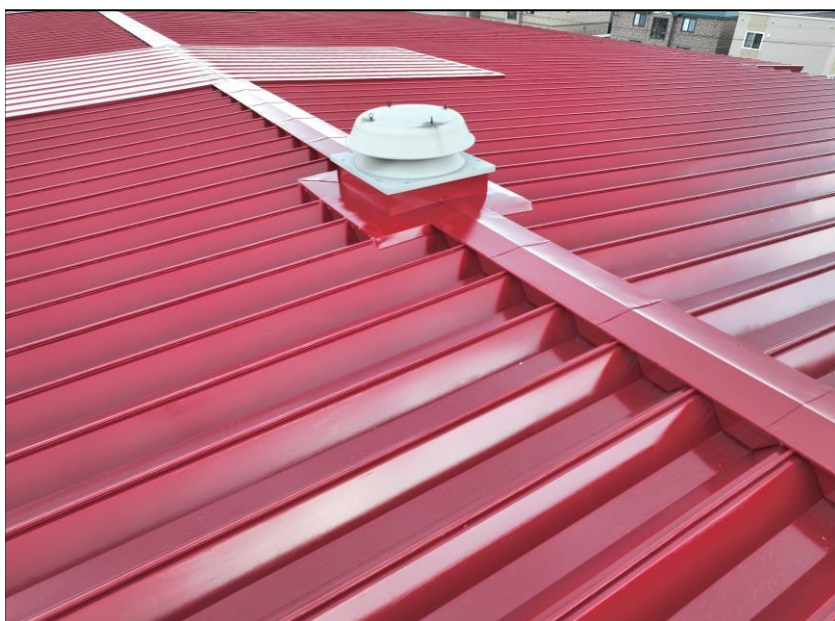

年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了

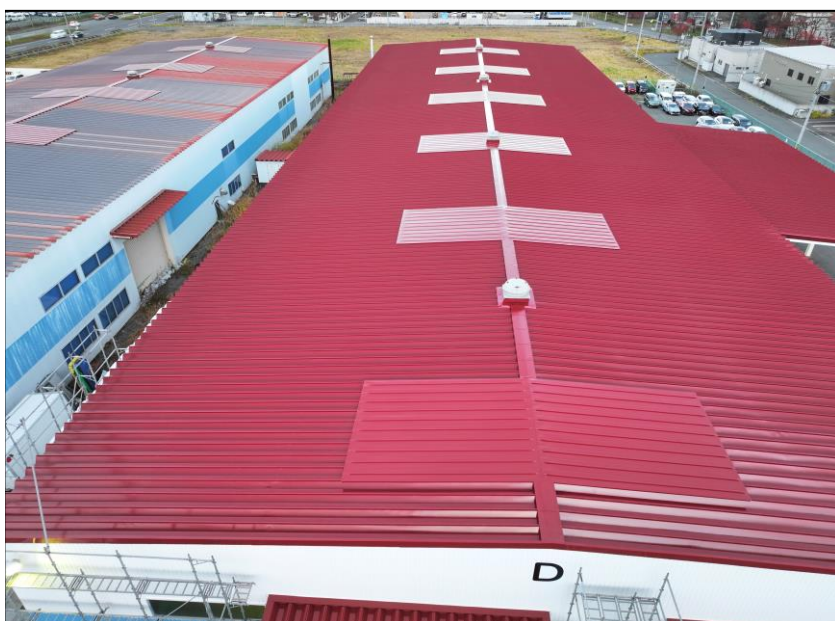

年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	鉄骨
使用材料	電動サンドペーパー＃16
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施 錆びていた箇所については、電動工具を使用いたしました。



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	鉄骨
使用材料	電動サンドペーパー＃16
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	同上




年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	鉄骨
使用材料	電動サンドペーパー＃16
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	同上



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	鉄骨
使用材料	ハイボン20ファイン 色番:ミルキーホワイト
工事内容	材料搬入 16キロ×6セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	鉄骨
使用材料	ハイボン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	

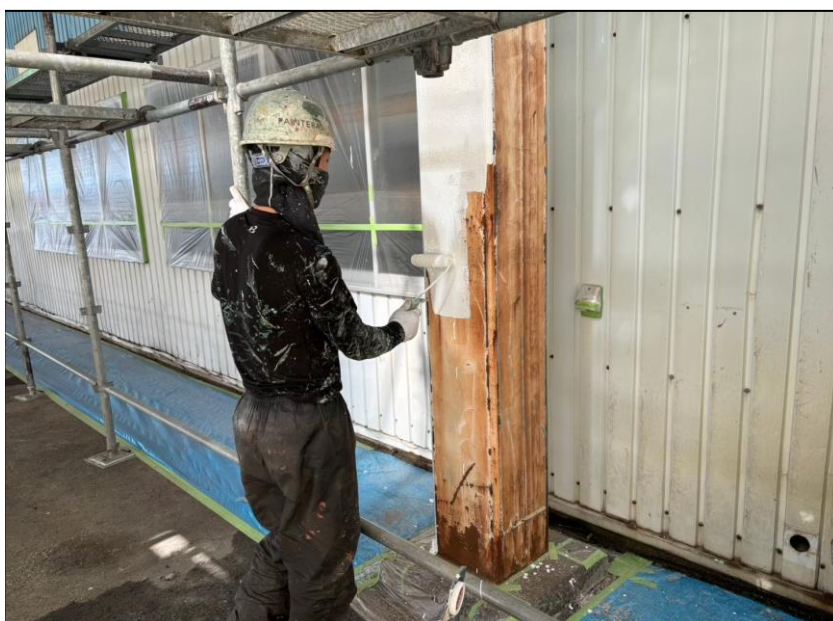


年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	鉄骨
使用材料	ハイボン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	鉄骨
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	鉄骨
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了

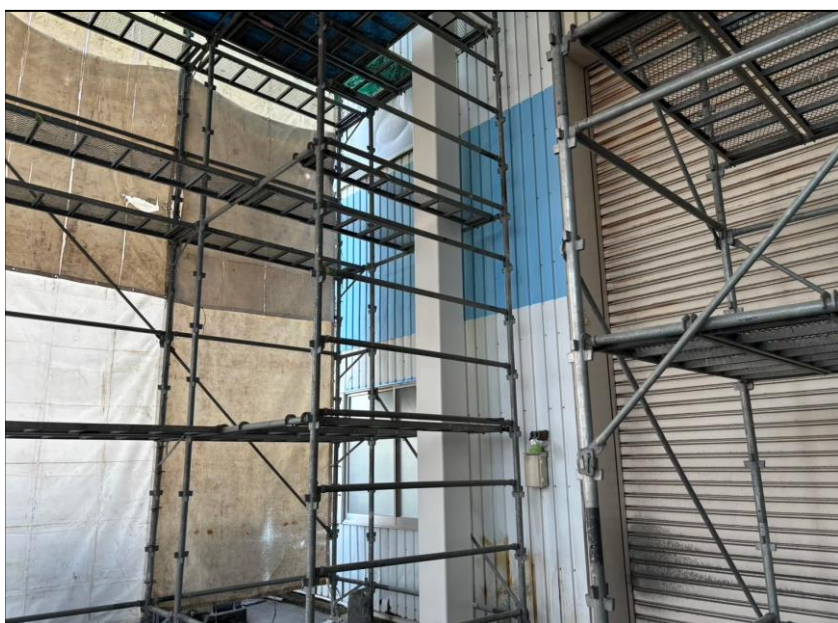

年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	鉄骨
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	鉄骨
使用材料	ファインSi 色番:N-90
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×2缶
備考	超低汚染、超耐久性NAD型 シリコン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現し、 耐候性1種に相当する性能を持つ塗料



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	鉄骨
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	鉄骨
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	鉄骨
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	鉄骨
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	鉄骨
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	電動サンドペーパー #16
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施 錆びていた箇所については、電動工具を使用いたしました。

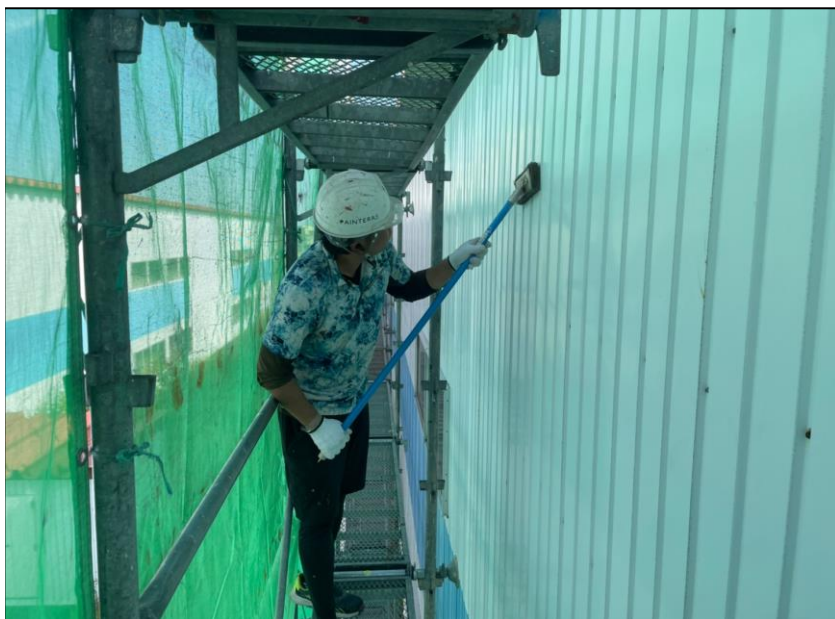


年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	オーバースライダー
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施 錆びていた箇所については、電動工具を使用いたしました。

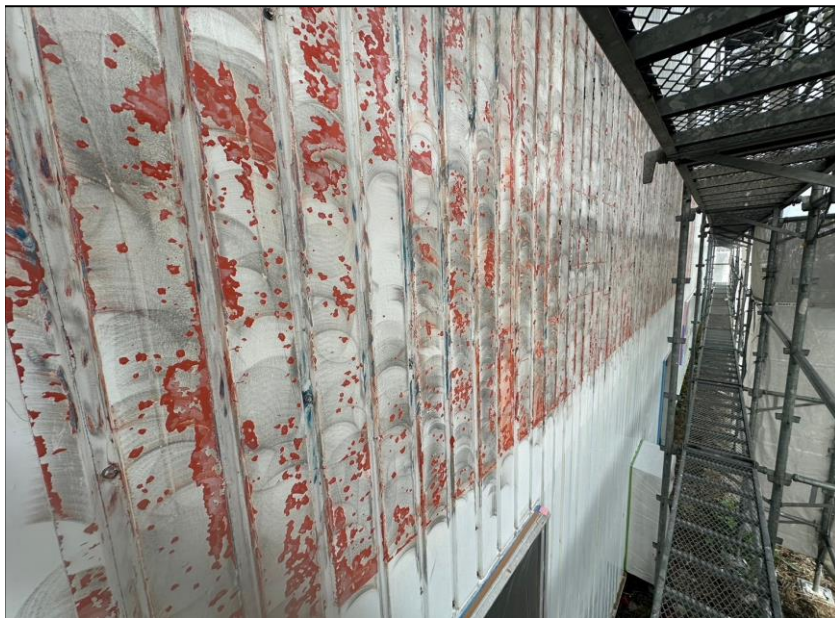

年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	電動サンドペーパー＃16
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	完了

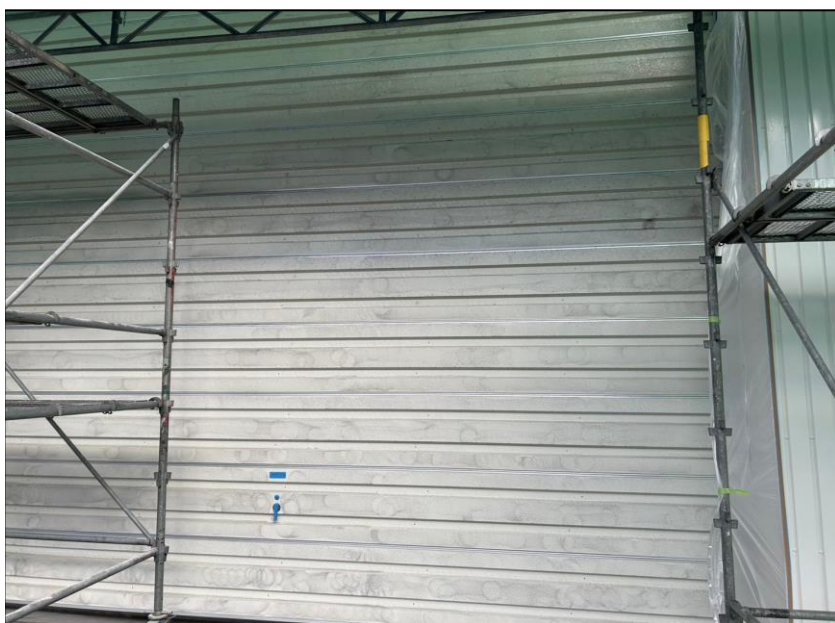

年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	オーバースライダー
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	重量シャッター
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	2液形ウレタン樹脂コーキング
工事内容	材料搬入
備考	6L×6缶 プライマー＝4缶 搬入



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗布
備考	



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了




年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ハイポン20ファイン 色番:ミルキーホワイト
工事内容	材料搬入 16 ^キ ×20セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	さび箇所先行塗り
備考	ボルトが錆びていましたので、ボルトは錆止め2回塗り

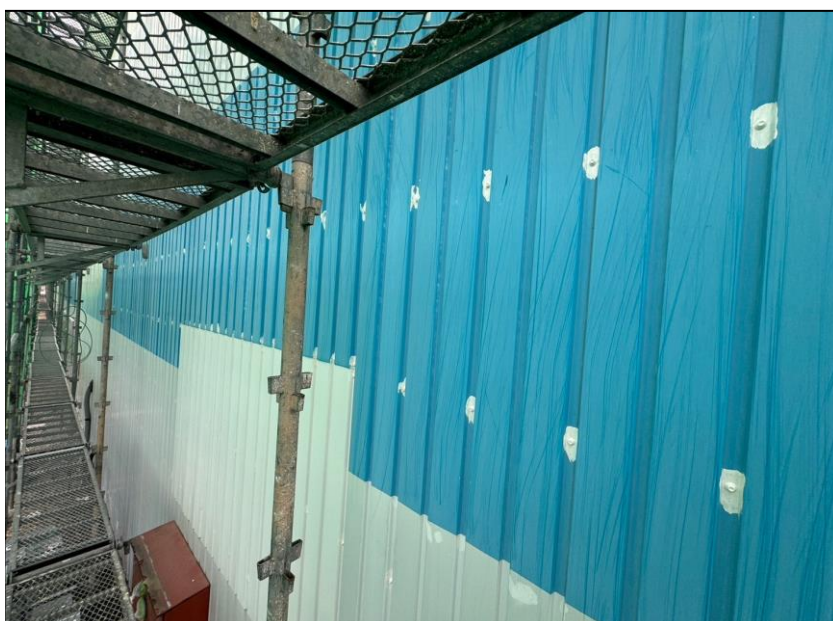


年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	さび箇所先行塗り
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	

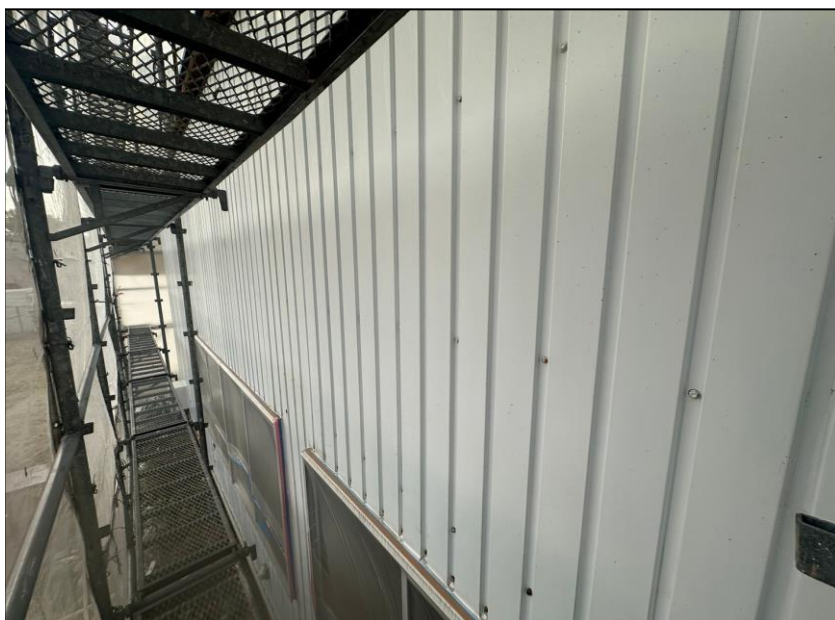

年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	重量シャッター
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了




年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ファインSi 色番:N-90
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×20缶
備考	超低汚染、超耐久性NAD型 シリコン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現 し、耐候性1種に相当する性 能を持つ塗料



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	

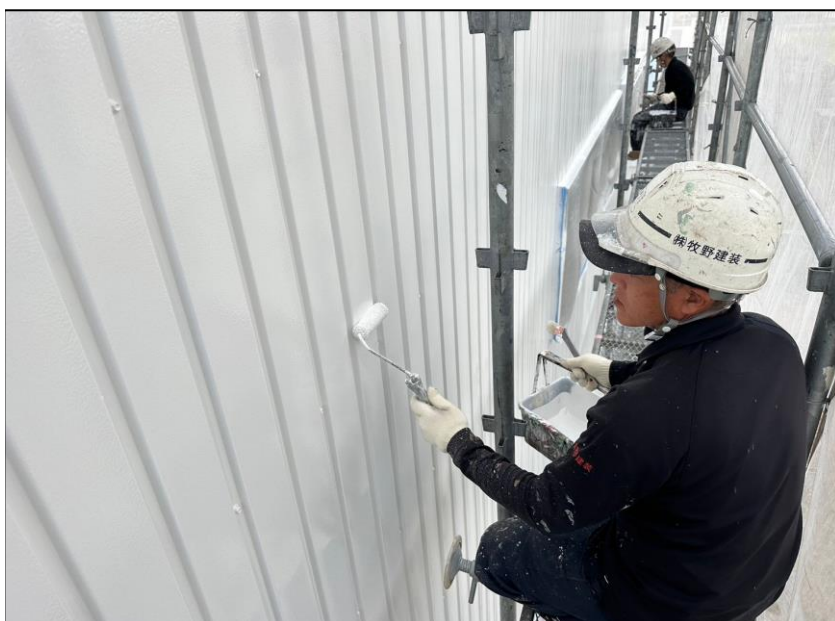

年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ファインSi 色番:69-50T
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×4缶
備考	超低汚染、超耐久性NAD型 シリコン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現し、 耐候性1種に相当する性能を持つ塗料



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ファインSi 色番:69-50T
工事内容	上塗り
備考	

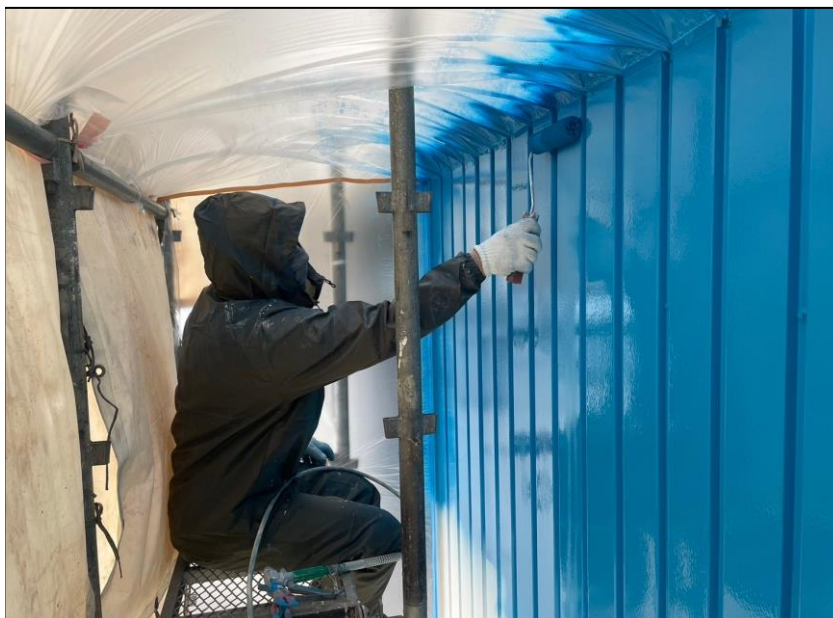


年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ファインSi 色番:69-50T
工事内容	上塗り
備考	

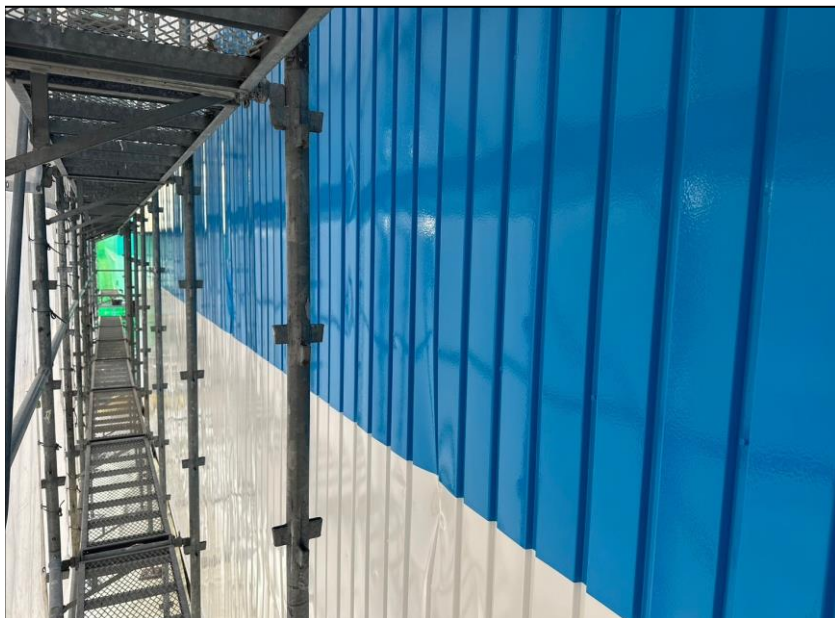

年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ファインSi 色番:69-50T
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ファインSi 色番:N-90
工事内容	上塗り
備考	完了

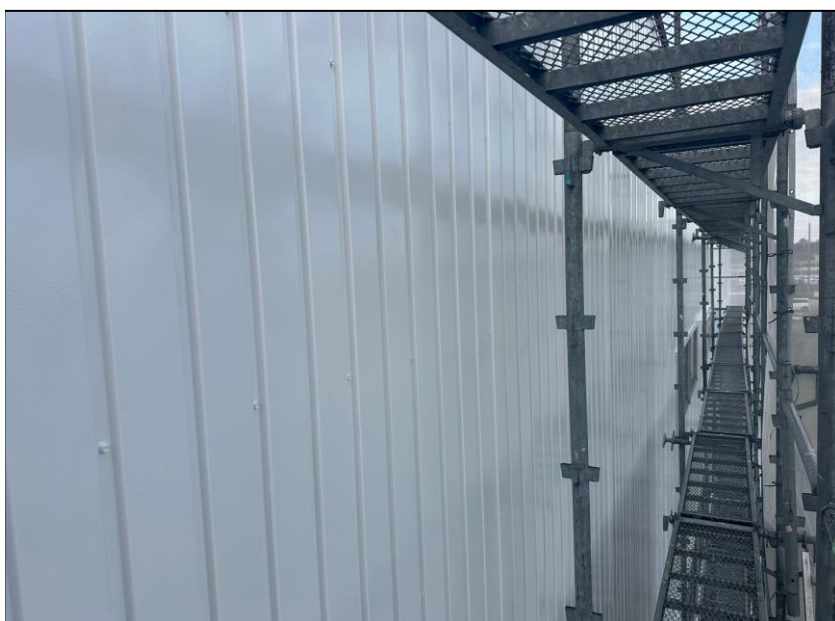

年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁
使用材料	ファインSi 色番:N-90
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースG2 色番:ライトグレー
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	ホース格納庫
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	錆止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	ホース格納庫
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	ホース格納庫
使用材料	カッティングシート
工事内容	カッティングシート貼り
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	番号版
使用材料	
工事内容	現状
備考	



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	番号版
使用材料	
工事内容	材料搬入
備考	錆が酷かったのでアルミ複合版で新しく作り変えました。

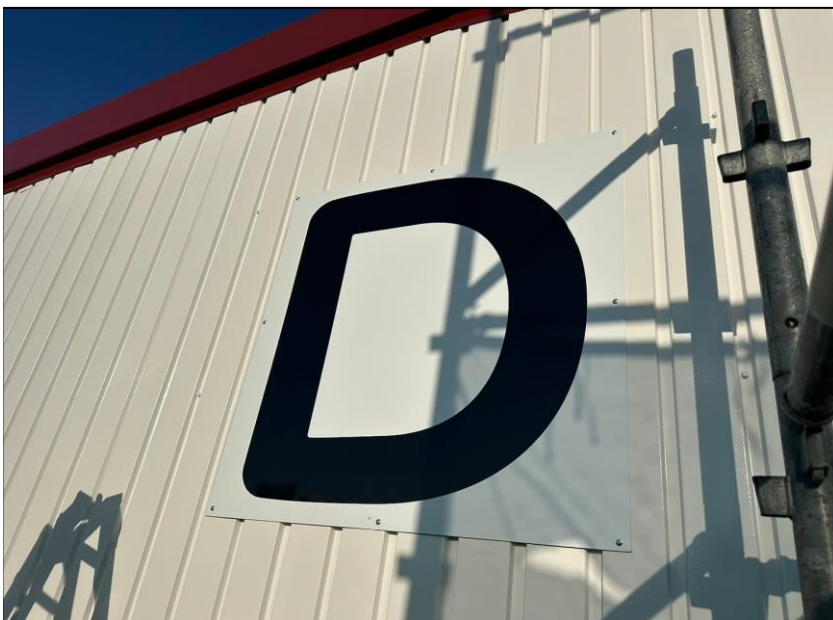

年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	番号版
使用材料	
工事内容	取付
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	倉庫D棟
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	倉庫D棟
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	倉庫D棟
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	倉庫D棟
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	倉庫D棟
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	倉庫D棟
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	PAINTERAS 株式会社牧野建装

