



年月日	2025. 3. 17
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	




年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	仮設足場設置
備考	



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、藻や苔などの不純物を洗浄

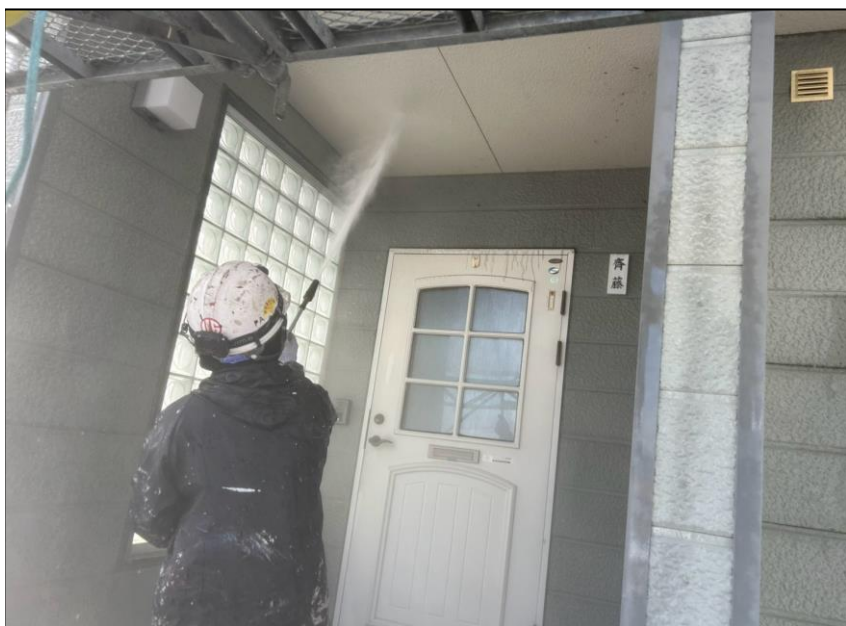

年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	軒天
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリなどの不純物を洗浄



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	ホームタンク
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、藻や苔などの不純物を洗浄



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや汚れなどを洗浄



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	屋根
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施 錆びていた箇所については、電動工具を使用いたしました。



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆びていない箇所については、手ケレンの実施 細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	破風
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	物置
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	物置のケレンも、錆びていた箇所については電動工具を使用いたしました。



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	
工事内容	腐食部貼替
備考	施工前



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	窯業系13mmサイディング
工事内容	腐食部貼替
備考	完了



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	窯業系13mmサイディング
工事内容	腐食部貼替
備考	施工前



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	窯業系13mmサイディング
工事内容	腐食部貼替
備考	完了



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去中
備考	



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去後
備考	



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	2液形ウレタン樹脂コーキング
工事内容	材料搬入
備考	6L×5缶 プライマー＝2缶 搬入



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗布
備考	



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	へら押え(仕上げ)
備考	



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	へら押え(仕上げ)
備考	完了




年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	へら押え(仕上げ)
備考	完了



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインデクロ 色: 赤さび色
工事内容	材料搬入 16 ^{キロ} ×1セット
備考	1液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	破風
使用材料	ハイボンファインデクロ 色:白さび色
工事内容	材料搬入 16キロ×1セット
備考	1液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料

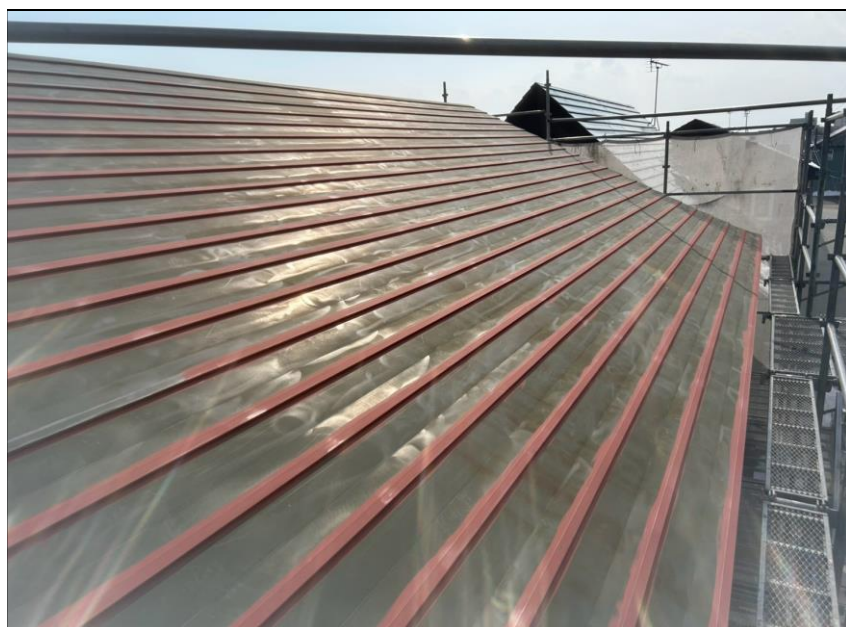


年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	錆箇所補修塗り (2回塗り)
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為に施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了

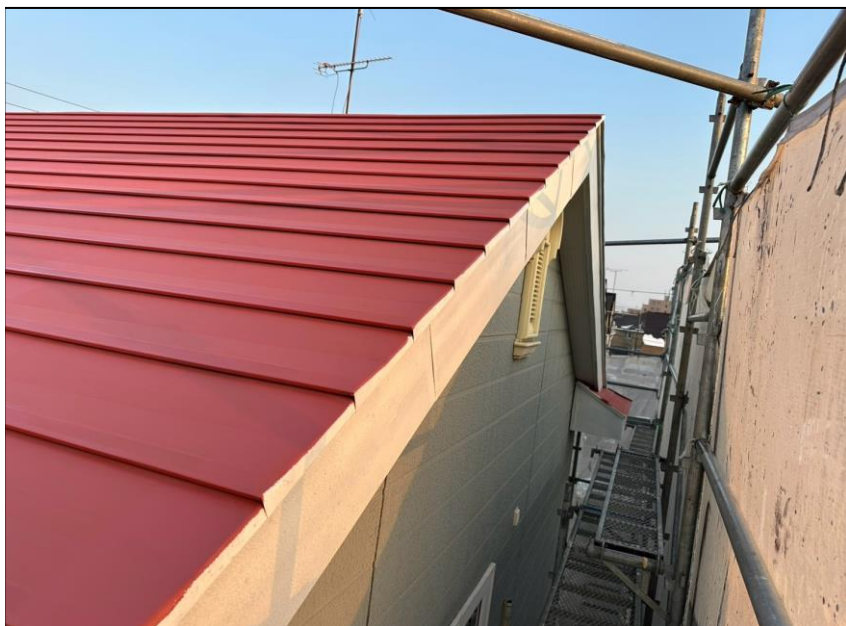

年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	破風
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	屋根、破風
使用材料	ファインルーフSi 色番:ノアール
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×2セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂ト タン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用に より、優れた耐候性及び耐 久性を発揮します。



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目先行塗り (中塗り)
備考	サビ止め作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと中塗り塗料を塗りこみました。




年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	破風
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番: N-90
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×1セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD型シリコン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で従来にない超低汚染を実現し、耐候性1種に相当する性能を持つ塗料



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	破風
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	

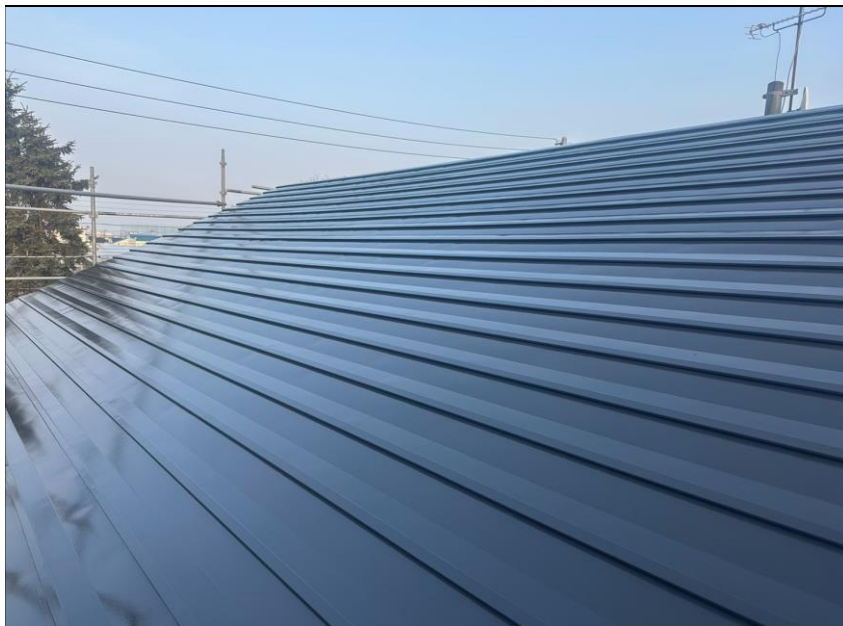

年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	完了



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	中塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」をもしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	屋根
使用材料	インパクトドライバー
工事内容	雪止め取付け
備考	



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	屋根
使用材料	インパクトドライバー
工事内容	雪止め取付け
備考	完了




年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	材料搬入 15キロ×2缶
備考	サイディング表面の劣化を調整し、上塗りの滑らかさを際立たせ、光沢のある美しい仕上げを提供します。また、特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮する下塗り塗料。



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	下塗り
備考	

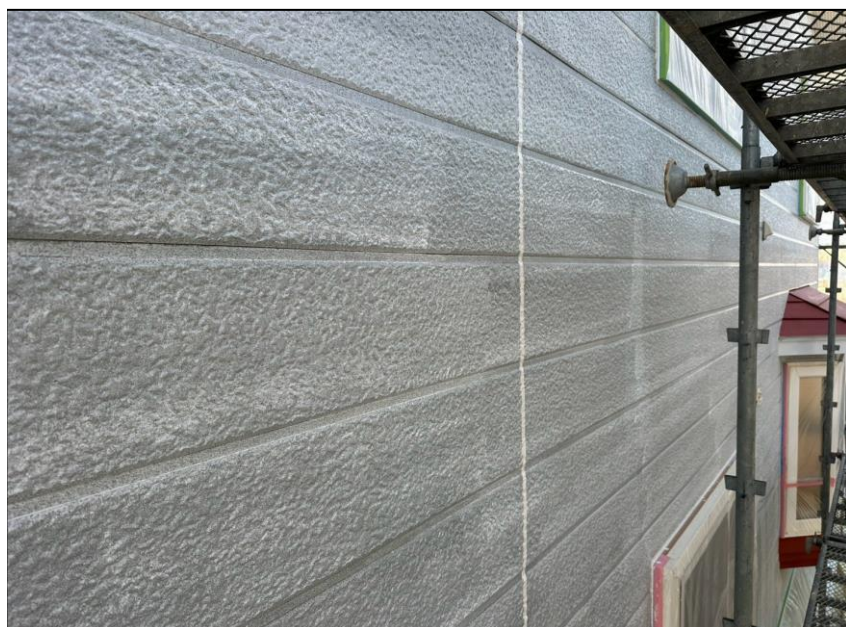

年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	下塗り
備考	完了



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 3. 18~4. 11
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番:N-30
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×3セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD型 シリコン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現 し、耐候性1種に相当する性 能を持つ塗料



年月日	2025. 3. 18~4. 11
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番:19-80D
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×1セット
備考	同上

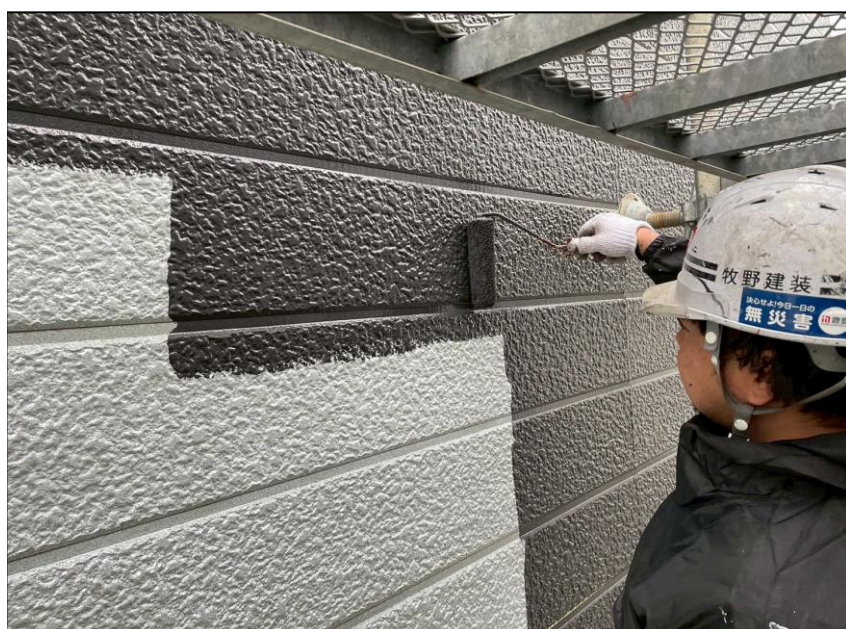

年月日	2025. 3. 18~4. 11
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番:N-30
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番: 19-80D
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番: N-30
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	




年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番: 19-80D
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番:N-30
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番:N-30
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了

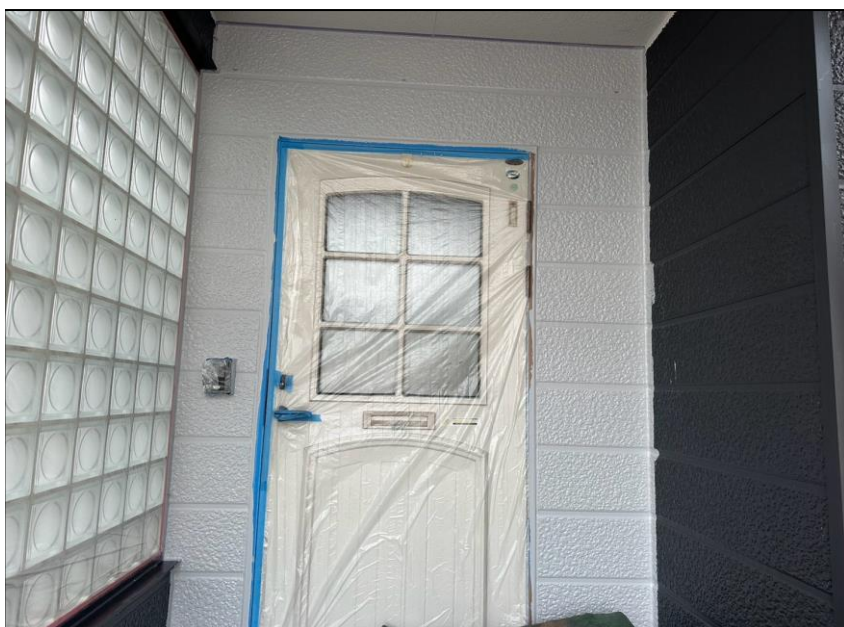

年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番:19-80D
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	配電盤
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	完了



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	配電盤
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	配電盤
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	換気フード
使用材料	
工事内容	破損力所交換
備考	換気フードが1カ所壊れておりましたので交換しました。



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	ガス管
使用材料	アルミニウムペイント
工事内容	上塗り
備考	ガス管はシルバー色で塗装



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	水切り
使用材料	
工事内容	破損力所交換
備考	水切りコーナー破損力所交換




年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	物置
使用材料	11mm有孔スレートボード
工事内容	交換
備考	物置の軒天が思った異常に傷んでいましたので交換しました。(サービス)



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	物置
使用材料	11mm有孔スレートボード
工事内容	交換
備考	コーキング充填



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	物置
使用材料	11mm有孔スレートボード
工事内容	交換
備考	完了

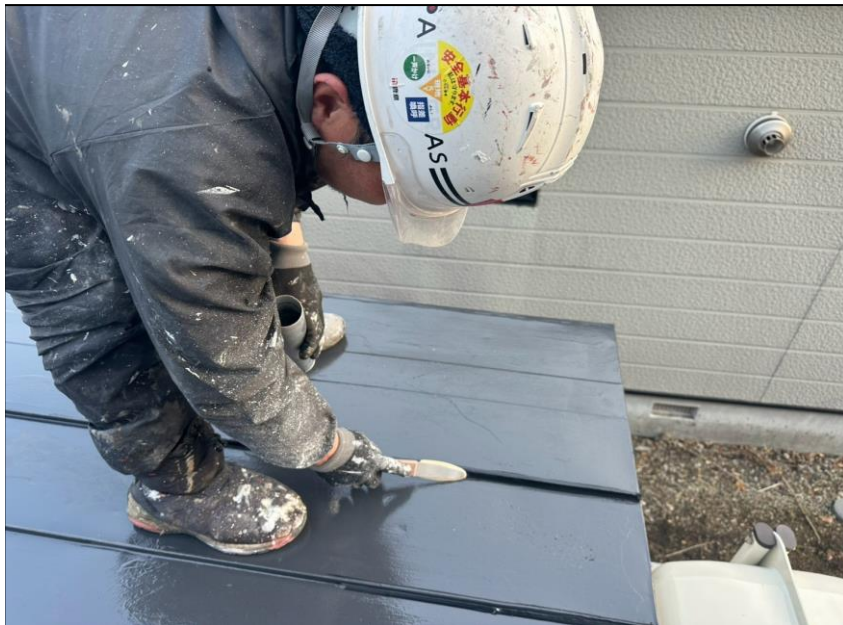

年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	物置
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	充填、へら押え
備考	軒先の屋根から雨水が入り、軒天を腐食させておりましたのでコーキング材を充填して雨漏りの修繕(サービス)



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	物置
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースGⅡ クリーンカラーAベスト
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー
工事内容	清掃
備考	



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー
工事内容	清掃
備考	



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	インターロッキング
使用材料	
工事内容	高圧水洗浄
備考	施工前



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	インターロッキング
使用材料	水道水
工事内容	高圧水洗浄
備考	



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	インターロッキング
使用材料	水道水
工事内容	高圧水洗浄
備考	完了



年月日	2025. 3. 18～4. 11
工事部位	インターロッキング
使用材料	水道水
工事内容	高圧水洗浄
備考	完了



年月日	2025. 3. 18~4. 11
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事完了
備考	




年月日	2025. 3. 18~4. 11
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事完了
備考	



年月日	2025. 3. 18~4. 11
工事部位	物置
使用材料	
工事内容	塗装工事完了
備考	



Before



After-



PAINTERAS
株式会社牧野建装
