



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	全体
使用材料	くさび足場
工事内容	仮設足場設置
備考	



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄。



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	破風
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を清掃



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	軒天
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を清掃



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を清掃



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	窓
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を清掃




年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	玄関ドア
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を洗浄。



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	基礎
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	苔や藻などの汚れを洗浄



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	ホームタンク
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	

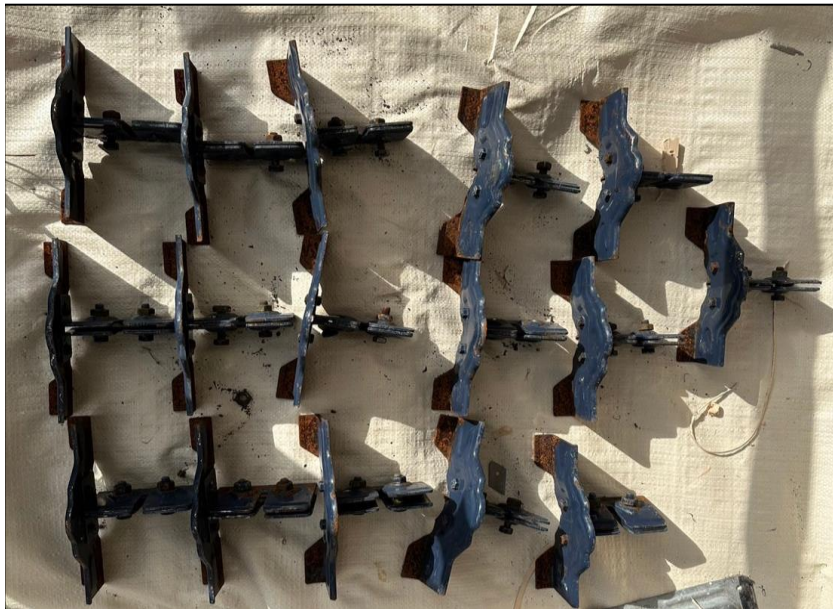


年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	雪止め
使用材料	インパクトドライバー
工事内容	雪止め撤去
備考	



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施 今回の屋根のケレンは、電動工具を使用いたしました。



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	破風
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施 今回の破風のケレンは、錆箇所については、電動工具を使用いたしました。

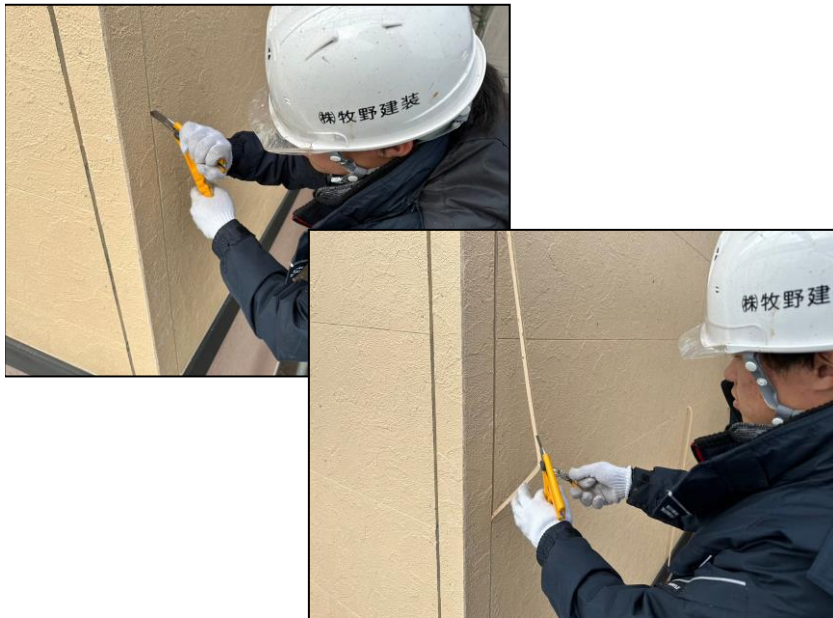


年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去中
備考	




年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去後
備考	



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	軒天
使用材料	バリ、ハンマー
工事内容	既存スレート撤去
備考	

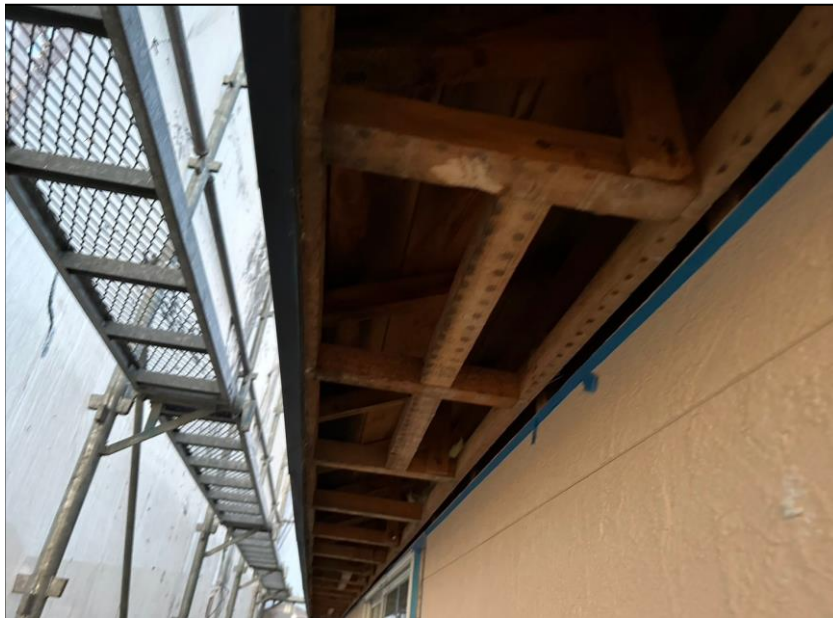


年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	軒天
使用材料	バリ、ハンマー
工事内容	既存スレート撤去
備考	完了

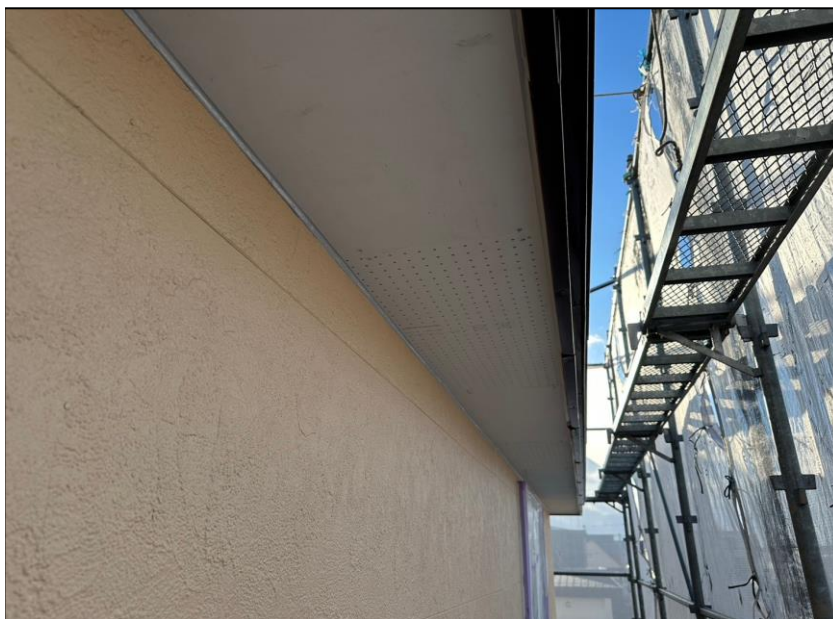

年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	軒天
使用材料	釘、ハンマー
工事内容	新規スレートボード貼り付け
備考	




年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	2液形ウレタン樹脂コーキング
工事内容	材料搬入
備考	6L×2缶 プライマー＝2缶 搬入

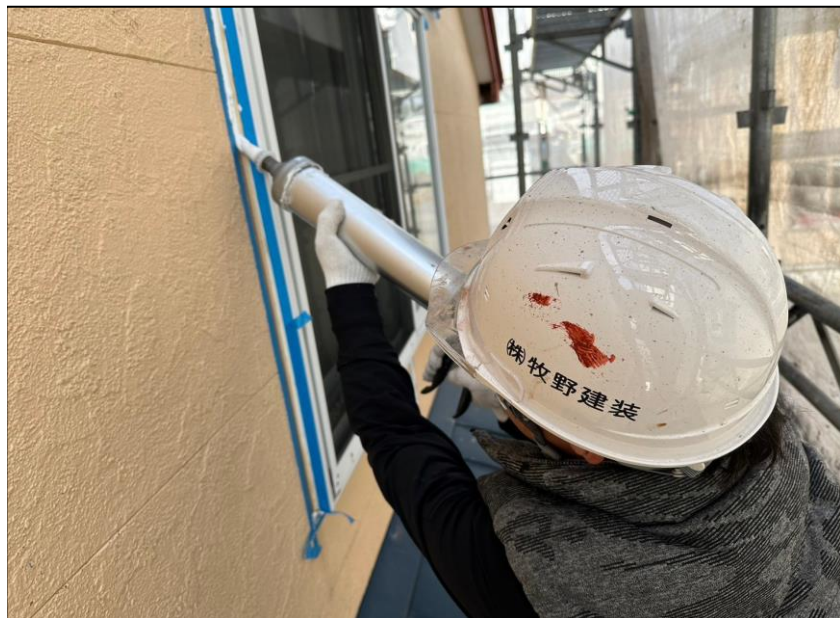

年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	

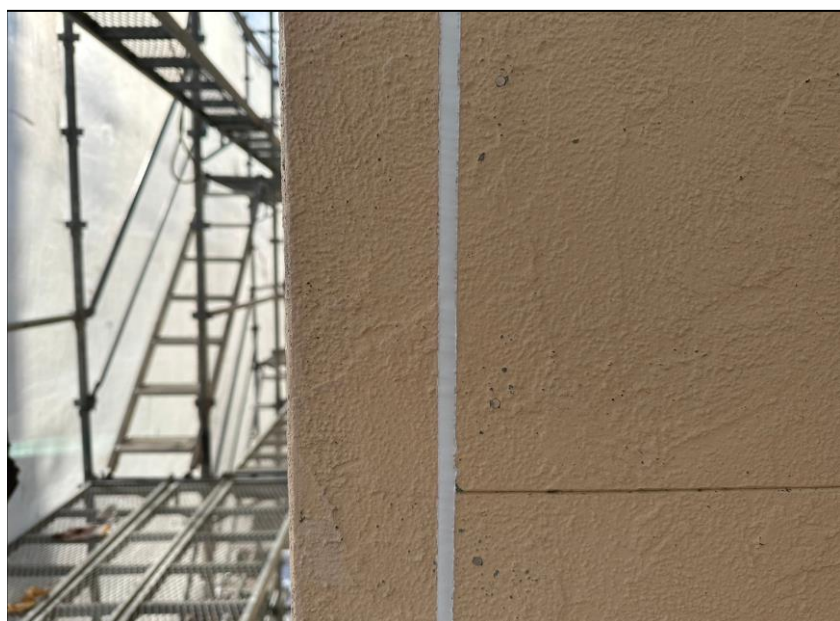


年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ 色: 赤さび色
工事内容	材料搬入 16 ^{kg} × 1セット
備考	1液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料

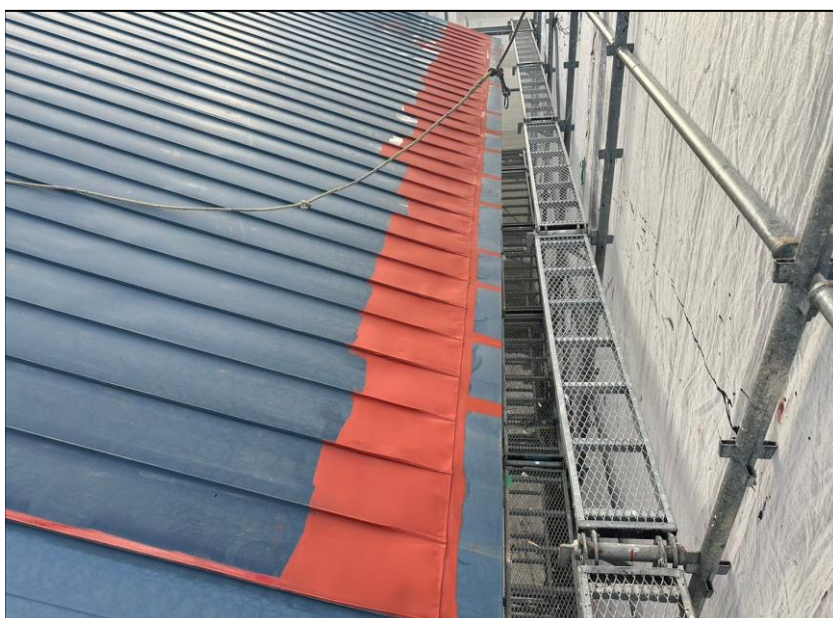

年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (増し塗り)
備考	錆びていた箇所は錆止めを増し塗するために、最初に補修いたしました。




年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	錆箇所補修塗り 及び 先行塗り
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為に 施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。




年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	




年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	破風
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	

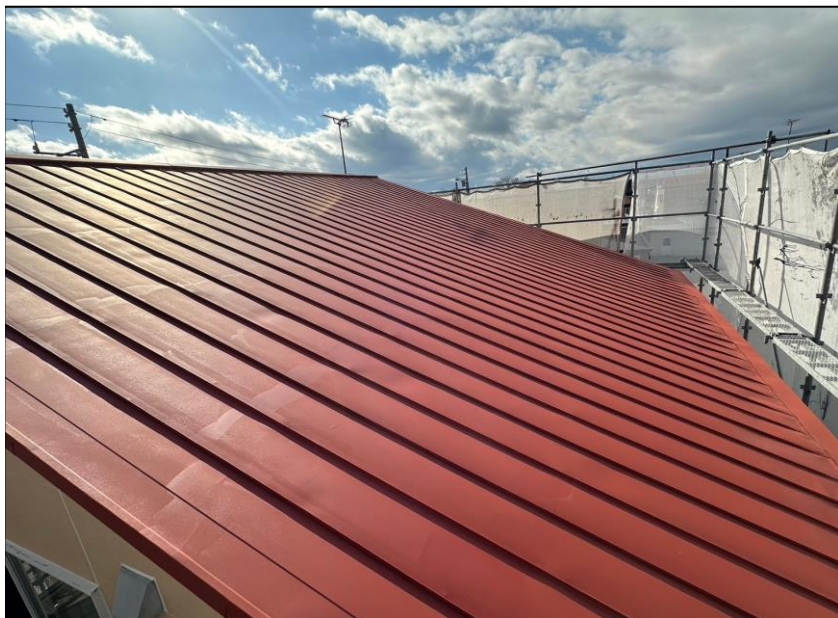


年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了

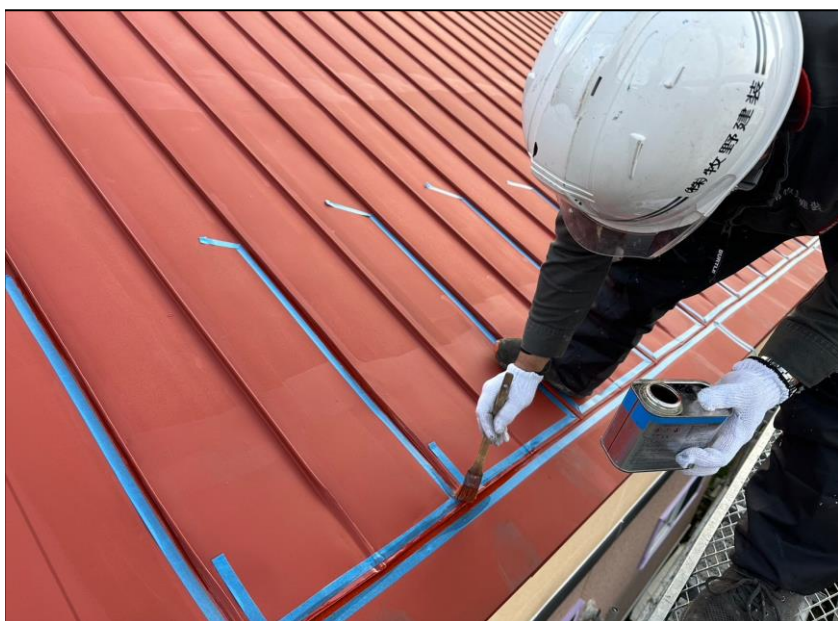

年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	屋根
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗
備考	

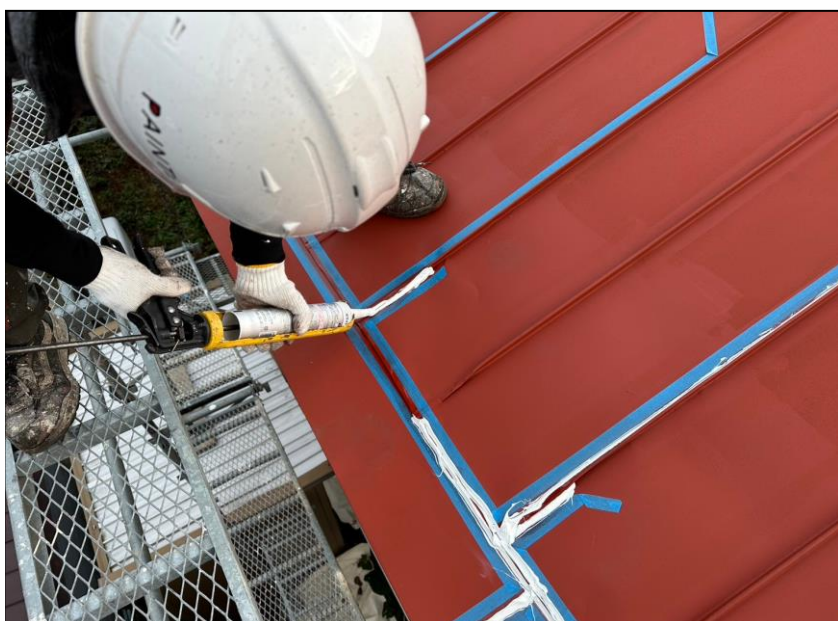


年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	屋根
使用材料	変性エポキシ樹脂コーキング
工事内容	コーキング打設
備考	すが漏れしていそうな箇所にコーキング材を充填しました

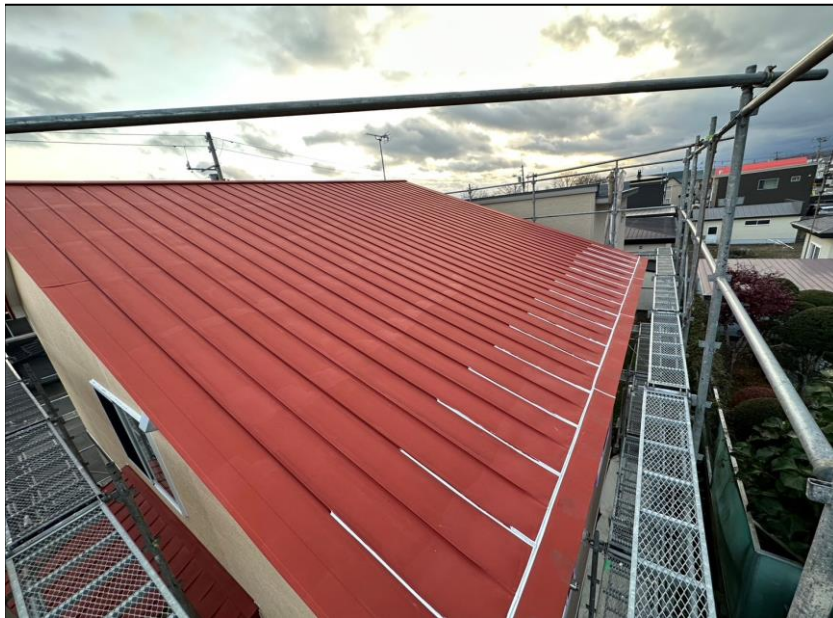


年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	屋根
使用材料	変性エポキシ樹脂コーキング
工事内容	コーキング打設
備考	完了




年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI 色番:コーヒブラウン
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×2セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂ト タン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用に より、優れた耐候性及び耐 久性を発揮します。

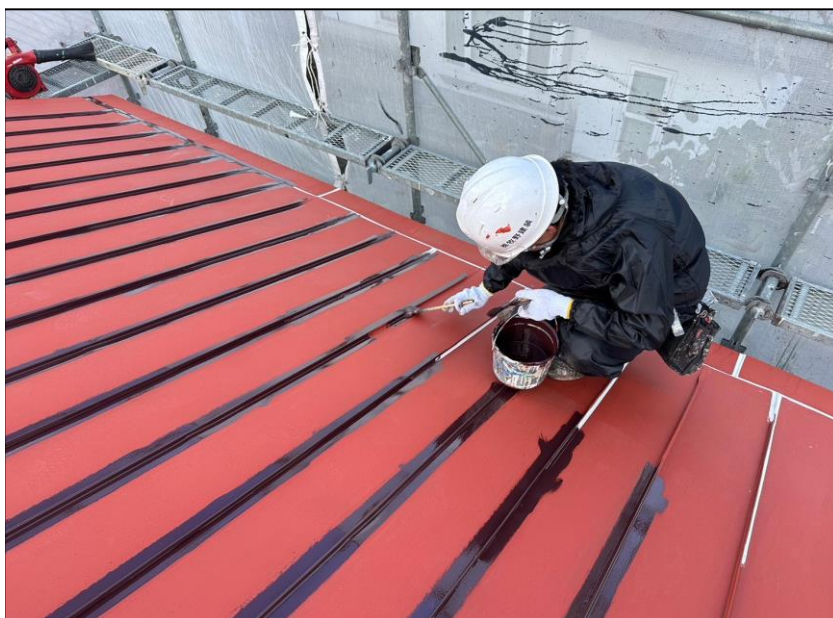

年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目先行塗り (中塗り)
備考	サビ止め作業同様、1番錆 びる箇所「板金面の折り返し 溝のもしっかりと中塗り塗 料を塗りこみました。

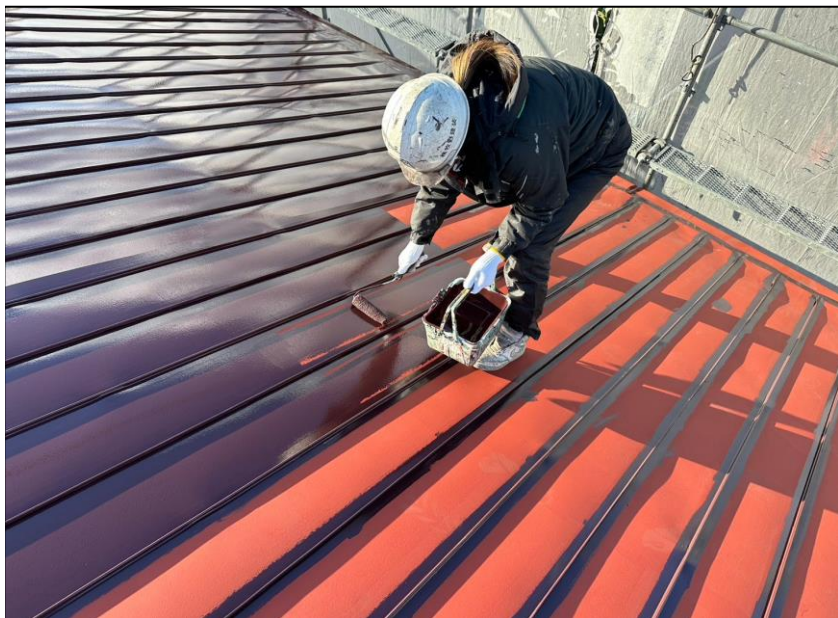


年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	

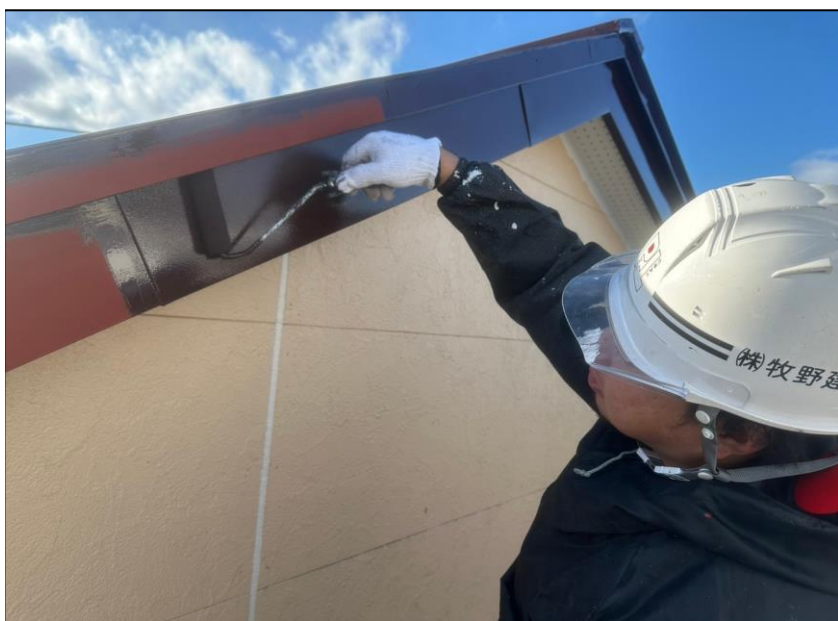

年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	




年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	中塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」をもしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。

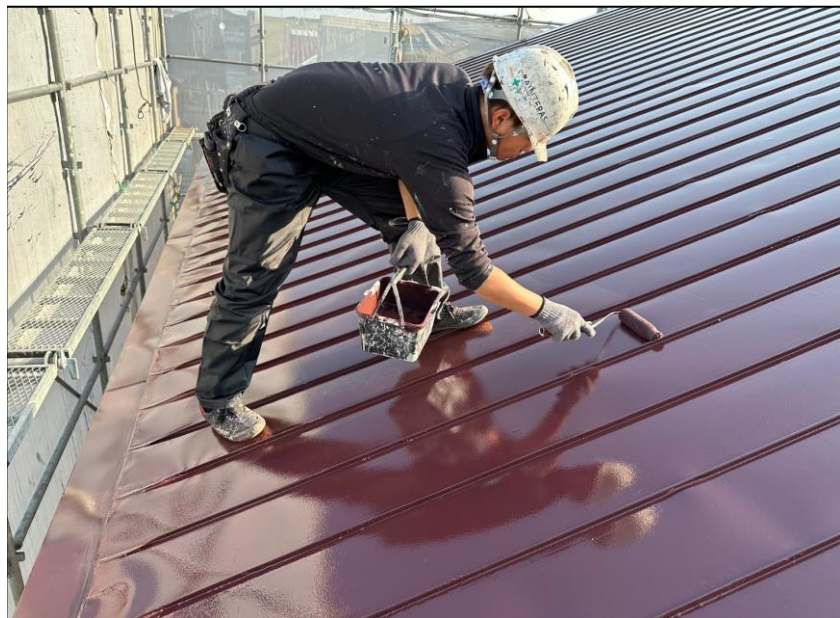

年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了

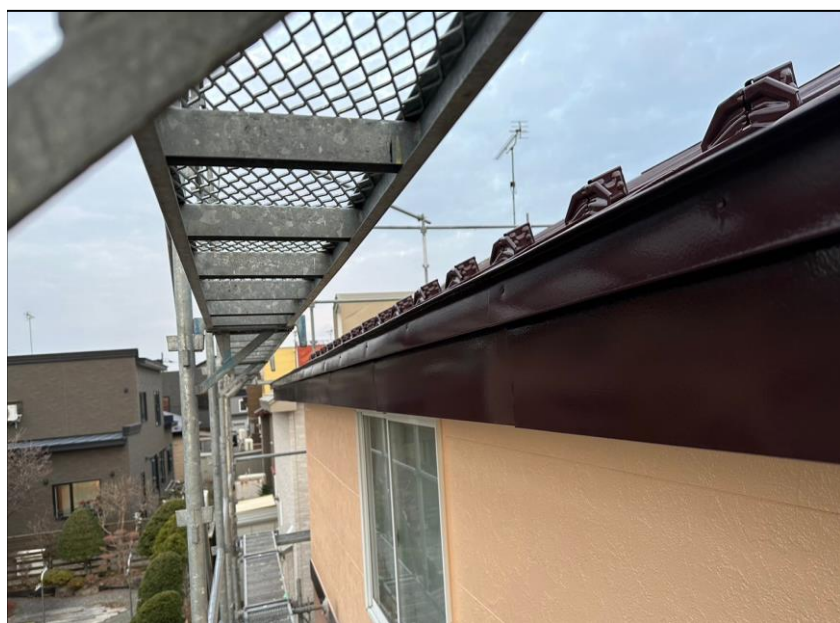

年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	屋根
使用材料	雪止め
工事内容	新規雪止め取り付け
備考	



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	屋根
使用材料	雪止め
工事内容	新規雪止め取り付け
備考	完了



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	マイルドシーラーES
工事内容	下塗り
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	マイルドシーラーES
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番: 17-80H
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×1セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD 型ポリウレタン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現 し、耐候性1種に相当する性 能を持つ塗料

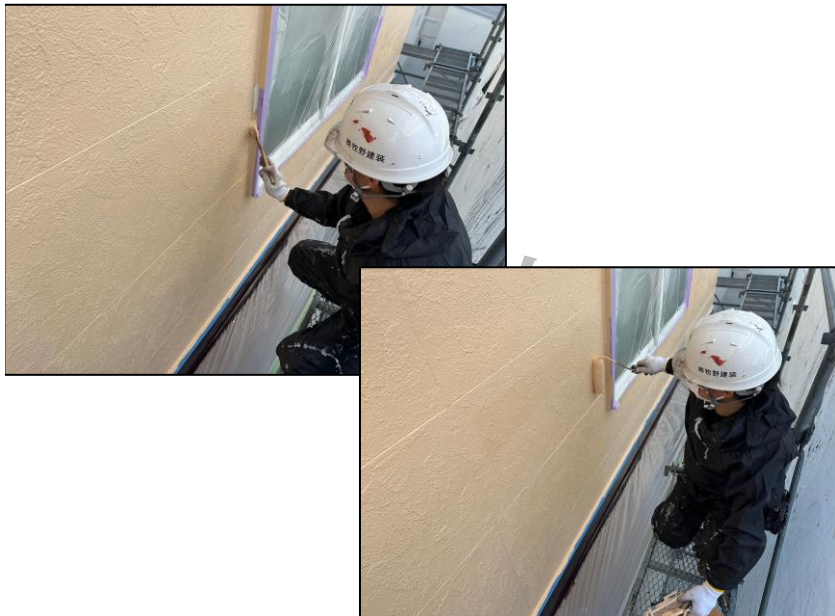


年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	

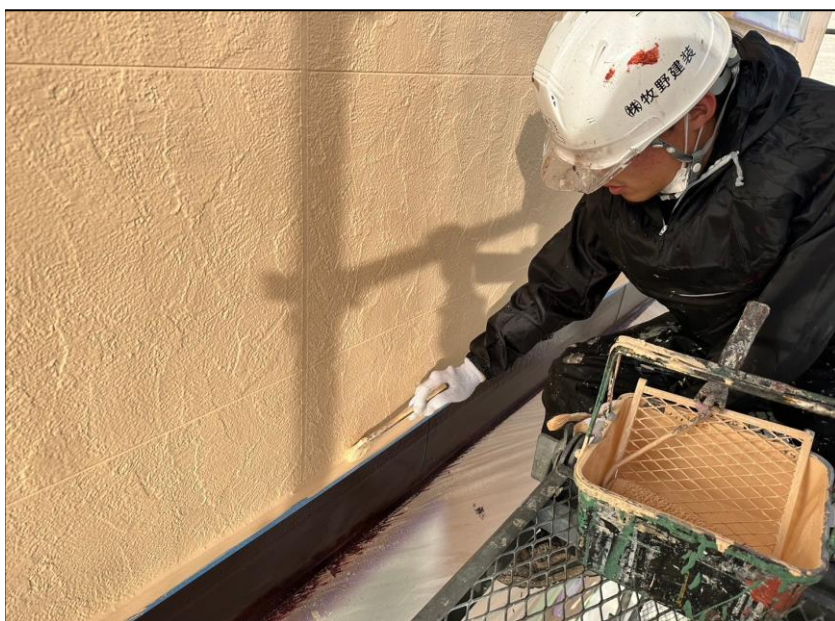

年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	

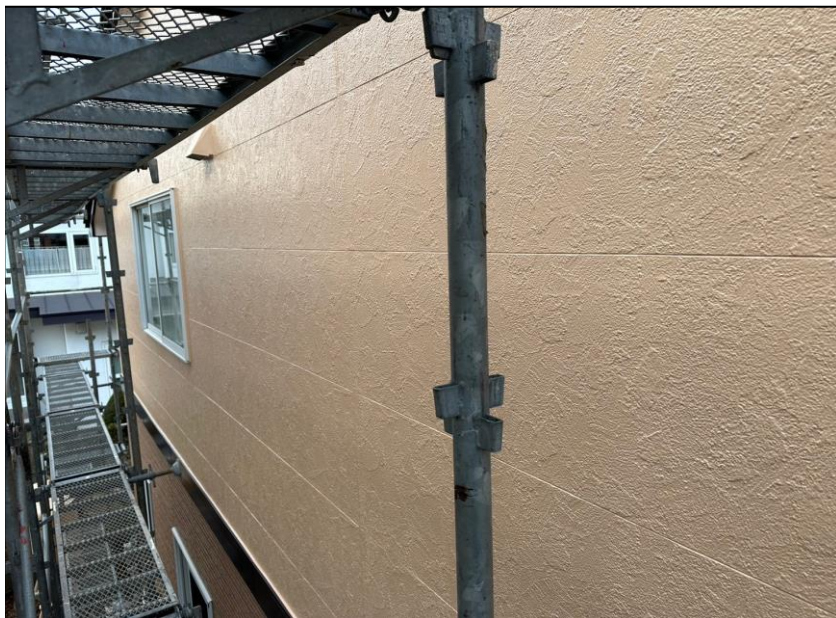

年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトクリアー
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×2セット
備考	セラミック系外壁保護クリアー 高耐光性、紫外線吸収、超低汚染、防カビ性に優れているクリアー塗料材です。



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトクリアー
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトクリアー
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトクリアー
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	材料搬入
備考	4L×4缶 プライマー＝2缶 搬入



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗り
備考	



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	外壁
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースGⅡ 色番:ライトグレー
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースGⅡ
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースGⅡ
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	ホームタンク
使用材料	研磨剤、ウエス
工事内容	下地処理
備考	ケレンを実施し、脱脂作業




年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー
工事内容	清掃
備考	

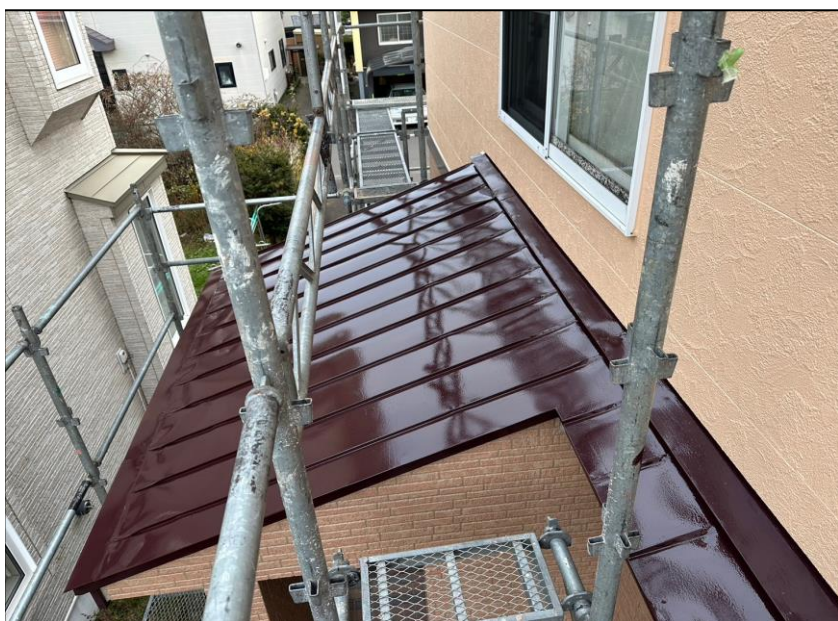

年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	小屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了




年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2023. 11. 10～11. 28
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



Before



After-



PAINTERAS
株式会社牧野建装
