



年月日	2022. 10. 27
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2022. 10. 27
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	仮設足場設置
備考	



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄。



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	軒天
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を洗浄。



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を洗浄。



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	窓
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	窓のホコリを洗浄




年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	塀
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	




年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	ホームタンク
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	物置
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	苔や藻などの不純物

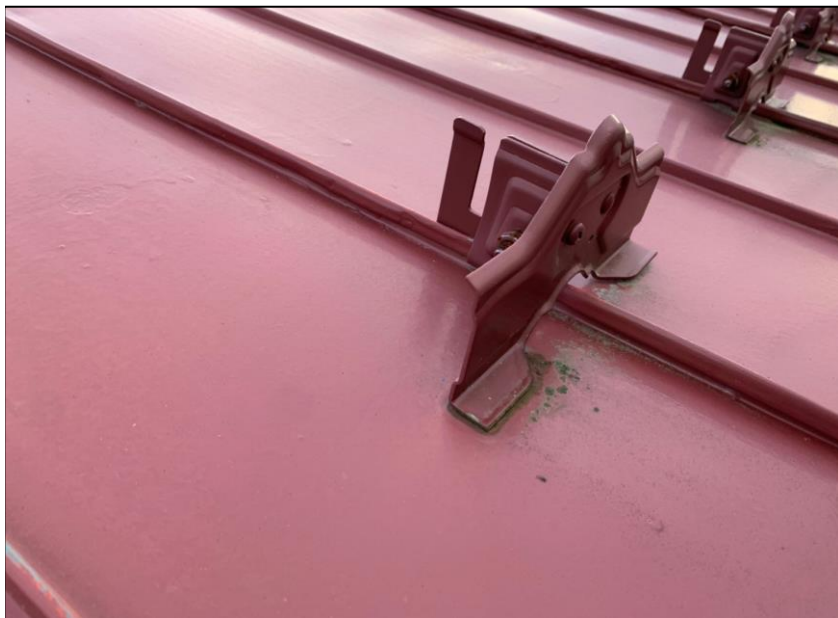

年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	雪止め
使用材料	
工事内容	現状
備考	

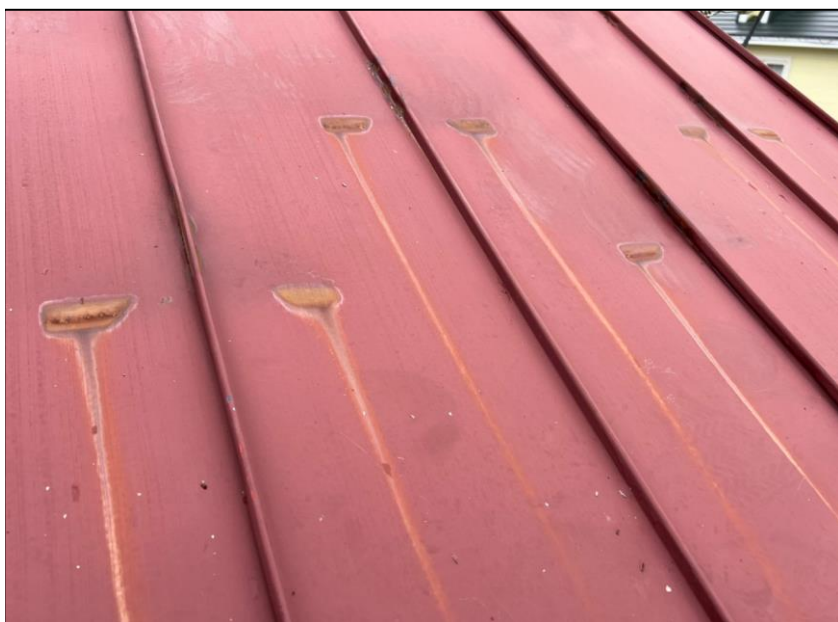

年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	雪止め
使用材料	インパクトドライバー
工事内容	雪止め撤去
備考	



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆びていた箇所については、機械工具でケレンの実施



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	マジックロン(研磨材)
工事内容	下地調整(ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業




年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根、破風
使用材料	ハイボンファインデクロ 色: 赤さび色
工事内容	材料搬入 16 ^{キロ} ×2セット
備考	1液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料




年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為に施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	

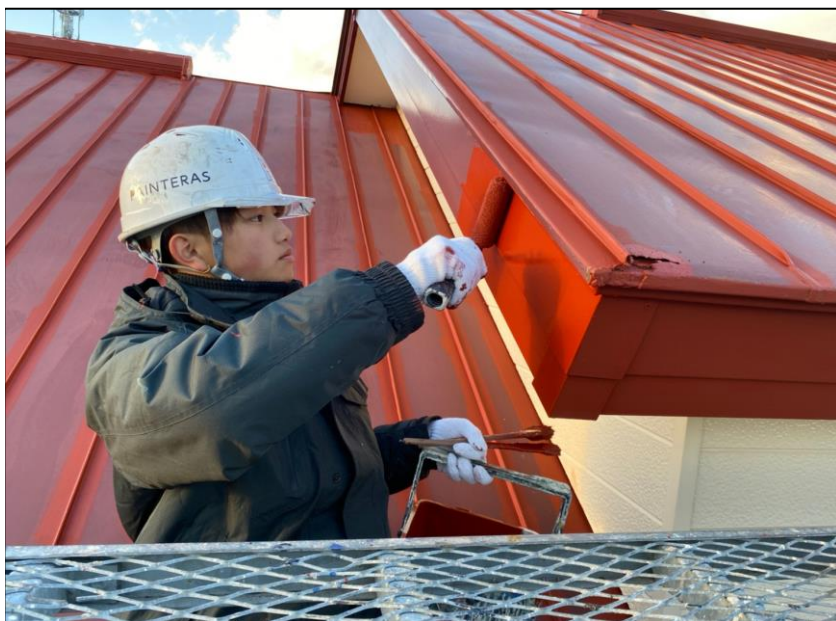

年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	破風
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	

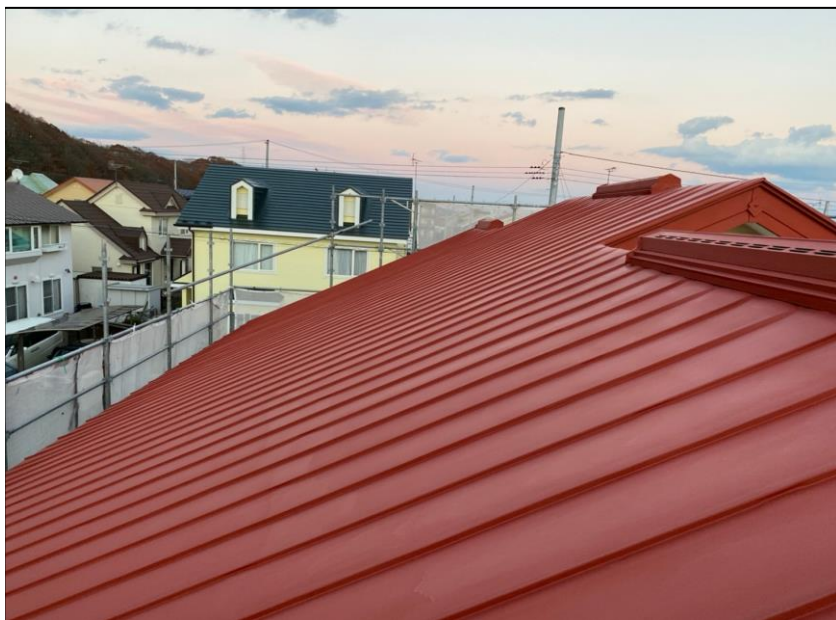

年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	破風
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了




年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根、破風
使用材料	ファインルーフSi 色:モスグリーン
工事内容	材料搬入 16 ^キ ×2セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂ト タン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用に より、優れた耐候性及び耐 久性を発揮します。



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	サンパッチシート
工事内容	穴あき箇所補修
備考	ファイバークロスとFRP樹脂 が入っており、簡易的にFRP を貼り付けて補修できるFRP 補修キットです。



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	サンパッチシート
工事内容	穴あき箇所補修
備考	補修前

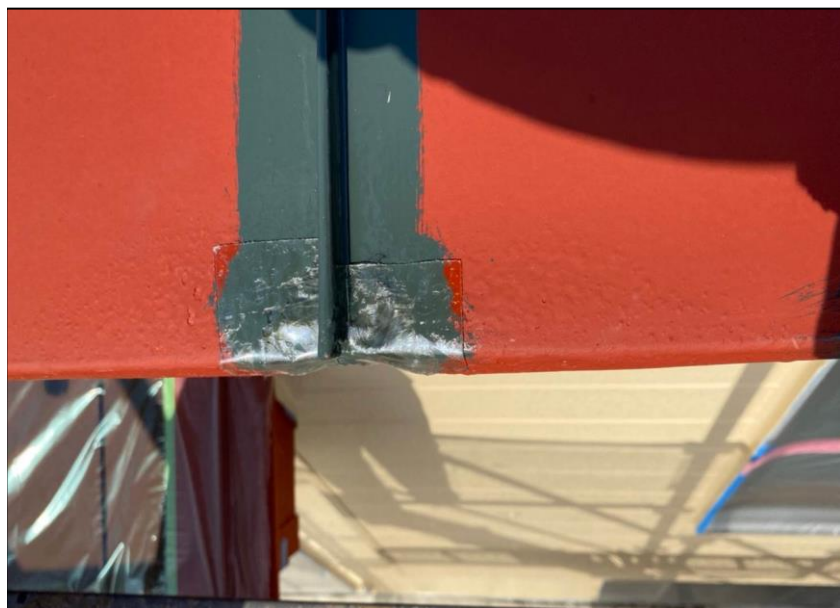

年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	サンパッチシート
工事内容	穴あき箇所補修
備考	補修後




年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	サンパッチシート
工事内容	穴あき箇所補修
備考	補修後



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目先行塗り (中塗り)
備考	サビ止め作業同様、1番錆 びる箇所「板金面の折り返し 溝のもしっかりと中塗り塗 料を塗りこみました。



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目先行塗り (中塗り)
備考	先行塗完了

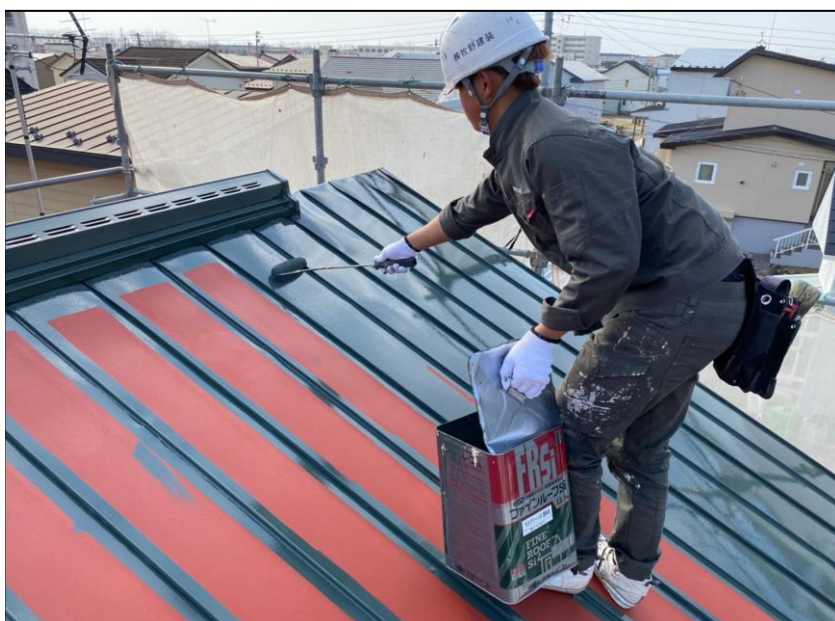

年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目先行塗り (中塗り)
備考	



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目先行塗り (中塗り)
備考	



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	完了



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	




年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	雪止め
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	雪止めを再利用できましたので、錆止めを塗り、上塗りを塗りました。 お見積り金額の雪止め交換工事代金をひかせていただきます。



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	雪止め
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	雪止め
工事内容	取付け
備考	

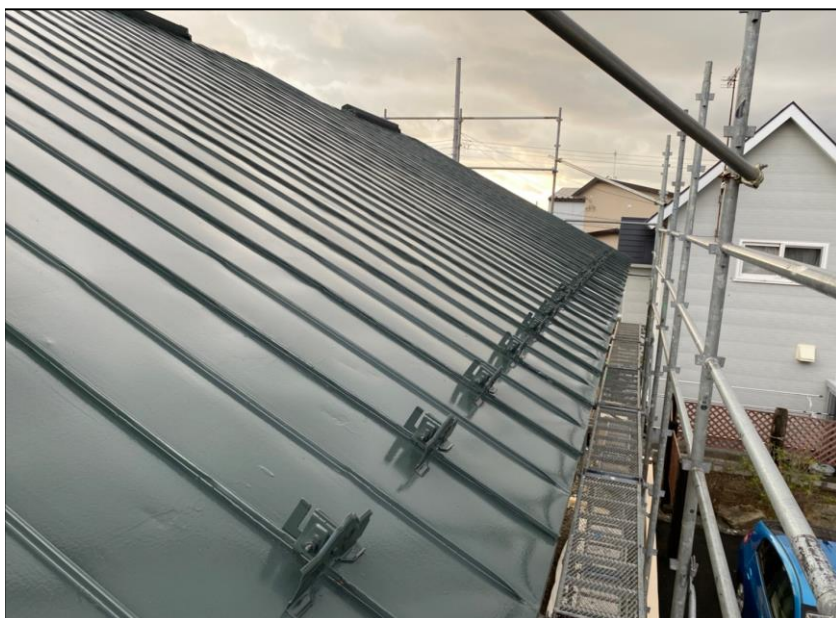

年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	雪止め
工事内容	取付け
備考	完了



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	雪止め
工事内容	取付け
備考	完了



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	外壁
使用材料	マイルドシーラーES
工事内容	材料搬入 16 ^{キロ} ×1缶
備考	特殊エポキシ樹脂 浸透、固着性が高く、下地の補強効果に優れている。旧塗膜との密着性が抜群に良い



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	外壁
使用材料	マイルドシーラーES
工事内容	下塗り (シーラー塗り)
備考	



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	外壁
使用材料	マイルドシーラーES
工事内容	下塗り (シーラー塗り)
備考	



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料




年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番: 19-80F
工事内容	材料搬入 16キロ×3セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD 型ポリウレタン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現し、 耐候性1種に相当する性能を持つ塗料

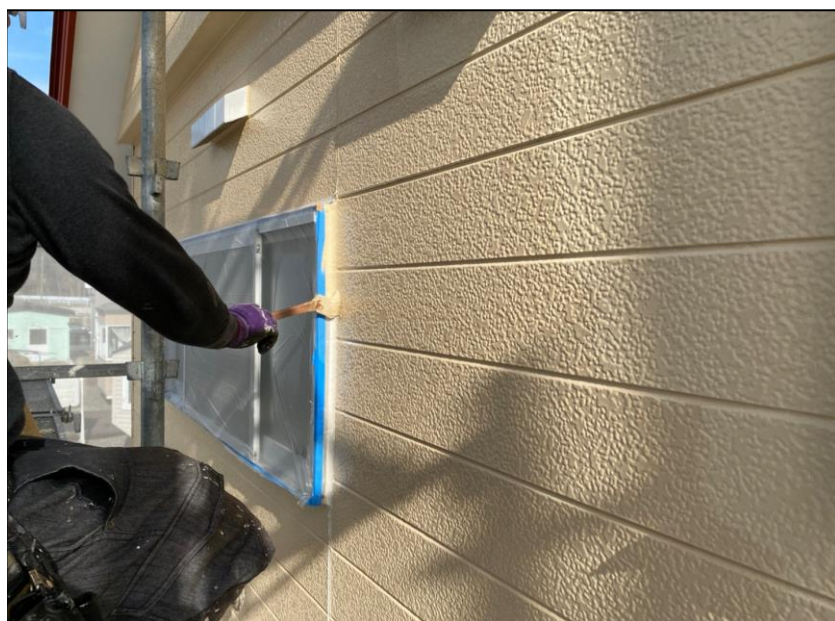

年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	中塗り(上塗り1回目)
備考	

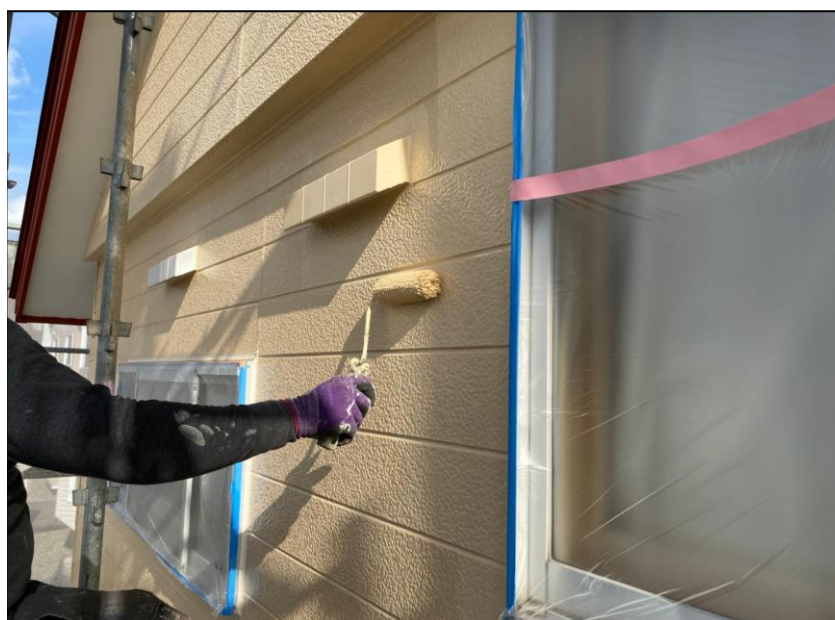


年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	中塗り(上塗り1回目)
備考	



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り(上塗り2回目)
備考	



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り(上塗り2回目)
備考	

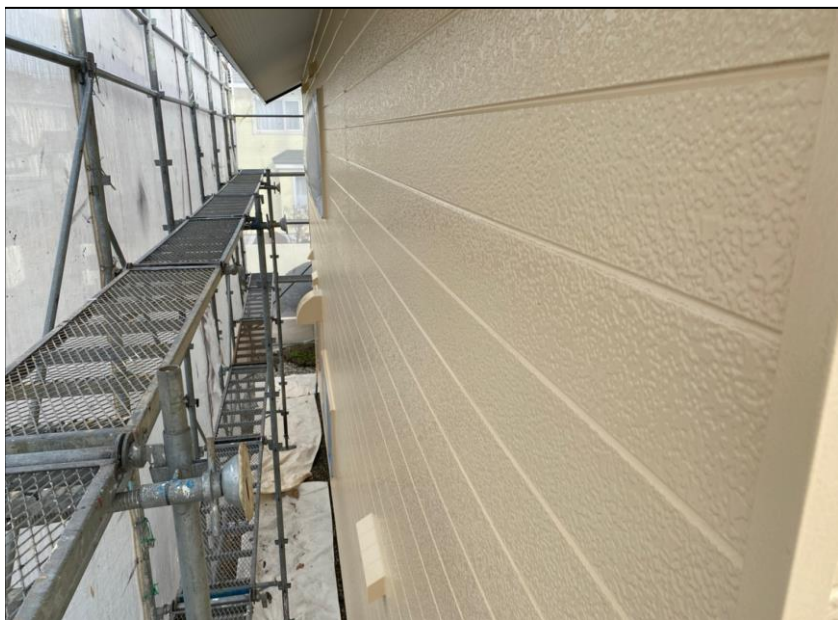

年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り(上塗り2回目)
備考	完了




年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	ホームタンク
使用材料	サンドペーパー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	研磨紙で塗膜に細かい傷を付けて、塗料の密着をよくさせる作業です。



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了

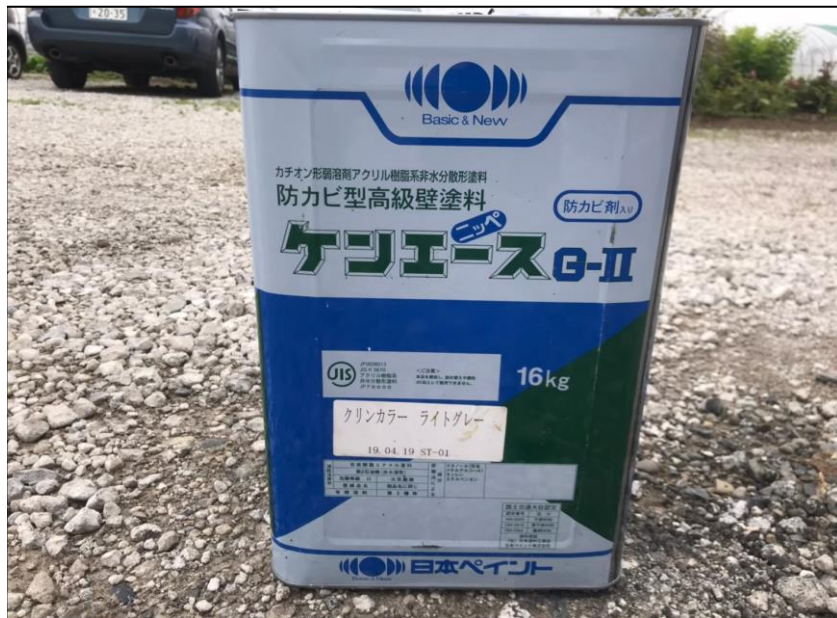

年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースGⅡ
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースGⅡ
工事内容	上塗り
備考	

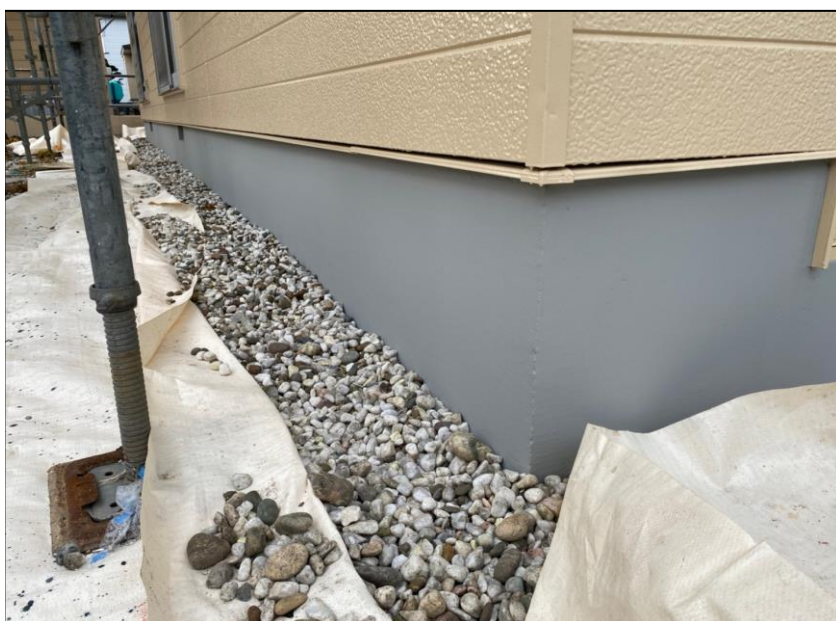

年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースGⅡ
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー
工事内容	清掃
備考	



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー
工事内容	清掃
備考	



年月日	2022. 10. 27～11. 21
工事部位	物置
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	塗装
備考	完了




年月日	2022. 11. 19
工事部位	戸建て住宅
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了




年月日	2022. 11. 21
工事部位	戸建て住宅
使用材料	
工事内容	仮設足場解体
備考	完了



年月日	2022. 11. 21
工事部位	戸建て住宅
使用材料	
工事内容	塗装工事完了
備考	株式会社牧野建装 PAINTERAS

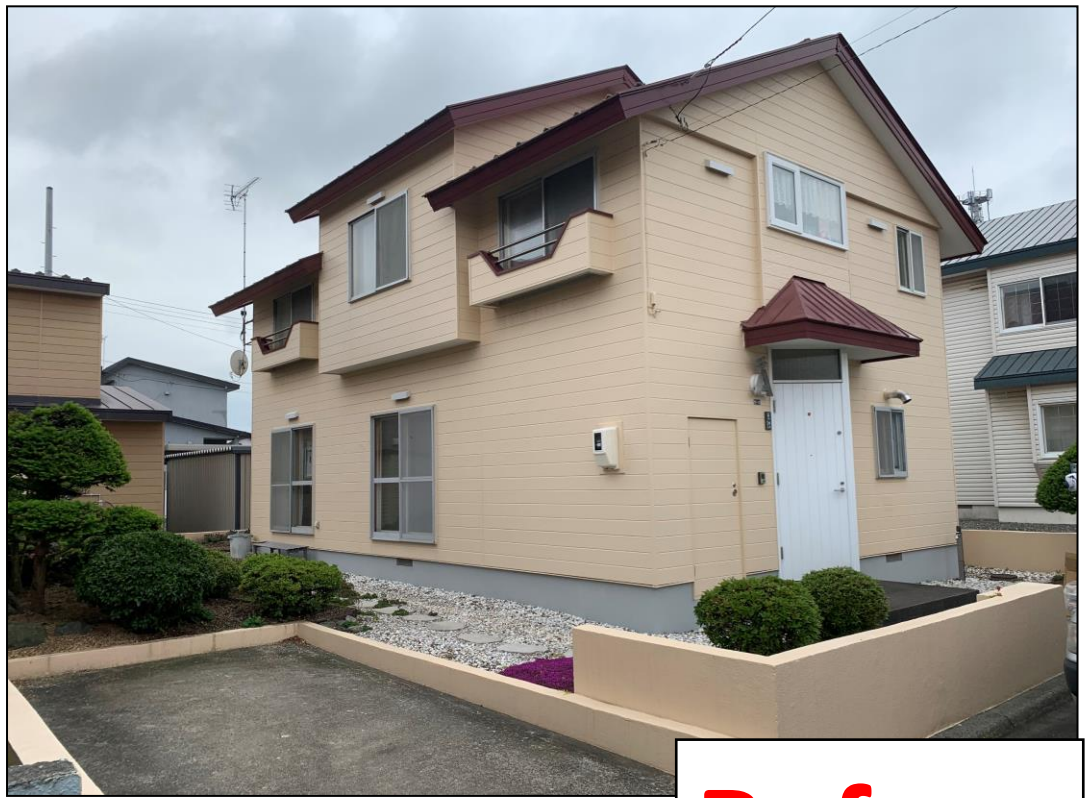

Before



After-



PAINTERAS
株式会社牧野建装
