



年月日	2024. 11. 1
工事部位	Century-F棟
使用材料	
工事内容	施工前
備考	




年月日	2024. 11. 1
工事部位	Century-F棟
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2024. 11. 5
工事部位	Century-F棟
使用材料	
工事内容	仮設足場設置
備考	



年月日	2024. 11. 1
工事部位	Century-G棟
使用材料	
工事内容	施工前
備考	

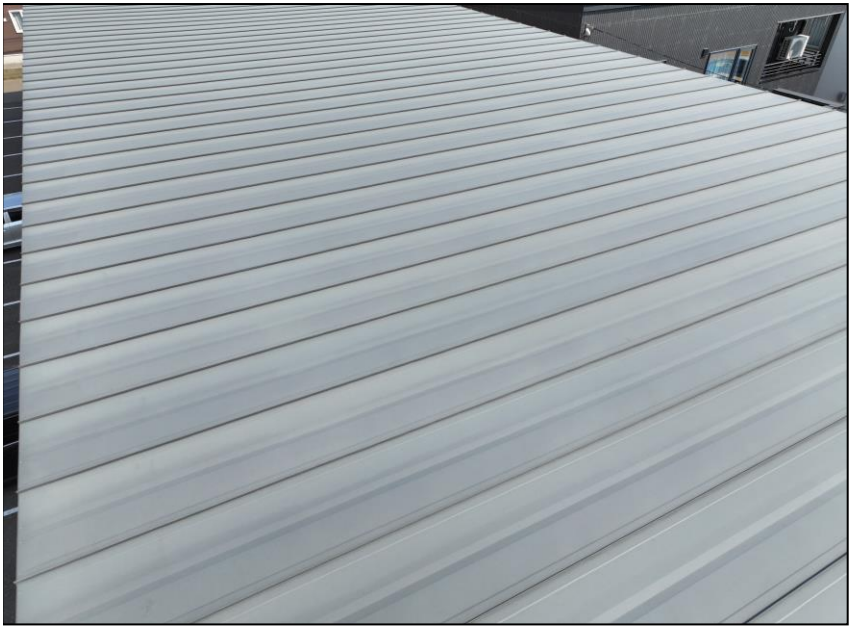

年月日	2024. 11. 1
工事部位	Century-G棟
使用材料	
工事内容	施工前
備考	




年月日	2024. 11. 1
工事部位	Century-G棟
使用材料	
工事内容	仮設足場設置
備考	




年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄。



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	破風
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を洗浄。

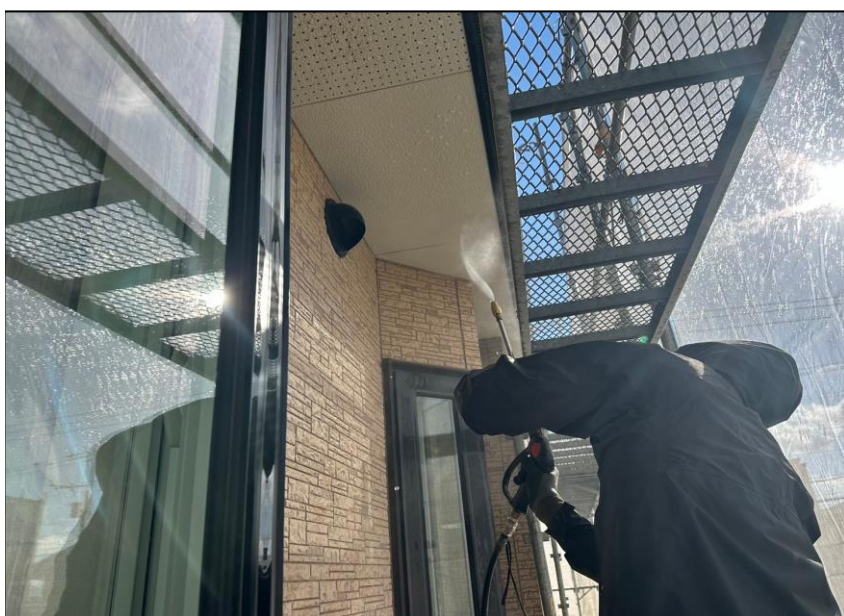

年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	軒天
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリなどの不純物を洗浄。

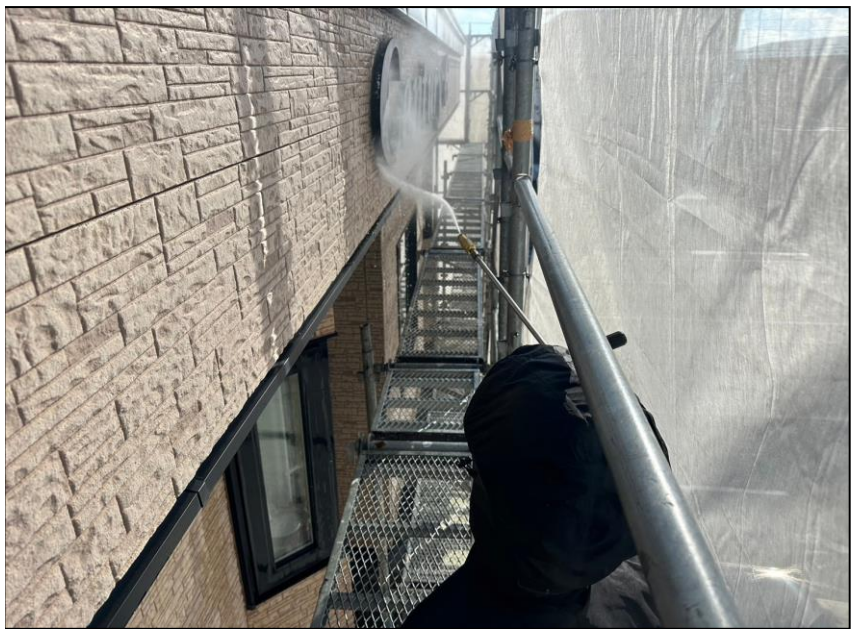

年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を洗浄。



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上




年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	窓
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの汚れを洗浄



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	破風
使用材料	マジックロン(研磨材)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施

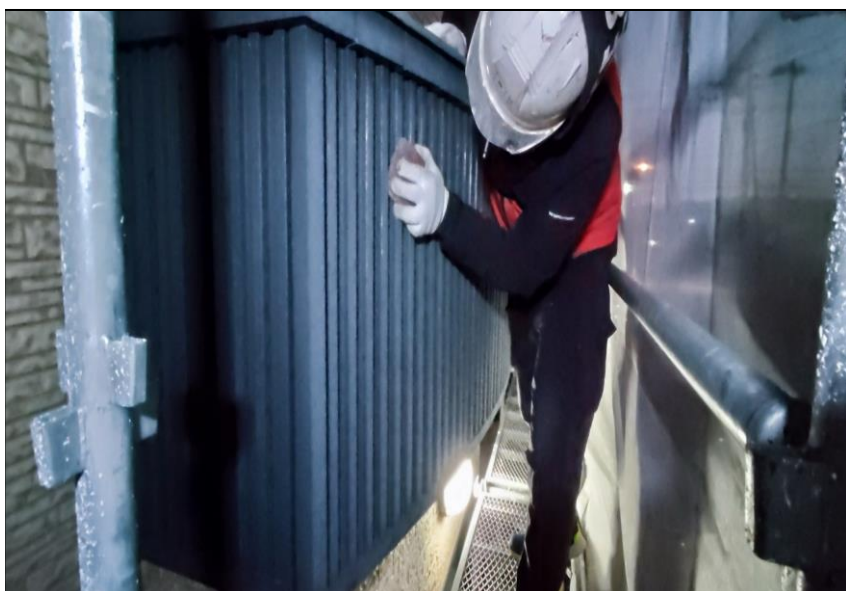

年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	玄関上パラペット
使用材料	マジックロン(研磨材)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	同上




年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン 色: ブラウン
工事内容	材料搬入 20 ^{キロ} × 5セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料 ハイポンファインプライマーⅡ 同等品




年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為に施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	ローラーで塗れないカ所の先行塗り完了

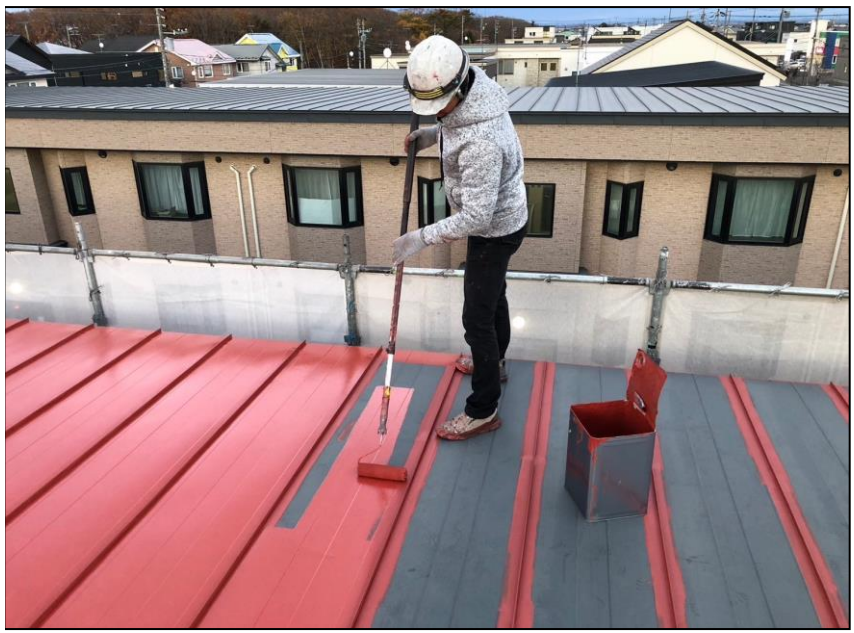


年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	

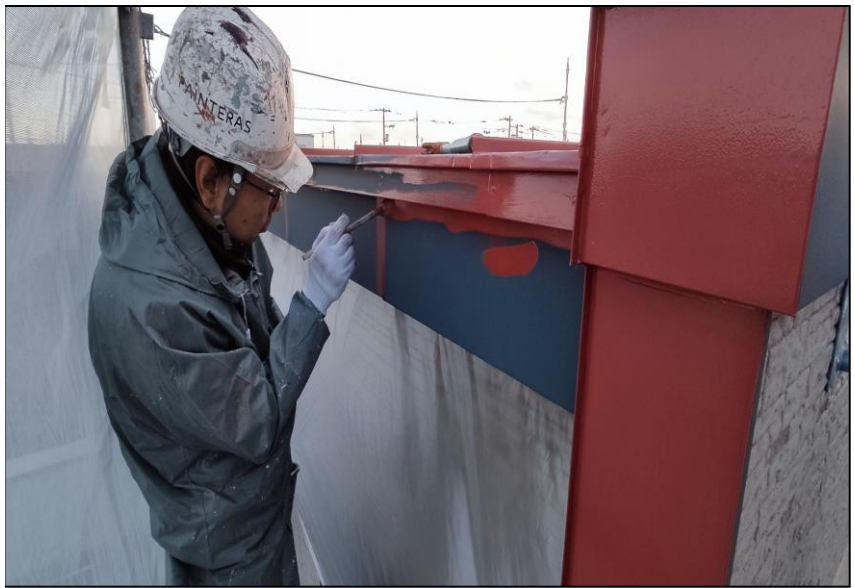


年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	破風
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	玄関上、パラペット
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	

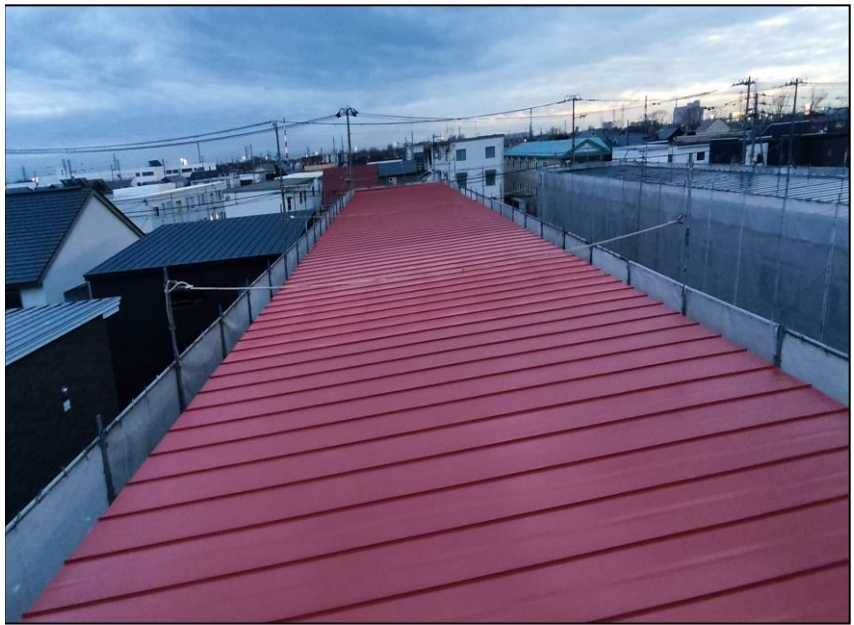

年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了

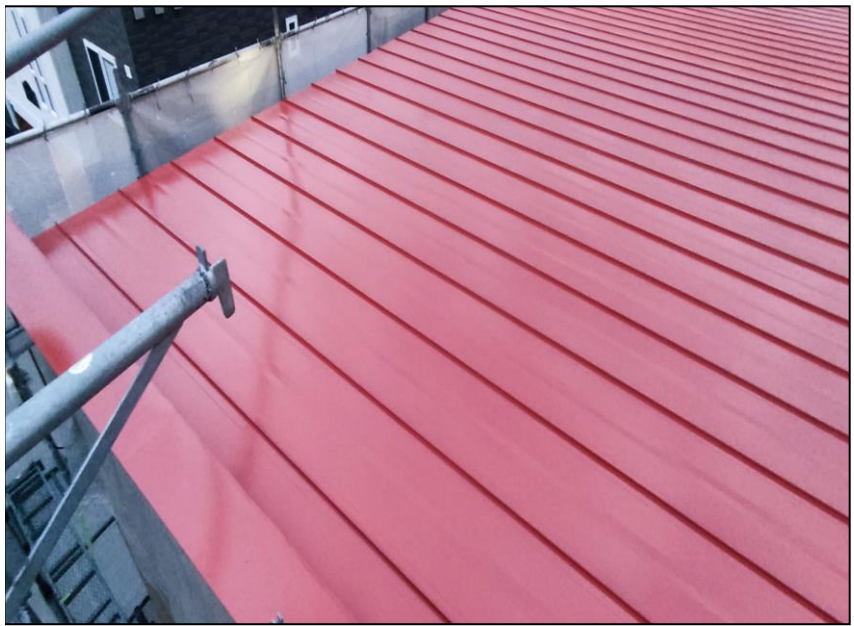


年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	破風
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	玄関上、パラペット
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了

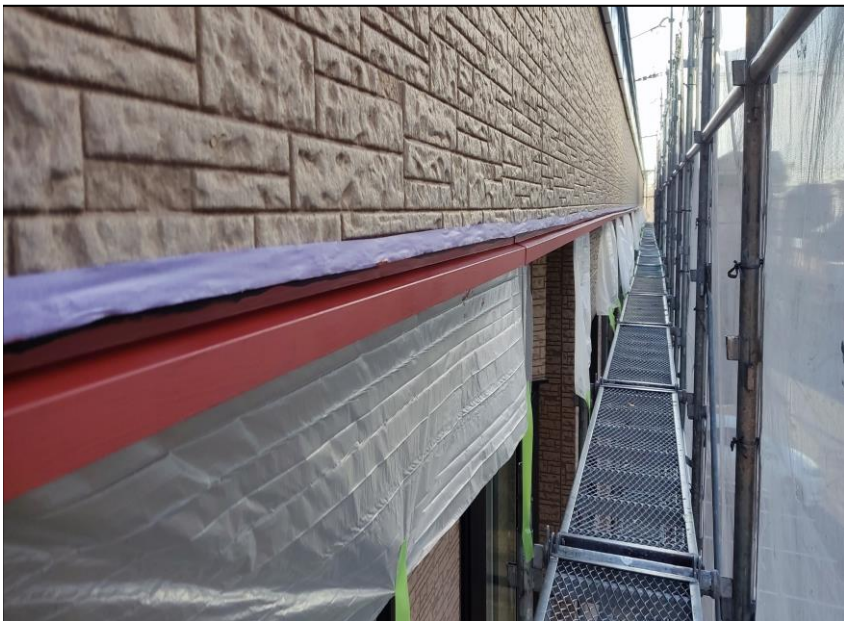


年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁水切り
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI 色番:チャコールグレー
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×6セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂トタン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用により、優れた耐候性及び耐久性を発揮します。



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	サビ止め作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと中塗り塗料を塗りこみました。

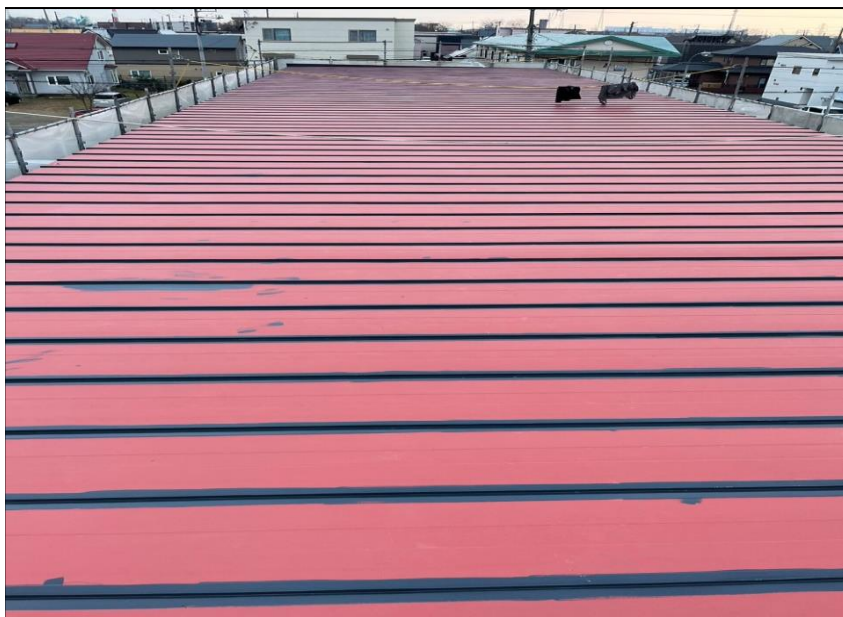

年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	ローラーで塗れないカ所の先行塗り完了



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	玄関上、パラペット
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	中塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。




年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	玄関上、パラペット
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	

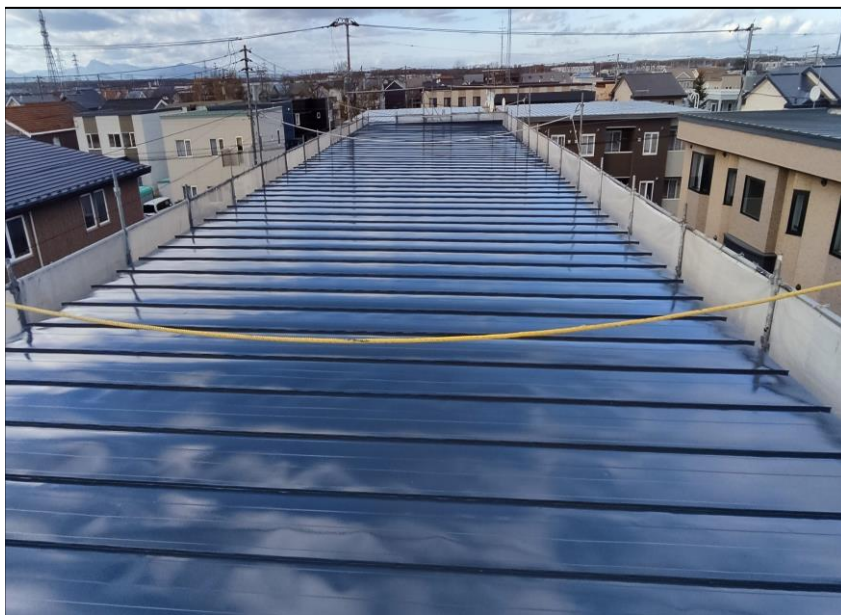

年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	Century-F棟
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了




年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	Century-G棟
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了

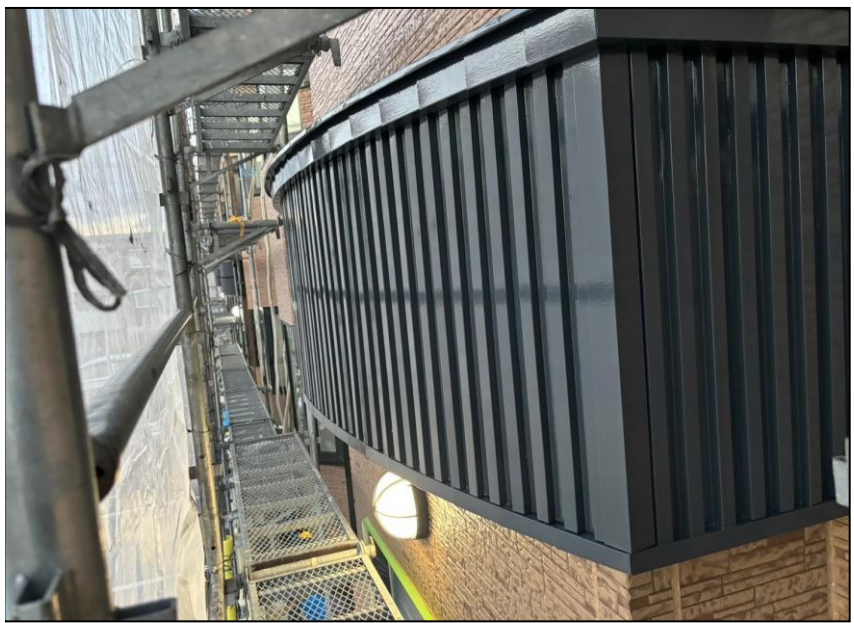


年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	玄関上、パラペット
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	玄関上、パラペット
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	軒天
使用材料	ボール、ハンマー
工事内容	腐食箇所、既存スレート撤去
備考	

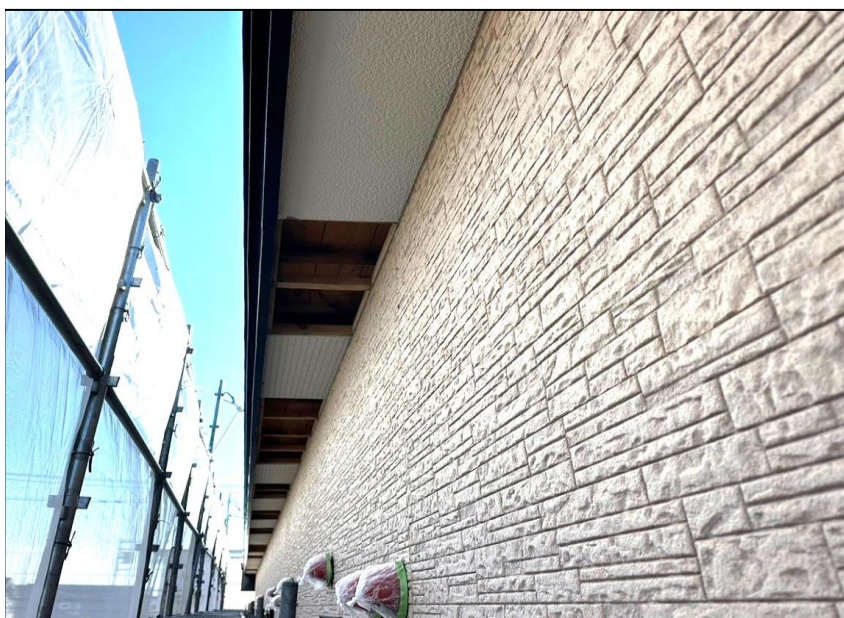


年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	軒天
使用材料	ボール、ハンマー
工事内容	腐食箇所、既存スレート撤去
備考	完了



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	軒天
使用材料	ボール、ハンマー
工事内容	腐食箇所、既存スレート撤去
備考	完了




年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	軒天
使用材料	ボール、ハンマー
工事内容	腐食箇所、既存スレート撤去
備考	完了

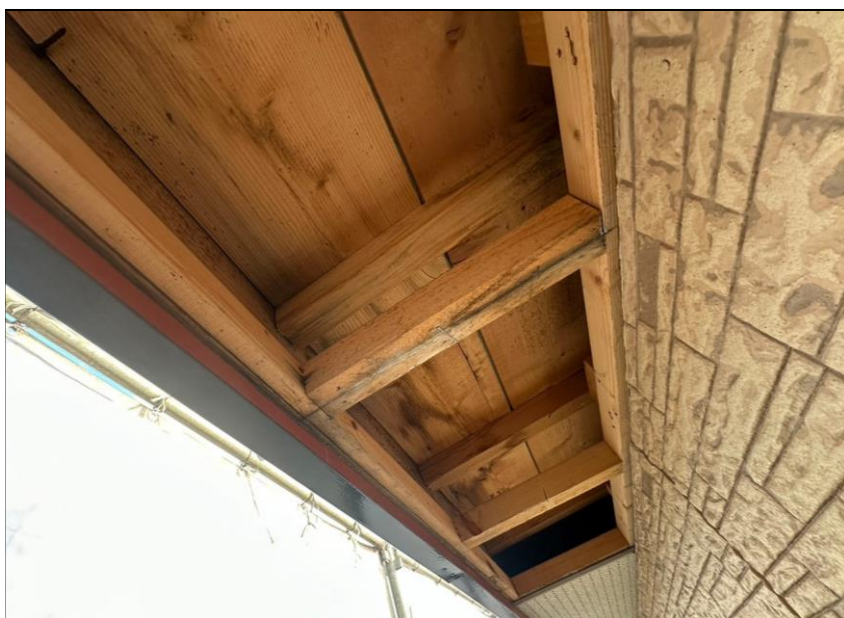


年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	軒天
使用材料	ボール、ハンマー
工事内容	腐食箇所、既存スレート撤去
備考	完了



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	軒天
使用材料	11mm有孔スレートボード
工事内容	貼替
備考	

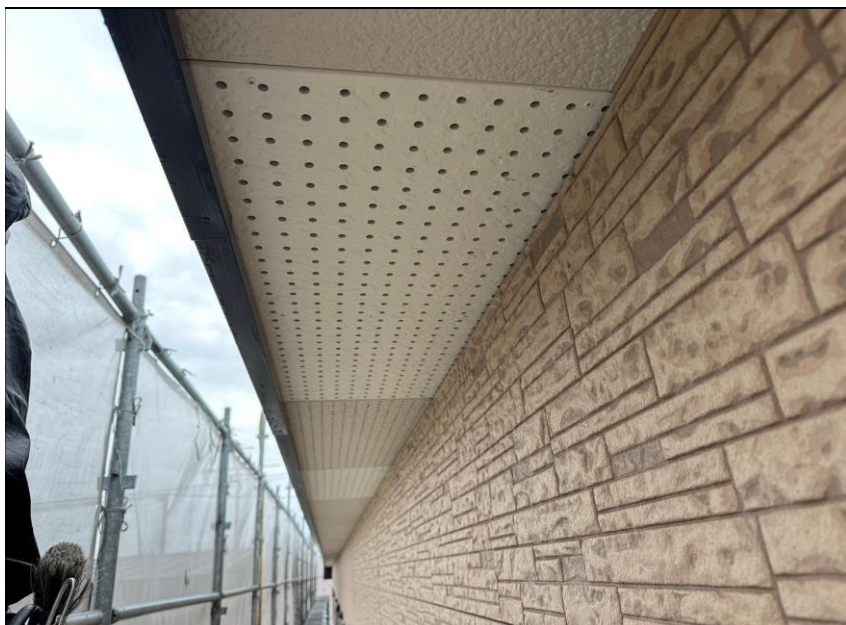

年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	軒天
使用材料	11mm有孔スレートボード
工事内容	貼替
備考	完了

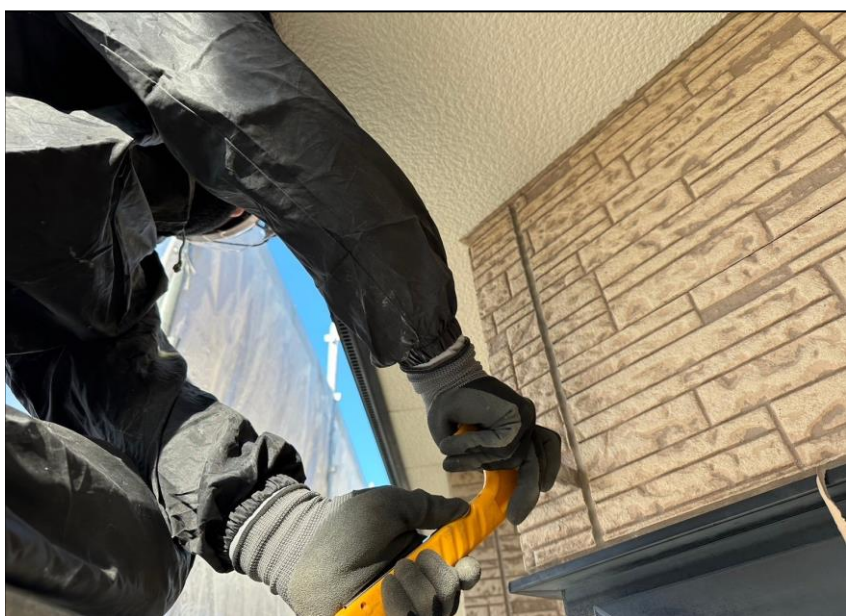

年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去中
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去後
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去後
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁
使用材料	2液形変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	材料搬入
備考	4L×20缶 プライマー＝5缶 搬入



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗り
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁
使用材料	2液形変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁
使用材料	2液形変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	



工事部位	外壁
使用材料	2液形変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了



年月日	2024. 11. 1~12. 27
工事部位	外壁
使用材料	2液形変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了



年月日	2024. 11. 1~12. 27
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料搬入 15 ^{kg} × 1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁腐食部
使用材料	
工事内容	腐食部補修
備考	補修前



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁腐食部
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	タッチアップ塗装
備考	厚膜下塗り材を塗布し、外壁材の保護



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁腐食部
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	タッチアップ塗装
備考	外壁色に調色してタッチアップ塗装

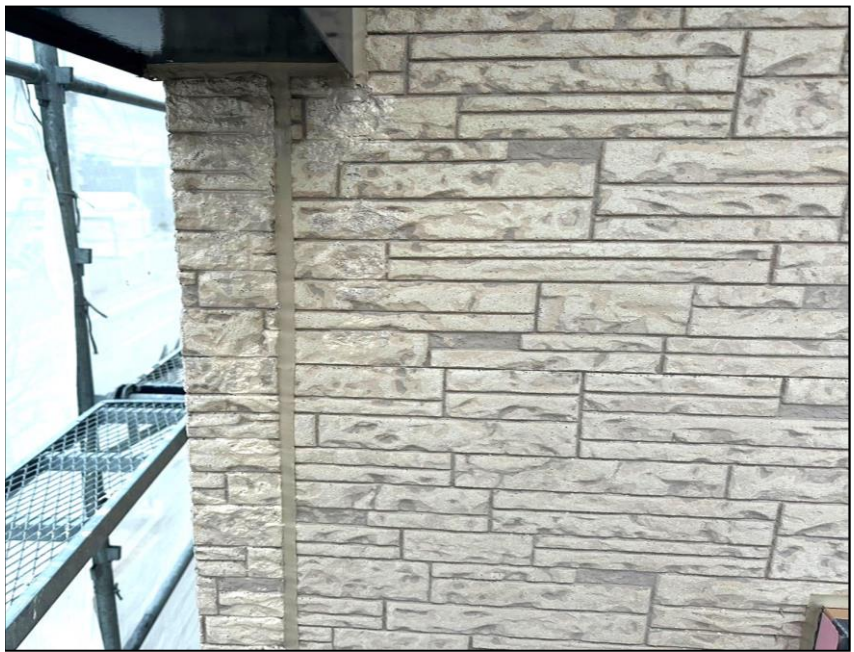

年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁腐食部
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	タッチアップ塗装
備考	完了




年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトクリアー
工事内容	材料搬入 15キロ×10セット
備考	セラミック系外壁保護クリヤー 高耐光性、紫外線吸収、超低汚染、防カビ性に優れているクリヤー塗料材です。




年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトクリアー
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトクリアー
工事内容	下塗り
備考	

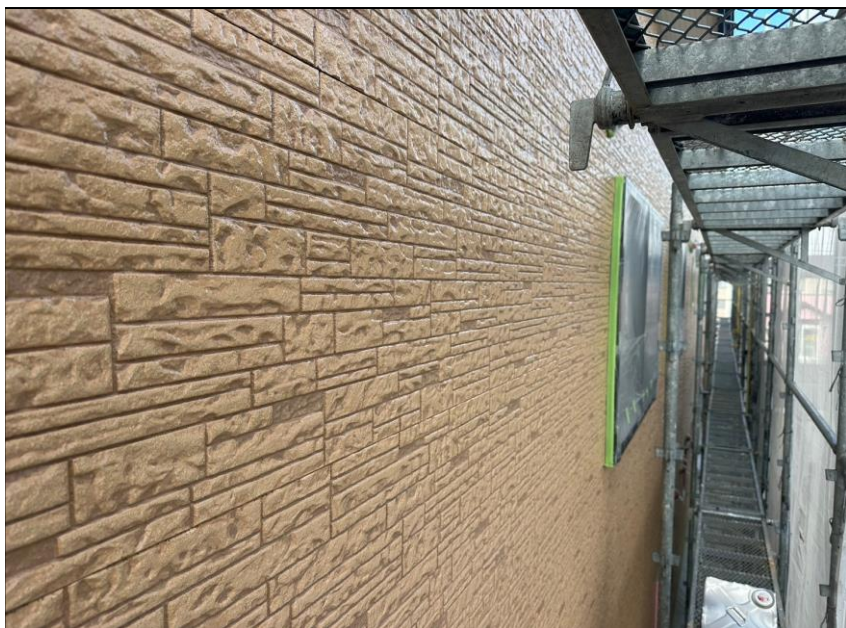

年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトクリアー
工事内容	下塗り
備考	完了

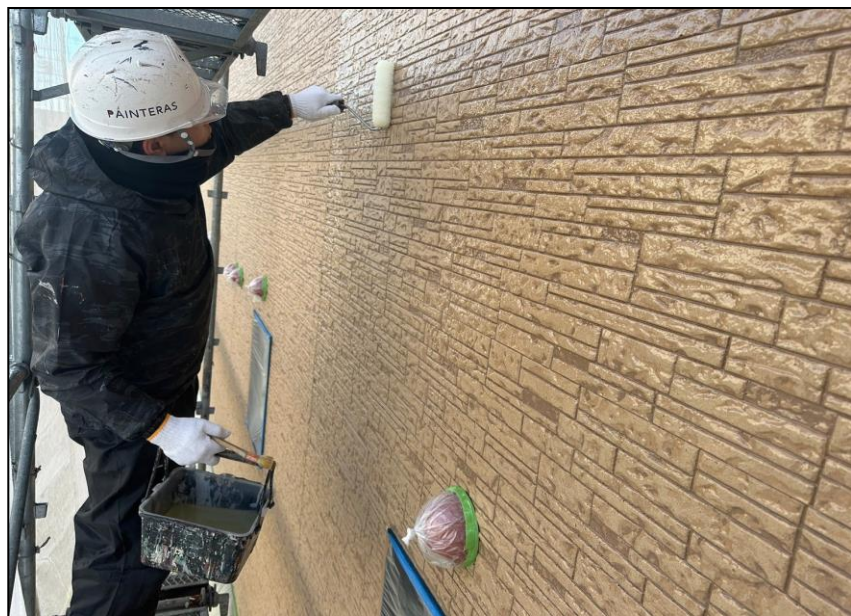


年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトクリアー
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトクリアー
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトクリアー
工事内容	上塗り
備考	完了

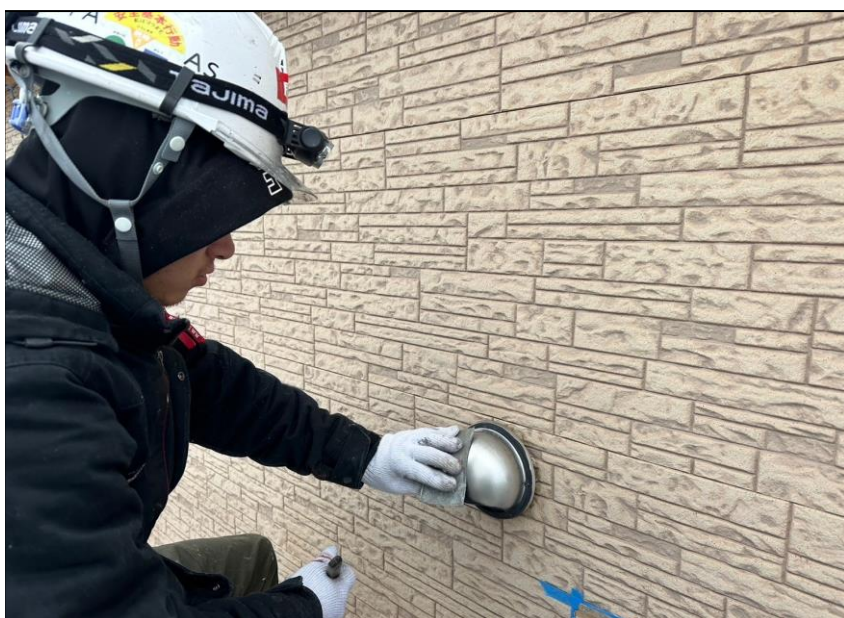

年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	換気フード
使用材料	サンドペーパー #180
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	換気フード
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	換気フード
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	換気フード
使用材料	
工事内容	水切り取り付け
備考	浴槽換気口に水切りを取付けて結露対策



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	基礎
使用材料	キソエース 色番:ライトグレー
工事内容	材料搬入 20 ^キ ×2セット
備考	水性反応硬化形基礎専用シリコン系塗料 シリコン系塗膜で低汚染性能とコンクリートの中酸化抑制効果を発揮する高耐久の基礎部専用塗料



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	基礎
使用材料	キソエース
工事内容	下塗り
備考	

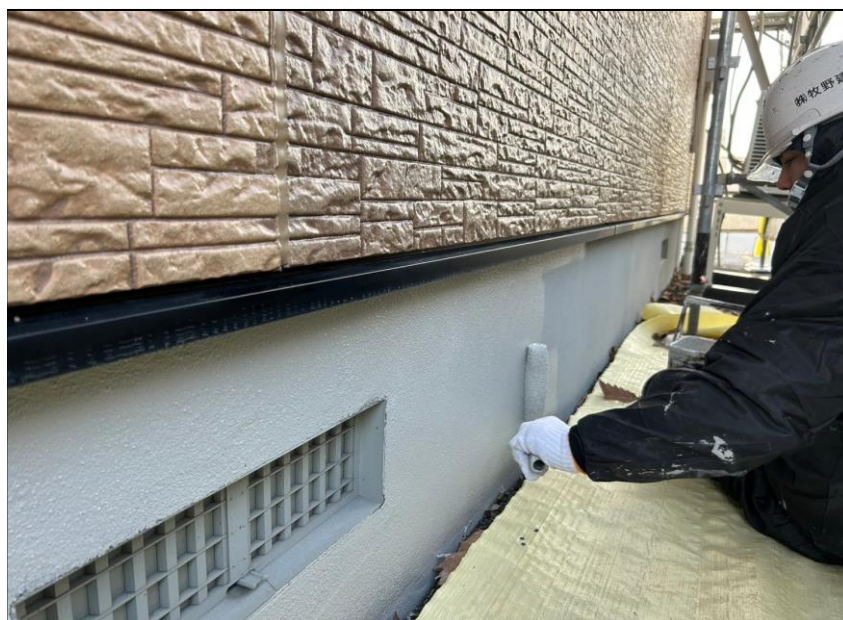

年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	基礎
使用材料	キソエース
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	基礎
使用材料	キシエース
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	基礎
使用材料	キシエース
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	看板
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	看板
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	看板
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了

余 白

年月日	
工事部位	
使用材料	
工事内容	
備考	



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	Century-F棟
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	Century-F棟
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	Century-F棟
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	Century-G棟
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了




年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	Century-G棟
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2024. 11. 1～12. 27
工事部位	Century-G棟
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



Before




After-



PAINTERAS
株式会社牧野建装



Before



After-



PAINTERAS
株式会社牧野建装
