



|      |            |
|------|------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8 |
| 工事部位 | 全体         |
| 使用材料 |            |
| 工事内容 | 施工前        |
| 備考   |            |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 全体               |
| 使用材料 |                  |
| 工事内容 | 仮設足場設置           |
| 備考   |                  |



|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4               |
| 工事部位 | 屋根                             |
| 使用材料 | 屋根用研磨材                         |
| 工事内容 | 下地調整<br>(ケレン)                  |
| 備考   | 錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施 |



|      |                       |
|------|-----------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4      |
| 工事部位 | 破風                    |
| 使用材料 | サンドペーパー＃180           |
| 工事内容 | 下地調整<br>(ケレン)         |
| 備考   | 細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施 |




|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4               |
| 工事部位 | 屋根                             |
| 使用材料 | 水                              |
| 工事内容 | 高圧水洗浄                          |
| 備考   | 劣化塗膜を除去、またホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄。 |




|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 軒天               |
| 使用材料 | 水                |
| 工事内容 | 高圧水洗浄            |
| 備考   | ホコリや潮などの不純物を清掃   |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 外壁               |
| 使用材料 | 水                |
| 工事内容 | 高圧水洗浄            |
| 備考   | ホコリや潮などの不純物を清掃   |

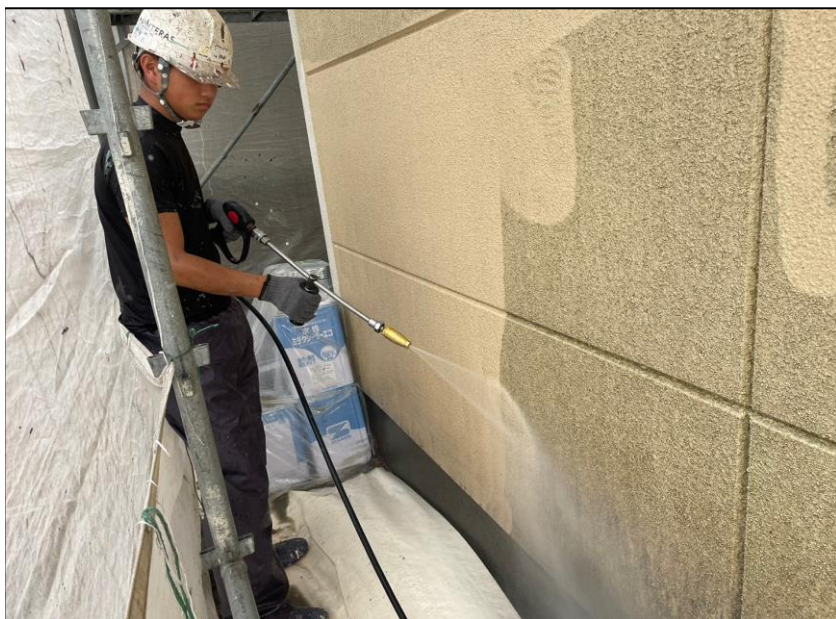


|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 外壁               |
| 使用材料 | 水                |
| 工事内容 | 高圧水洗浄            |
| 備考   | ホコリや潮などの不純物を清掃   |

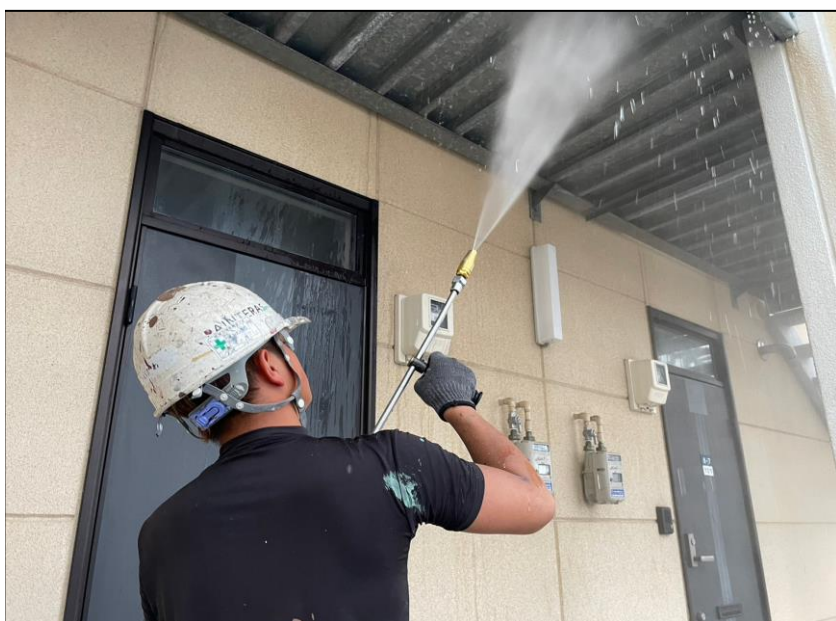

|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 階段               |
| 使用材料 | 水                |
| 工事内容 | 高圧水洗浄            |
| 備考   | ホコリや潮などの汚れを清掃    |




|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 土間               |
| 使用材料 | 水                |
| 工事内容 | 高圧水洗浄            |
| 備考   | 施工前              |

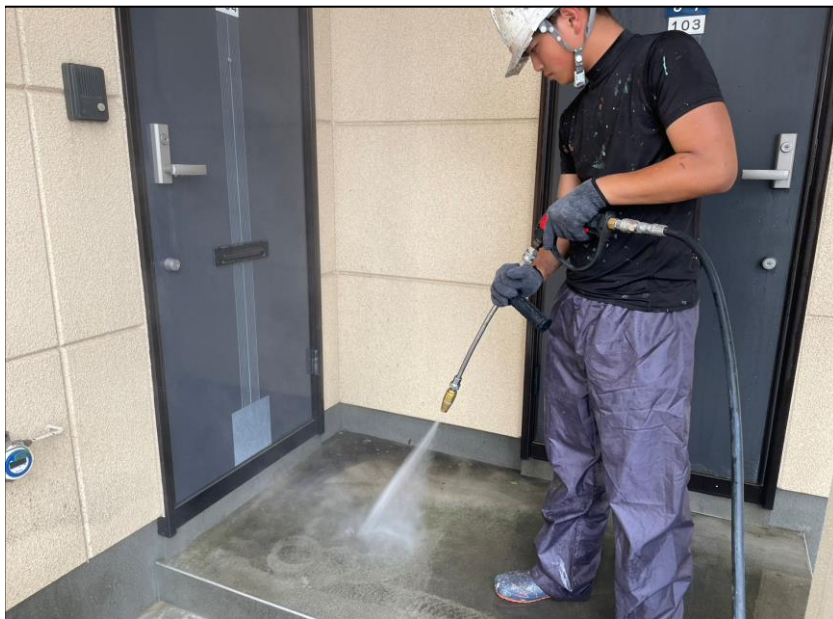

|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 土間               |
| 使用材料 | 水                |
| 工事内容 | 高圧水洗浄            |
| 備考   | 施工中              |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 土間               |
| 使用材料 | 水                |
| 工事内容 | 高圧水洗浄            |
| 備考   | 施工後              |

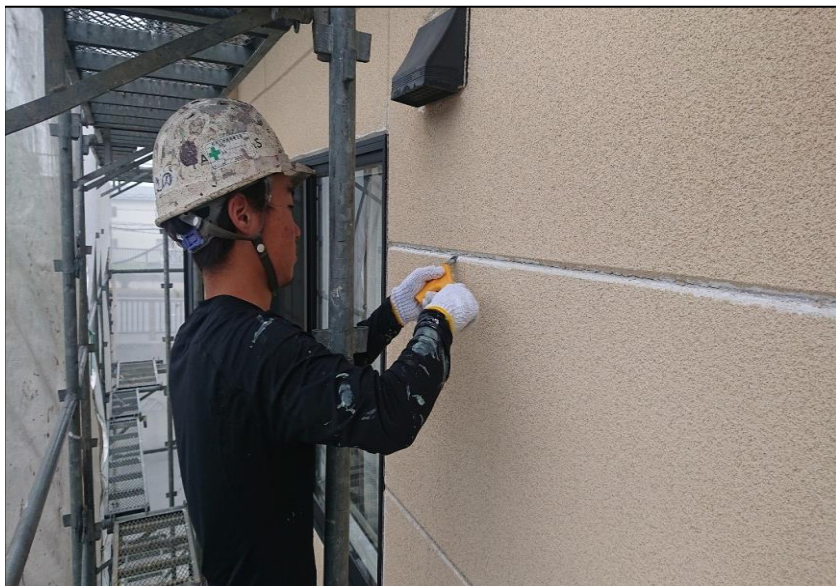


|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 外壁               |
| 使用材料 | コーキング撤去用カッター     |
| 工事内容 | 既存コーキング撤去後       |
| 備考   |                  |




|      |                      |
|------|----------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4     |
| 工事部位 | 外壁                   |
| 使用材料 | 2液形ウレタン樹脂コーキング       |
| 工事内容 | 材料搬入                 |
| 備考   | 6L×8缶<br>プライ6缶<br>搬入 |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 外壁               |
| 使用材料 | コーキングプライマー       |
| 工事内容 | プライマー塗り          |
| 備考   |                  |

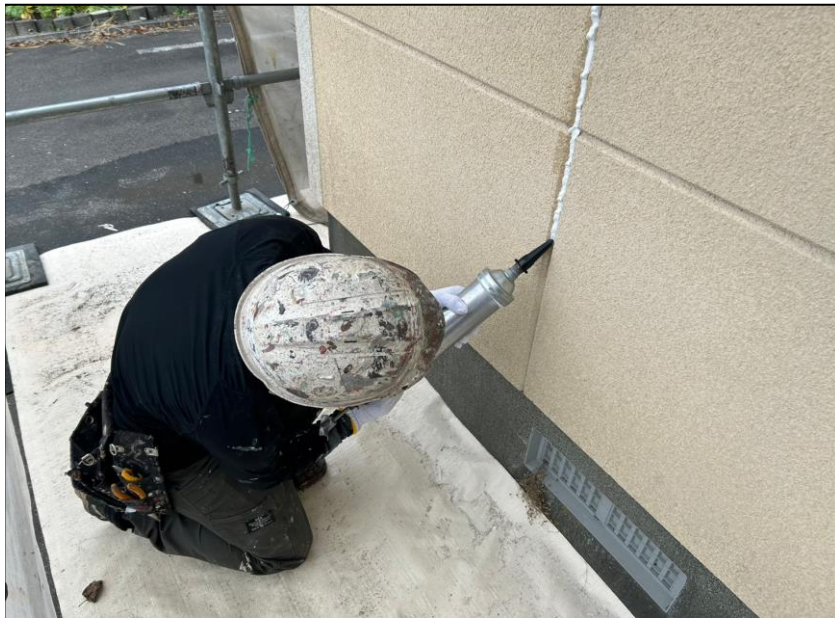

|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 外壁               |
| 使用材料 | ウレタン樹脂コーキング      |
| 工事内容 | コーキング充填          |
| 備考   |                  |

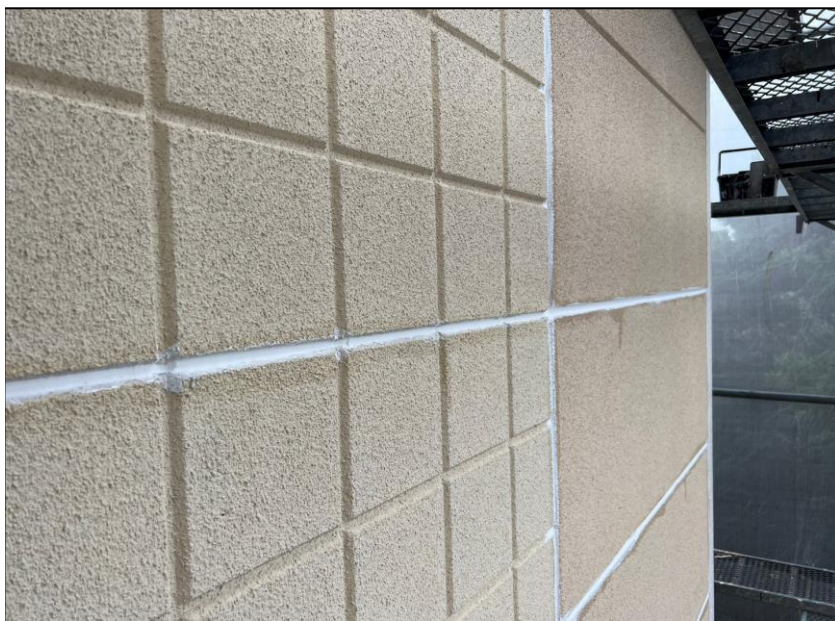

|      |                    |
|------|--------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4   |
| 工事部位 | 外壁                 |
| 使用材料 | ウレタン樹脂コーキング        |
| 工事内容 | コーキングへら押え<br>(仕上げ) |
| 備考   | 完了                 |



|      |                    |
|------|--------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4   |
| 工事部位 | 外壁                 |
| 使用材料 | ウレタン樹脂コーキング        |
| 工事内容 | コーキングへら押え<br>(仕上げ) |
| 備考   | 完了                 |



|      |                    |
|------|--------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4   |
| 工事部位 | 外壁                 |
| 使用材料 | ウレタン樹脂コーキング        |
| 工事内容 | コーキングへら押え<br>(仕上げ) |
| 備考   | 完了                 |




|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4                                                               |
| 工事部位 | 屋根                                                                             |
| 使用材料 | ファインルーフSI<br>色番:ニューワイン                                                         |
| 工事内容 | 材料搬入<br>15 <sup>キロ</sup> ×3セット                                                 |
| 備考   | 上塗り塗料<br>2液形特殊シリコン系樹脂ト<br>タン屋根用塗料<br>特殊シリコン樹脂の採用に<br>より、優れた耐候性及び耐<br>久性を発揮します。 |



|      |                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4                                                                                                       |
| 工事部位 | 屋根                                                                                                                     |
| 使用材料 | ファインルーフSI                                                                                                              |
| 工事内容 | 下塗り<br>(先行塗り)                                                                                                          |
| 備考   | 1番錆びる箇所「板金面の折り<br>返し溝の中」もしっかりとサビ止<br>め塗料を塗りこみます。<br>この作業は時間がかかる為に<br>施工を曖昧にしている業者が<br>多いのが現状ですが、当社で<br>はしっかりと施工しております。 |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 屋根               |
| 使用材料 | ファインルーフSI        |
| 工事内容 | 下塗り              |
| 備考   |                  |

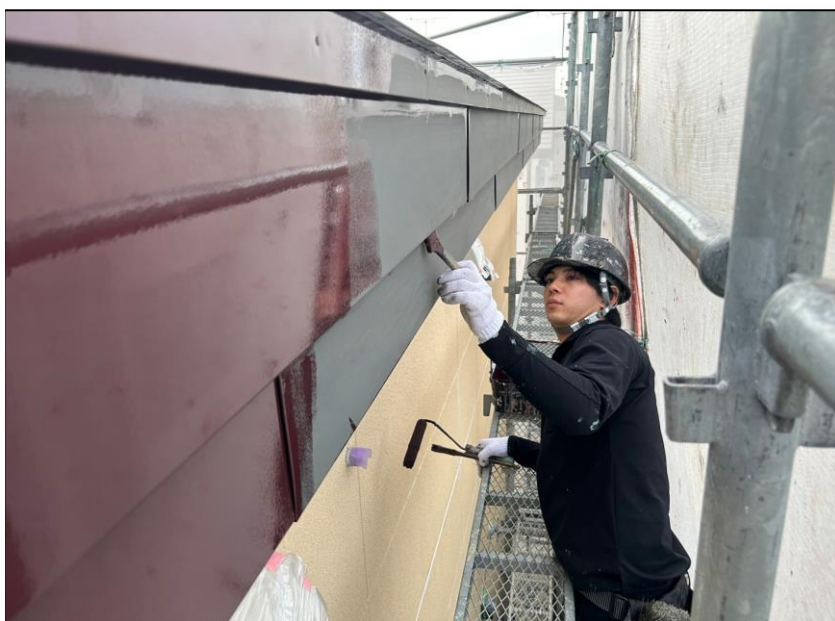

|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 破風               |
| 使用材料 | ファインルーフSI        |
| 工事内容 | 下塗り              |
| 備考   |                  |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 屋根               |
| 使用材料 | ファインルーフSI        |
| 工事内容 | 下塗り              |
| 備考   | 完了               |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 破風               |
| 使用材料 | ファインルーフSI        |
| 工事内容 | 下塗り              |
| 備考   | 完了               |




|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 屋根               |
| 使用材料 | ファインルーフSI        |
| 工事内容 | 上塗り              |
| 備考   |                  |




|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 屋根               |
| 使用材料 | ファインルーフSI        |
| 工事内容 | 上塗り              |
| 備考   |                  |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 破風               |
| 使用材料 | ファインルーフSI        |
| 工事内容 | 上塗り              |
| 備考   |                  |

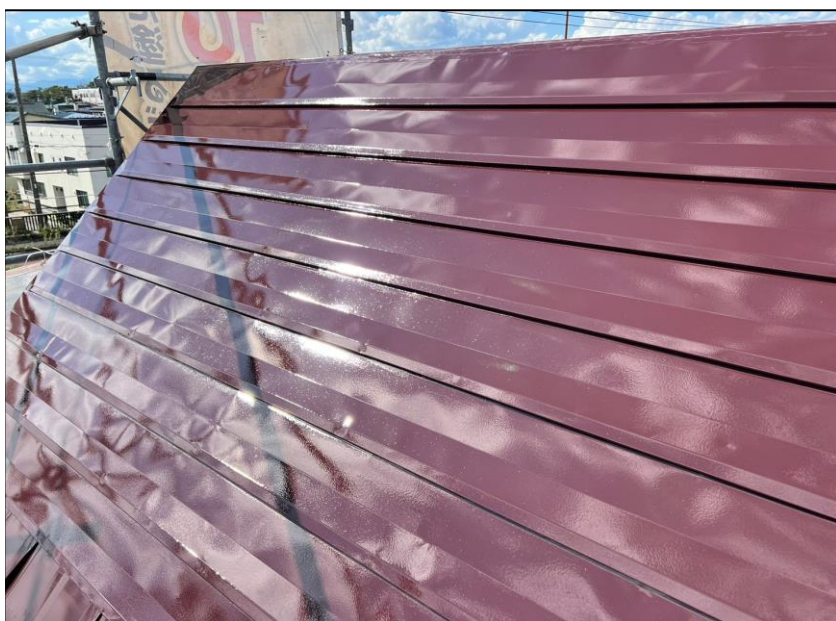

|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 屋根               |
| 使用材料 | ファインルーフSI        |
| 工事内容 | 上塗り              |
| 備考   | 完了               |

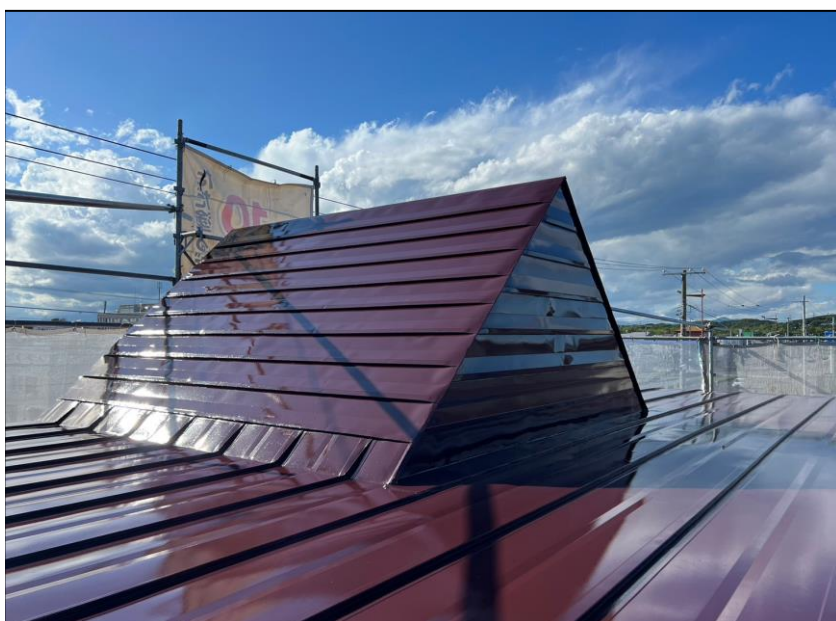


|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 屋根               |
| 使用材料 | ファインルーフSI        |
| 工事内容 | 上塗り              |
| 備考   | 完了               |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 屋根               |
| 使用材料 | ファインルーフSI        |
| 工事内容 | 上塗り              |
| 備考   | 完了               |




|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 屋根               |
| 使用材料 | ファインルーフSI        |
| 工事内容 | 上塗り              |
| 備考   | 完了               |

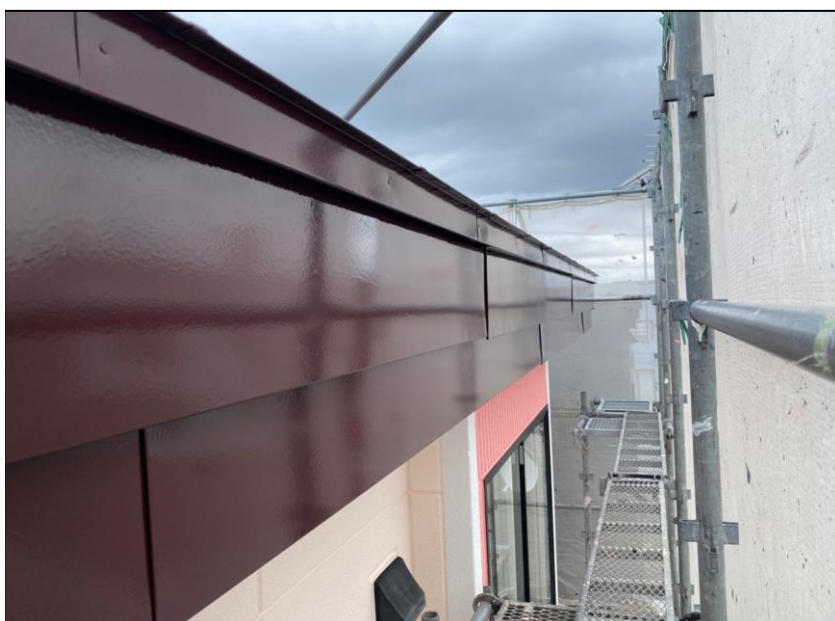


|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 破風               |
| 使用材料 | ファインルーフSI        |
| 工事内容 | 上塗り              |
| 備考   | 完了               |



|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4                                               |
| 工事部位 | 外壁                                                             |
| 使用材料 | 水性ミラクシーラーエコ                                                    |
| 工事内容 | 材料搬入<br>15 <sup>キ</sup> □×3缶                                   |
| 備考   | 各種旧塗膜や、各種水性仕上塗材と強固に付着し、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持できる下塗り塗料 |

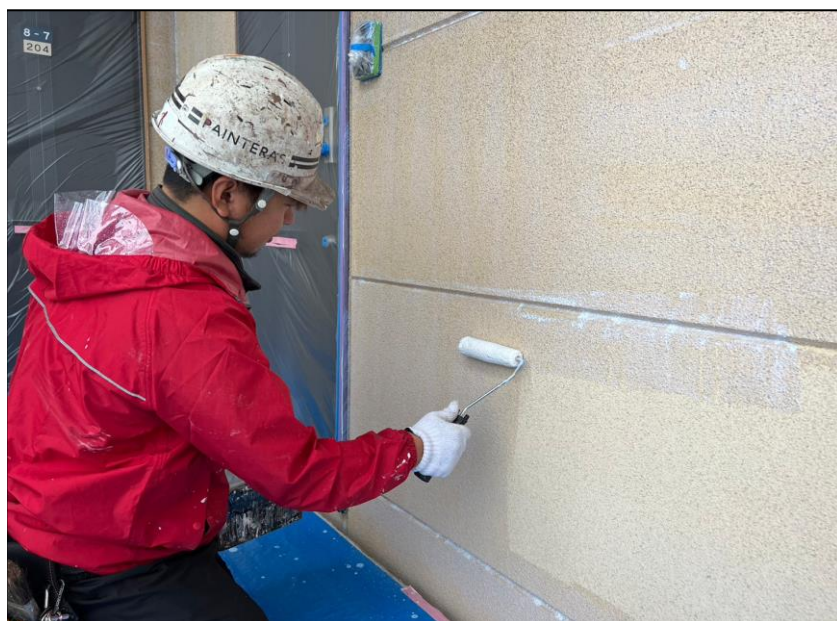

|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 外壁               |
| 使用材料 | 水性ミラクシーラーエコ      |
| 工事内容 | 下塗り              |
| 備考   |                  |

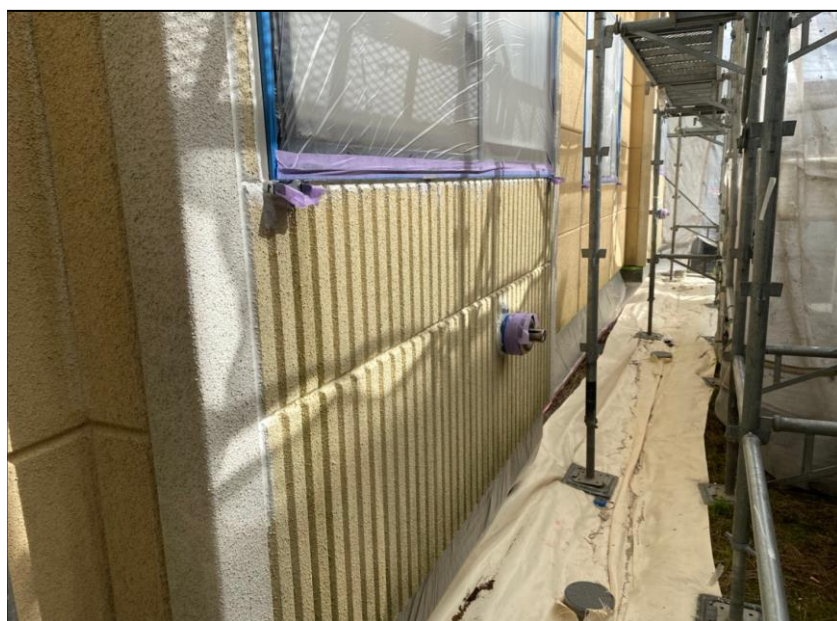

|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 外壁               |
| 使用材料 | 水性ミラクシーラーエコ      |
| 工事内容 | 下塗り              |
| 備考   | 完了               |



|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4                                                           |
| 工事部位 | 軒天                                                                         |
| 使用材料 | ケンエースG2                                                                    |
| 工事内容 | 材料搬入<br>15 <sup>キロ</sup> ×1缶                                               |
| 備考   | カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料<br>素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料 |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 軒天               |
| 使用材料 | ケンエースG2          |
| 工事内容 | 上塗り              |
| 備考   |                  |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 軒天               |
| 使用材料 | ケンエースG2          |
| 工事内容 | 上塗り              |
| 備考   |                  |




|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 軒天               |
| 使用材料 | ケンエースG2          |
| 工事内容 | 上塗り              |
| 備考   | 完了               |




|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4                             |
| 工事部位 | 外壁                                           |
| 使用材料 | コンポウレタン(つや消し)                                |
| 工事内容 | 材料搬入                                         |
| 備考   | 色番:15-90D<br>色番:05-70L(出窓色)<br>色番:N-90(ホワイト) |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 外壁               |
| 使用材料 | 水性コンポウレタン        |
| 工事内容 | 中塗り<br>(上塗り1回目)  |
| 備考   |                  |

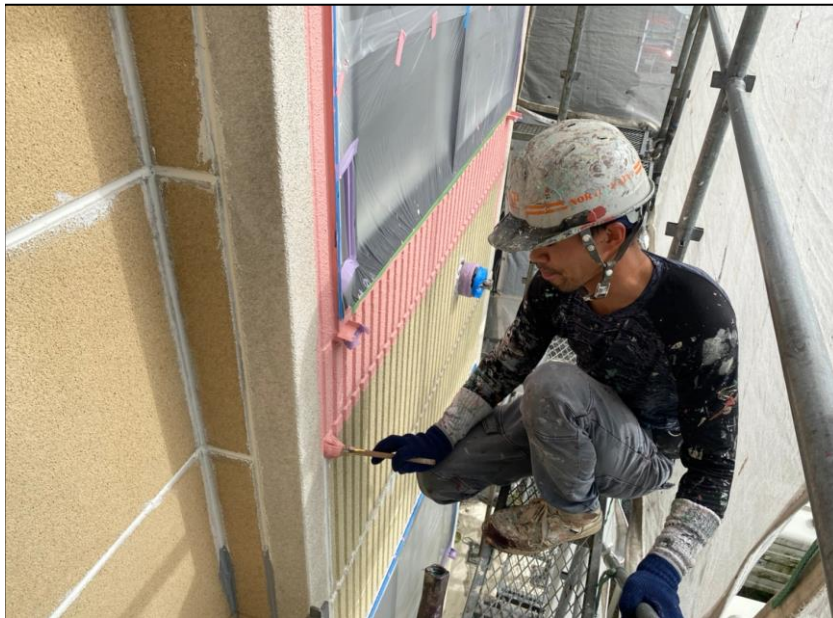

|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 外壁(出窓)           |
| 使用材料 | 水性コンポウレタン        |
| 工事内容 | 中塗り<br>(上塗り1回目)  |
| 備考   |                  |

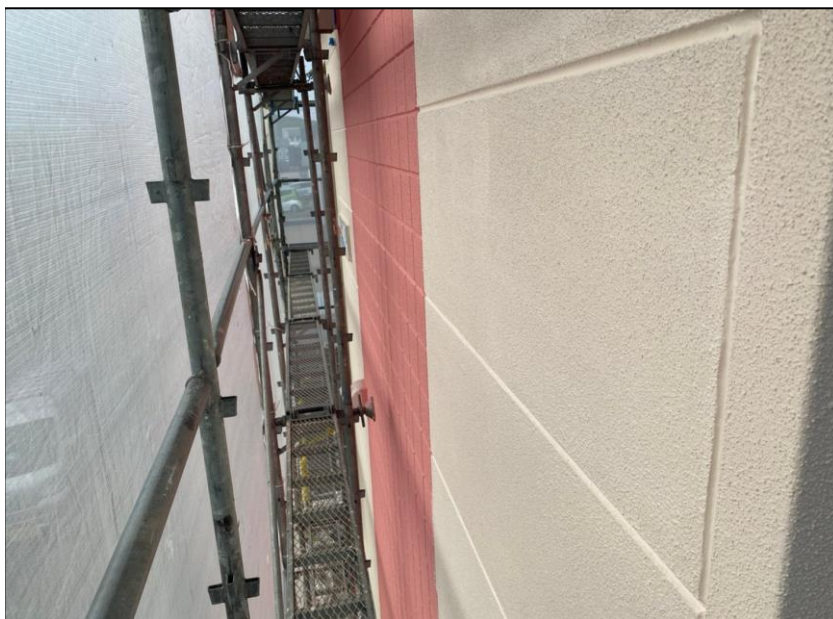

|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 外壁               |
| 使用材料 | 水性コンポウレタン        |
| 工事内容 | 中塗り<br>(上塗り1回目)  |
| 備考   | 完了               |




|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 外壁               |
| 使用材料 | 水性コンポウレタン        |
| 工事内容 | 上塗り<br>(上塗り2回目)  |
| 備考   |                  |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 外壁               |
| 使用材料 | 水性コンポウレタン        |
| 工事内容 | 上塗り<br>(上塗り2回目)  |
| 備考   |                  |




|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 外壁(出窓)           |
| 使用材料 | 水性コンポウレタン        |
| 工事内容 | 上塗り<br>(上塗り2回目)  |
| 備考   |                  |

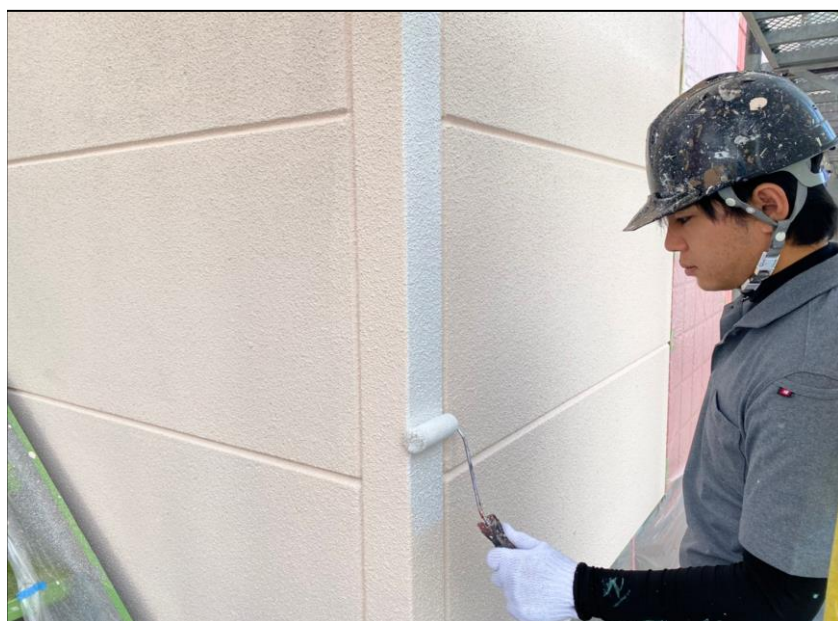

|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 外壁(コーナー)         |
| 使用材料 | 水性コンポウレタン        |
| 工事内容 | 上塗り<br>(上塗り2回目)  |
| 備考   |                  |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 換気フード            |
| 使用材料 | クリーンマイルドシリコン     |
| 工事内容 | 上塗り              |
| 備考   | 完了               |

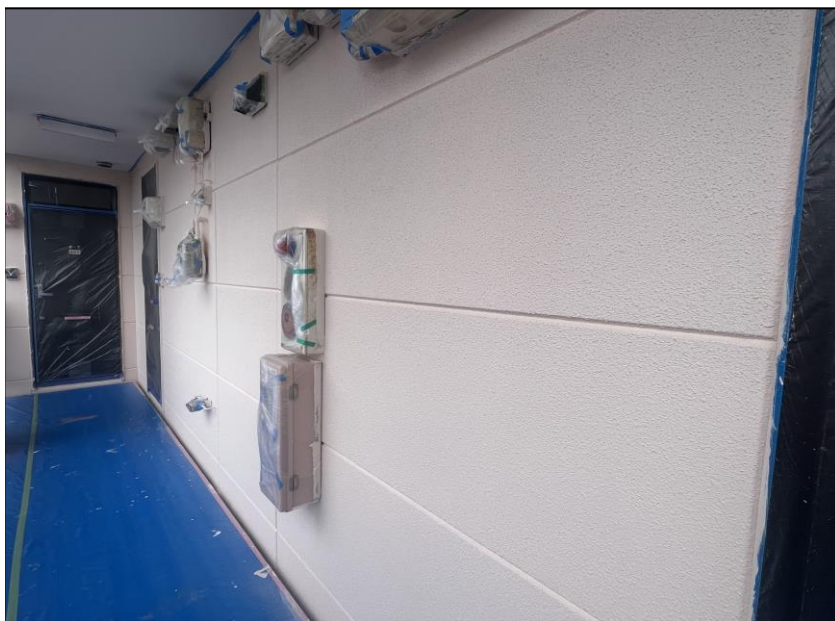

|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 外壁               |
| 使用材料 | 水性コンポウレタン        |
| 工事内容 | 上塗り<br>(上塗り2回目)  |
| 備考   | 完了               |




|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 外壁               |
| 使用材料 | 水性コンポウレタン        |
| 工事内容 | 上塗り<br>(上塗り2回目)  |
| 備考   | 完了               |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 外壁(出窓)           |
| 使用材料 | 水性コンポウレタン        |
| 工事内容 | 上塗り<br>(上塗り2回目)  |
| 備考   | 完了               |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 火災報知器            |
| 使用材料 |                  |
| 工事内容 | 塗装               |
| 備考   | 施工前              |

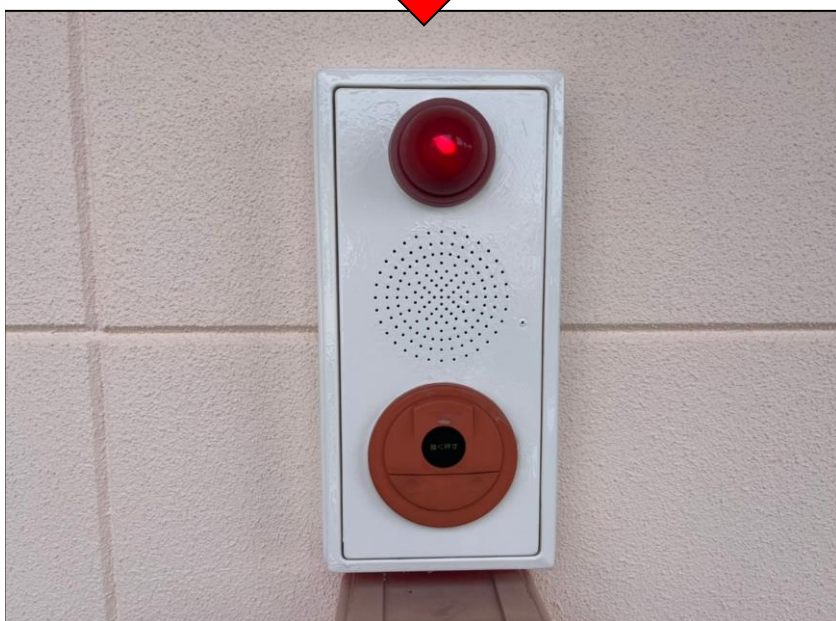

|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 火災報知器            |
| 使用材料 | クリーンマイルドシリコン     |
| 工事内容 | 塗装               |
| 備考   | 施工後              |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 物置               |
| 使用材料 |                  |
| 工事内容 | 塗装               |
| 備考   | 完了               |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | ホームタンク           |
| 使用材料 |                  |
| 工事内容 | 施工前              |
| 備考   |                  |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | ホームタンク           |
| 使用材料 |                  |
| 工事内容 | 施工前              |
| 備考   | サービスにて塗装         |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 屋根、外壁            |
| 使用材料 |                  |
| 工事内容 | 塗装工事             |
| 備考   | 完了               |




|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 屋根、外壁            |
| 使用材料 |                  |
| 工事内容 | 塗装工事             |
| 備考   | 完了               |



|      |                  |
|------|------------------|
| 年月日  | 2023. 9. 8～10. 4 |
| 工事部位 | 屋根、外壁            |
| 使用材料 |                  |
| 工事内容 | 塗装工事             |
| 備考   | 完了               |



**Before**



**After-**



**PAINTERAS**

株式会社牧野建装
