



年月日	2025. 3. 30
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2025. 3. 31
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	仮設足場設置
備考	完了



年月日	2025. 3. 30~4. 17
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、藻や苔などの不純物を洗浄



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	窓
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや汚れなどを洗浄



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	バルコニー屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、藻や苔などの不純物を洗浄



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	基礎
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	藻や苔などの不純物を洗浄



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	ホームタンク
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、藻や苔などの不純物を洗浄



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	バルコニースノコ
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	藻などの汚れを洗浄




年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	インパクトドライバー
工事内容	雪止め撤去
備考	




年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	インパクトドライバー
工事内容	雪止め撤去
備考	完了



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施 錆びていた箇所については、電動工具を使用いたしました。

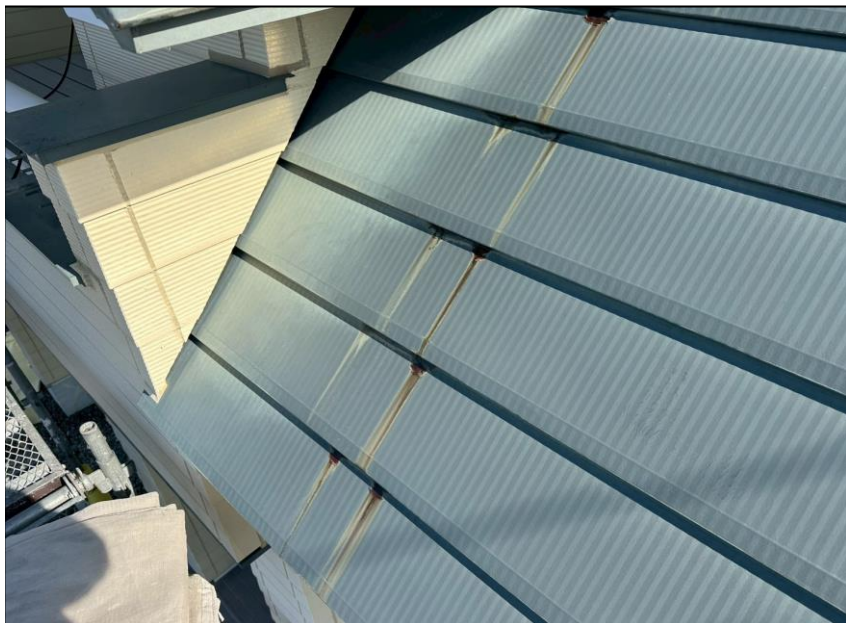

年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整、施工前
備考	

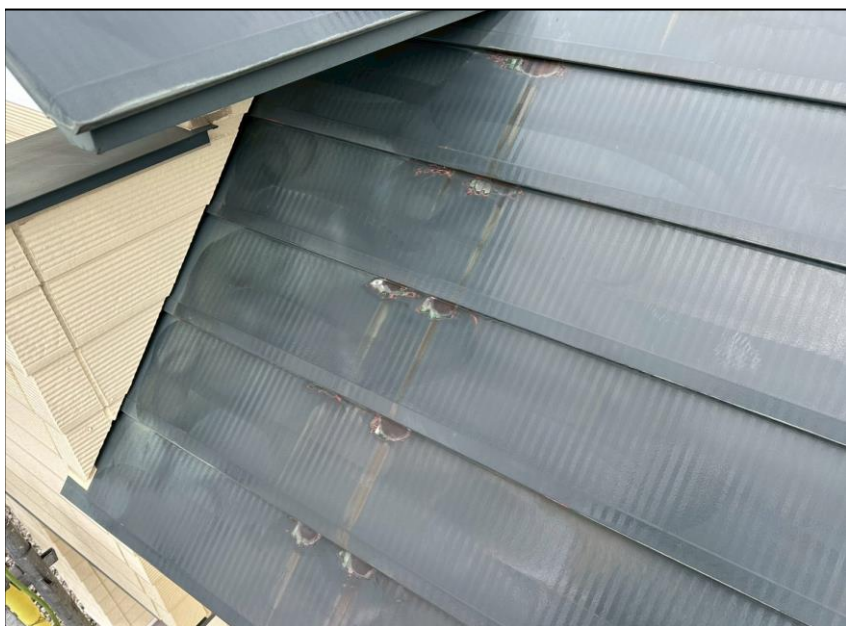

年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	施工後



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	電動工具を使用することで 錆を完全に除去しております。



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去中
備考	



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去後
備考	



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	2液形ウレタン樹脂コーキング
工事内容	材料搬入
備考	6L×5缶 プライマー＝2缶 搬入



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗布
備考	



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	へら押え(仕上げ)
備考	



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	へら押え(仕上げ)
備考	完了




年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	へら押え(仕上げ)
備考	完了



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインデクロ 色: 赤さび色
工事内容	材料搬入 16 ^{キロ} ×2缶
備考	1液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料




年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	破風
使用材料	ハイポンファインデクロ 色:白さび色
工事内容	材料搬入 16キロ×1缶
備考	1液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料

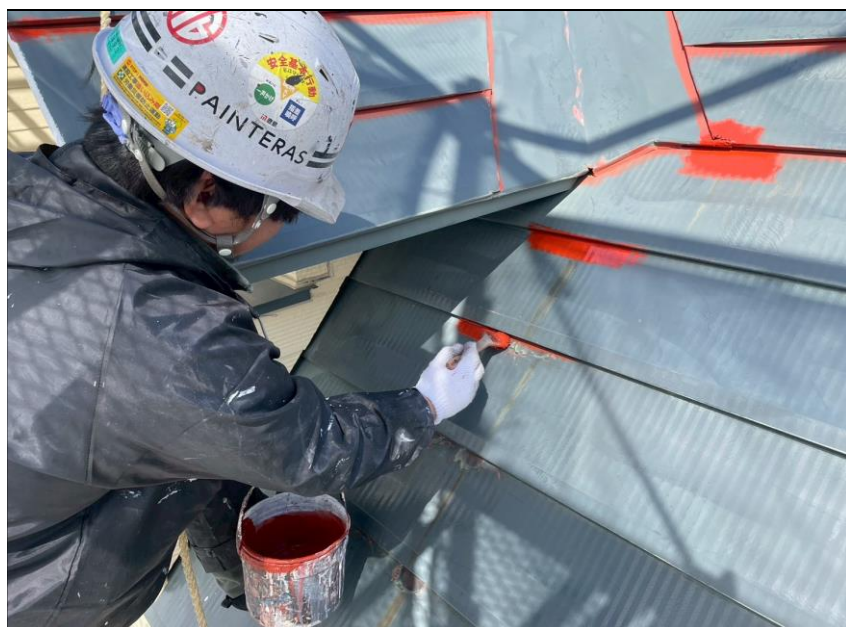


年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	錆箇所、補修塗り (2回塗り)
備考	



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為に施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。

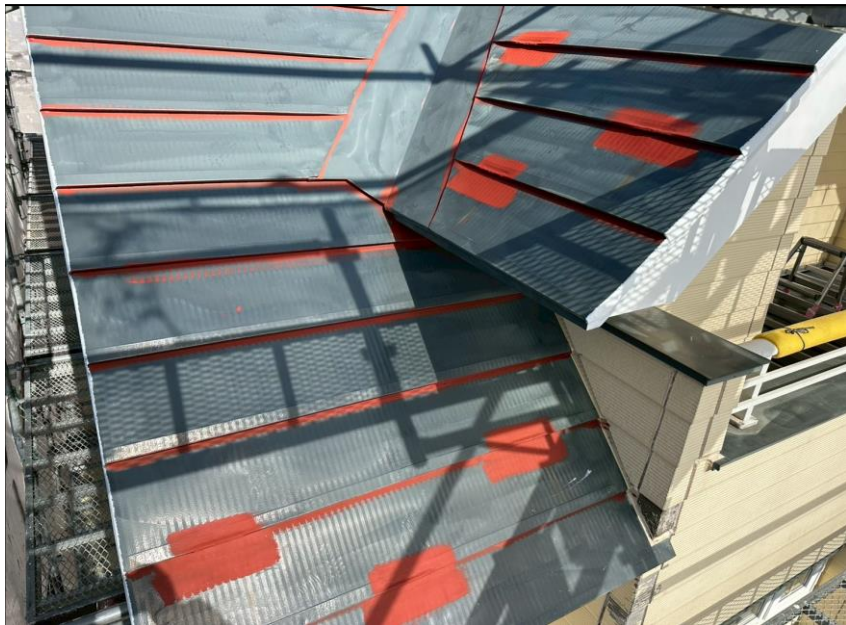

年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	増し塗り完了

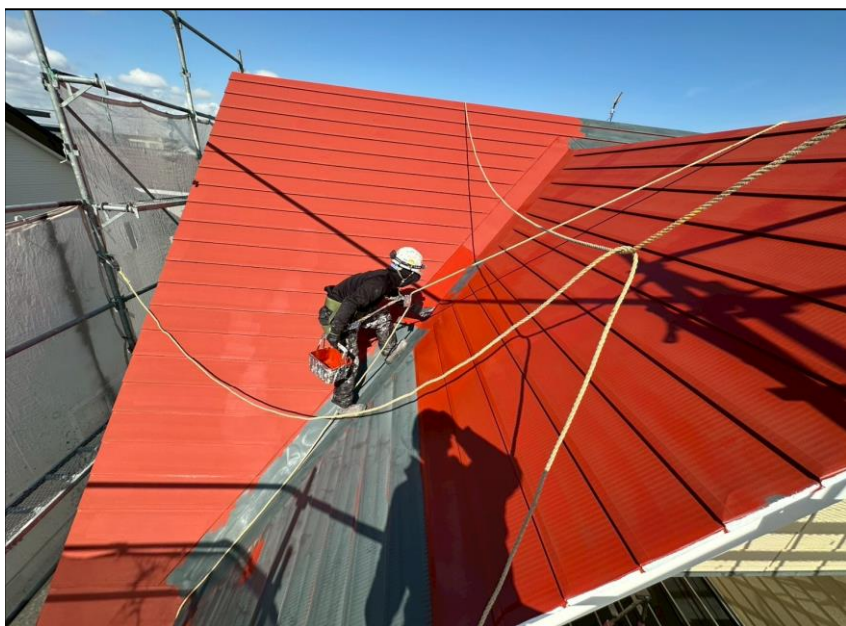

年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	破風
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI 色番:チャコールグレー
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×2セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂ト タン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用に より、優れた耐候性及び耐 久性を発揮します。




年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目先行塗り (中塗り)
備考	サビ止め作業同様、1番錆 びる箇所「板金面の折り返し 溝」のももしっかりと中塗り塗 料を塗りこみました。



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	破風
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番:N-90
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×1セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD型 シリコン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現 し、耐候性1種に相当する性 能を持つ塗料

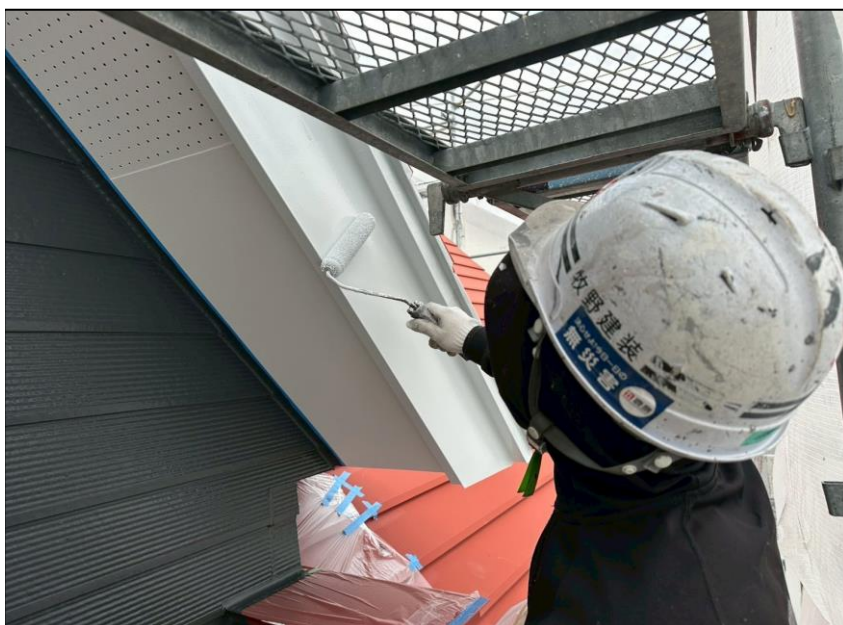

年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	破風
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	完了



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	中塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと上塗り塗料を塗りこみ



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	




年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	




年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	インパクトドライバー
工事内容	雪止め 6個取付け
備考	完了



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了

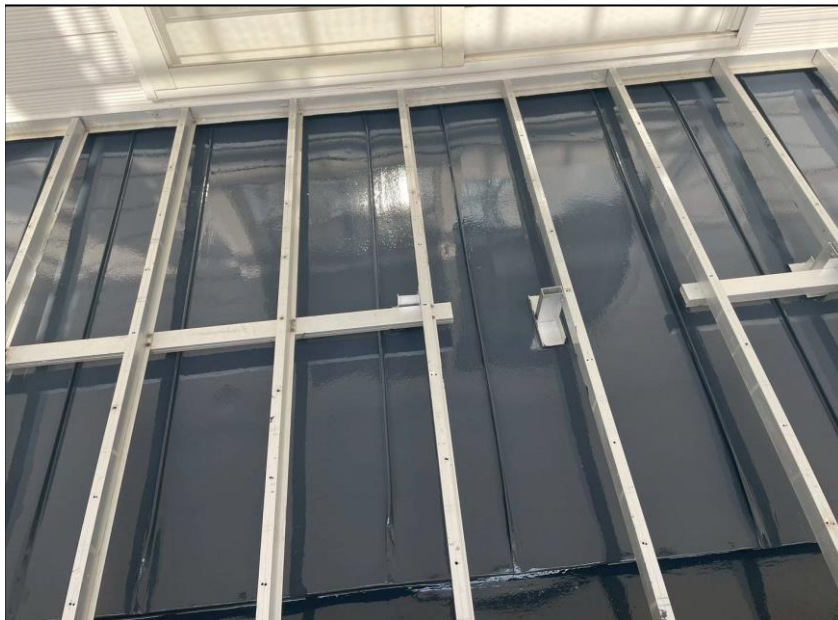

年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	バルコニー屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了

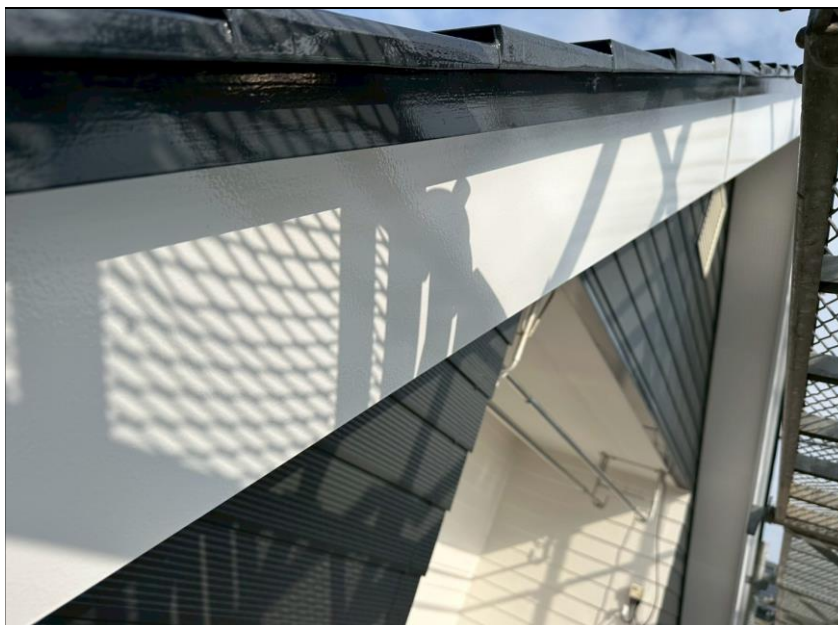

年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	材料搬入 15 ^{kg} × 1缶
備考	サイディング表面の劣化を調整し、上塗りの滑らかさを際立たせ、光沢のある美しい仕上げを提供します。また、特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮する下塗り塗料。



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	補修塗り
備考	厚膜形の外壁下塗り材を塗膜の剥がれていた箇所に塗ることで外壁材を保護する効果が生れます。




年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	セメンシヤス2000番
工事内容	材料搬入 20 ^{kg} × 1缶
備考	各種下地に対する接着力に優れたポリマーセメント系の下地調整材(樹脂モルタル)です。




年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	セメンシヤス2000番
工事内容	補修
備考	完了



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	水性ミラクシーラーエコ
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×2缶
備考	各種旧塗膜や、各種水性仕上塗材と強固に付着するため、幅広く適応でき、優れた耐水性、耐アルカリ性を示し、下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮する下塗り塗料

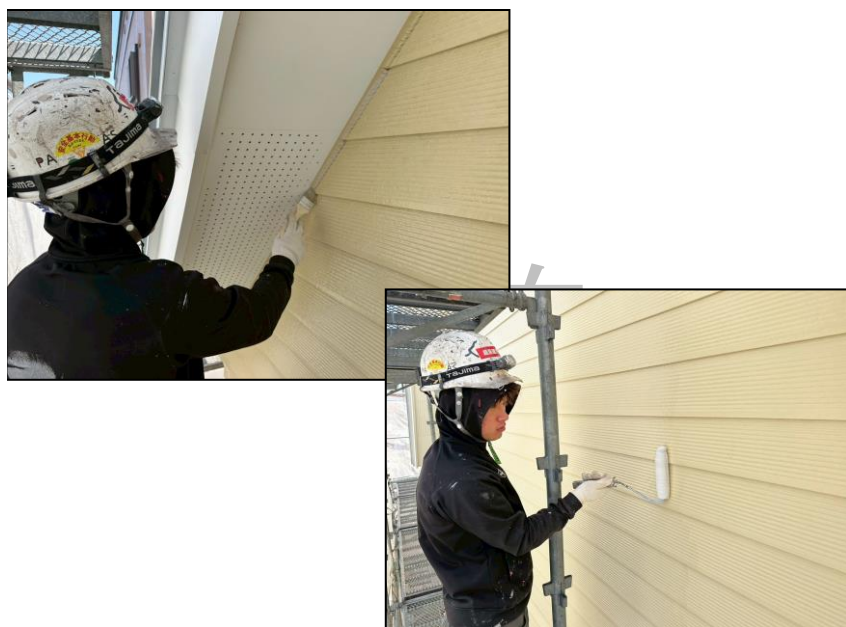

年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	水性ミラクシーラーエコ
工事内容	下塗り
備考	

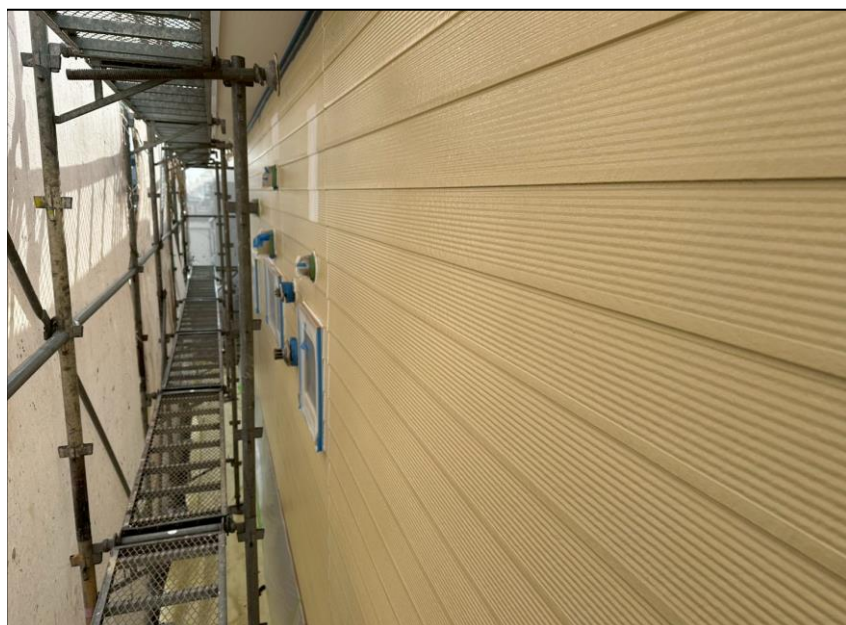


年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	水性ミラクシーラーエコ
工事内容	下塗り
備考	完了



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料搬入 15 ^キ × 1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	

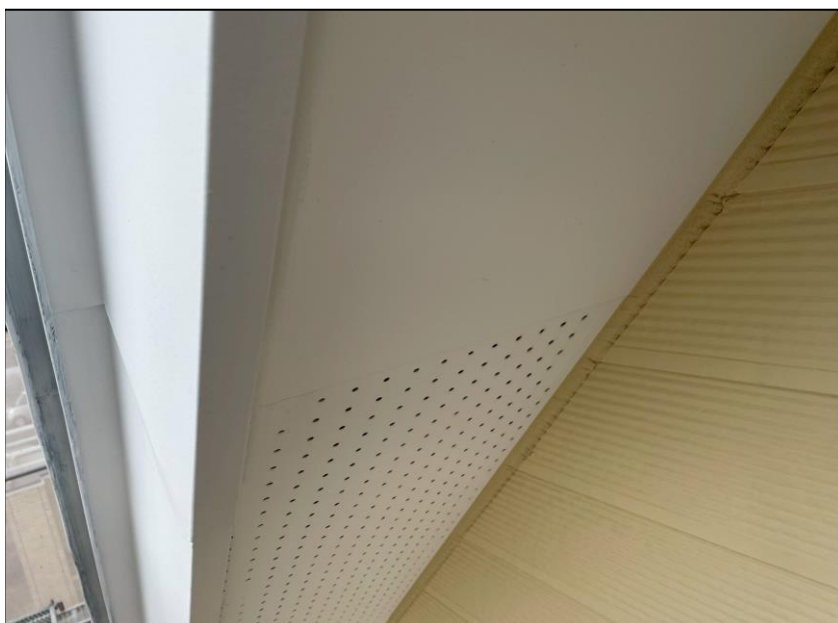

年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番: N-30 (半艶)
工事内容	材料搬入 15 ^キ × 3セット
備考	超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 超耐久性、超耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。さらに、汚れにくい塗膜構造となっている塗料



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番: 19-90A (艶あり)
工事内容	材料搬入 15 ^キ × 1セット
備考	同上




年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番: N-30 (半艶)
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番:19-90A(艶あり)
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番:N-30(半艶)
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	

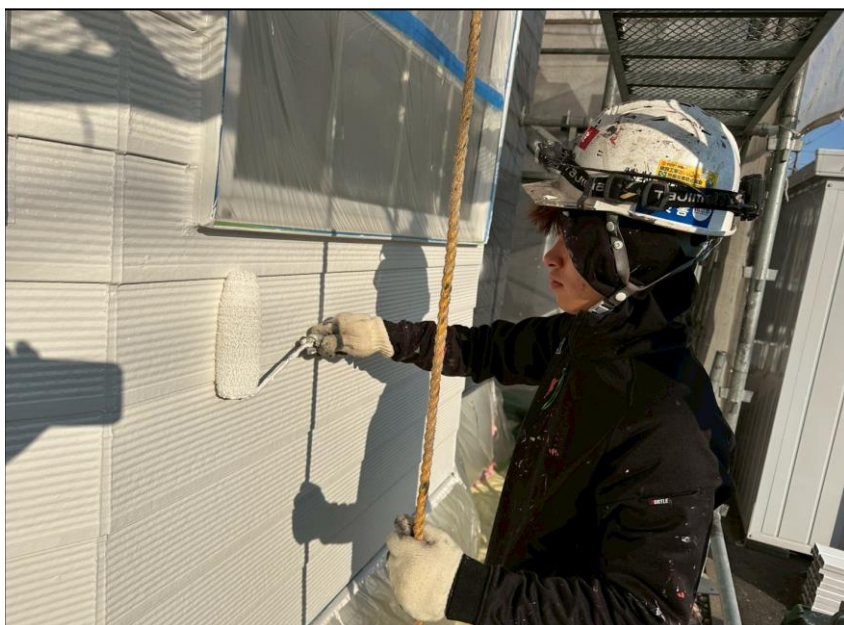


年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番:19-90A(艶あり)
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番:N-30(半艶)
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番:N-30(半艶)
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	コーキング上塗りカ所

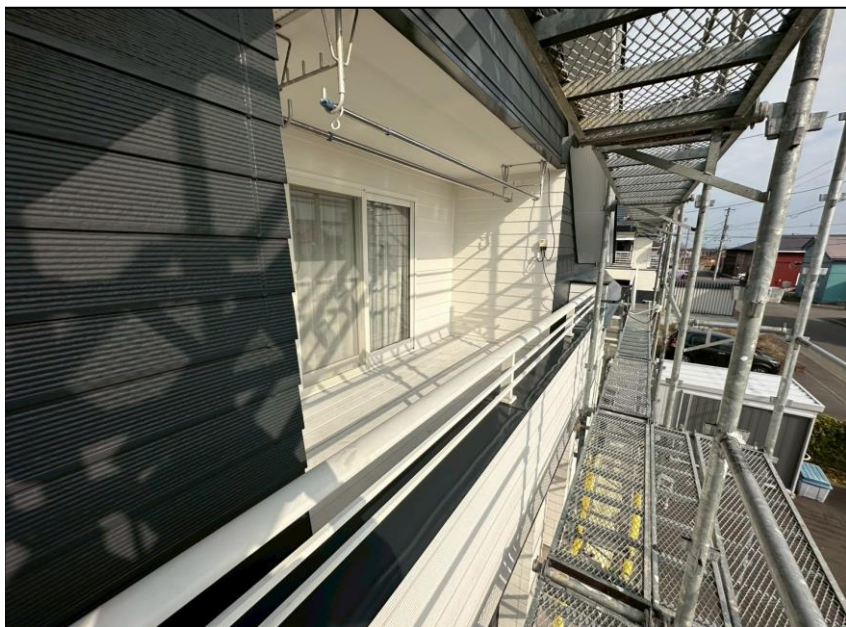

年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番:19-90A(艶あり)
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁換気フード
使用材料	
工事内容	破損力所 交換前
備考	



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	外壁換気フード
使用材料	
工事内容	破損力所 交換後
備考	塗装するため換気フードの 表面は、目荒しをし、プライ マーが塗ってあります。



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	ホームタンク
使用材料	1液ハイポンファインデクロ
工事内容	錆箇所、錆止め塗り
備考	完了



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	水切り
使用材料	
工事内容	破損力所交換
備考	水切りコーナー破損力所交換



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースGⅡ
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースGⅡ
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースGⅡ
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	電気線取付金具
使用材料	
工事内容	交換
備考	取付位置をずらして取付 古い取付穴はコーキングに て埋めました。



年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー
工事内容	清掃
備考	

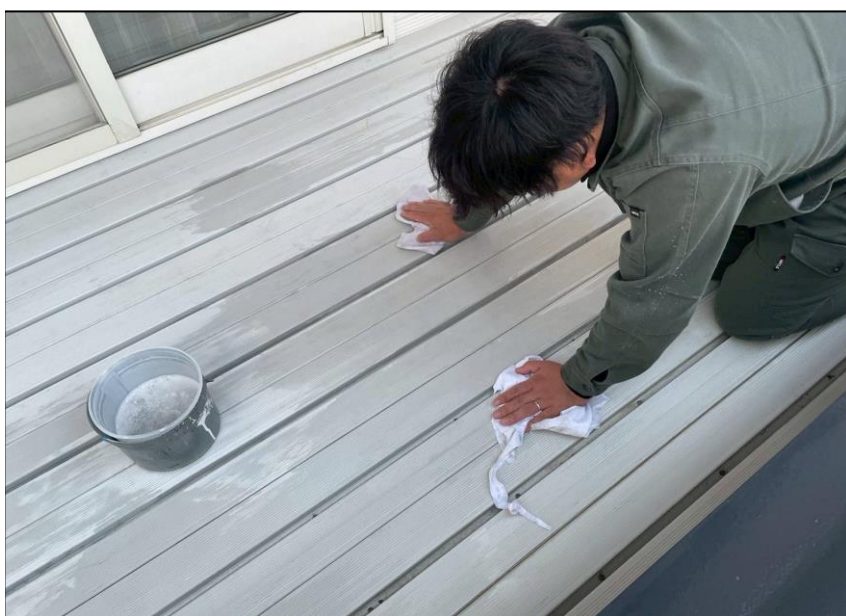

年月日	2025. 3. 30～4. 17
工事部位	スノコ
使用材料	中性洗剤
工事内容	清掃
備考	



年月日	2025. 3. 30~4. 17
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事完了
備考	




年月日	2025. 3. 30~4. 17
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事完了
備考	




年月日	2025. 3. 30~4. 17
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事完了
備考	PAINTERAS (株)牧野建装



Before



After-

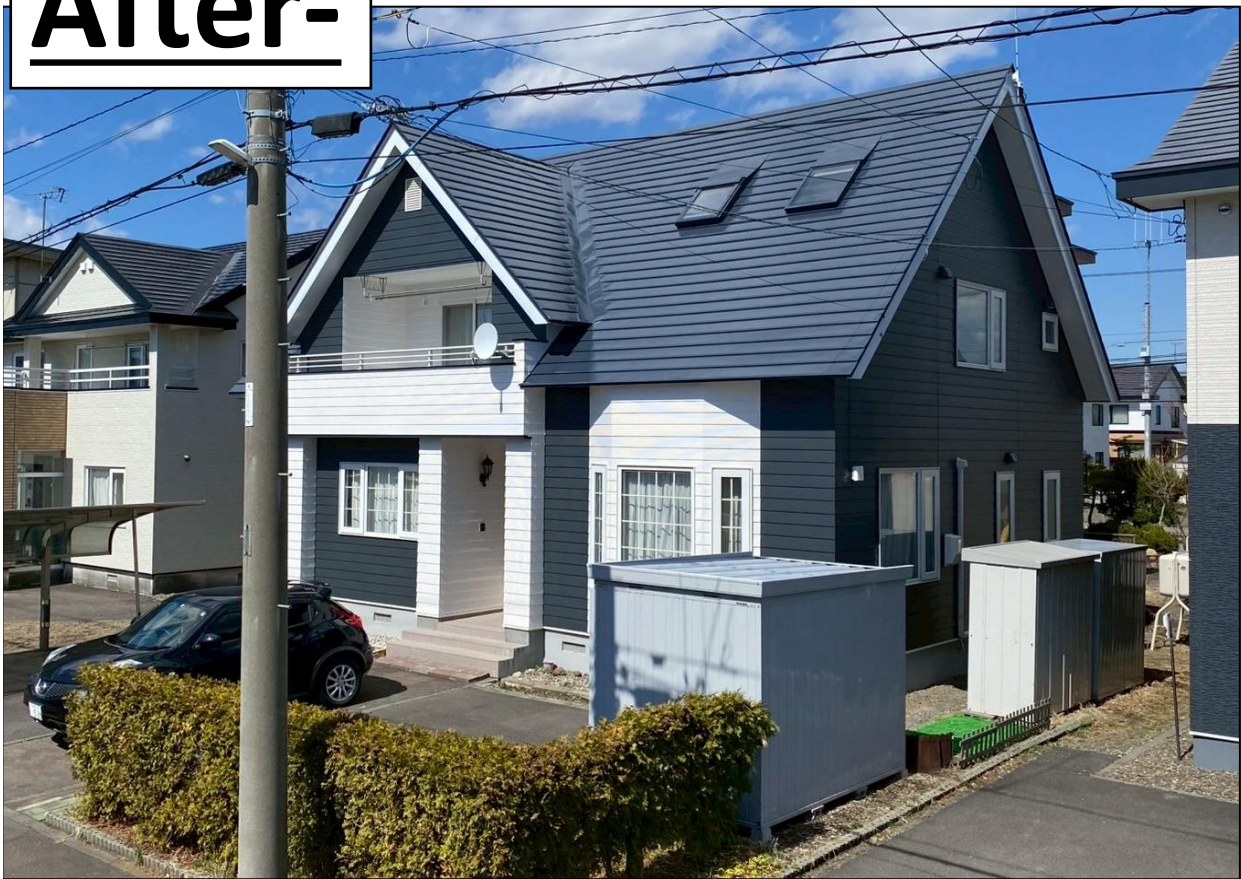

PAINTERAS
株式会社牧野建装
