



年月日	2023. 8. 18
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2023. 8. 19
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	仮設足場設置
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	雨どい
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	苔、藻、ヘドロなどの汚れを洗浄



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	2F外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を洗浄。



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	窓
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの汚れを洗浄



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	バルコニー床
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	汚れを洗浄



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	1F外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を洗浄。



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	物置
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を洗浄。



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	玄関ドア
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	雨どい
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	施工前



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	雨どい
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	施工後



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	幕板(帯)
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施




年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	水切り
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	物置(屋根)
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	物置(外壁)
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施

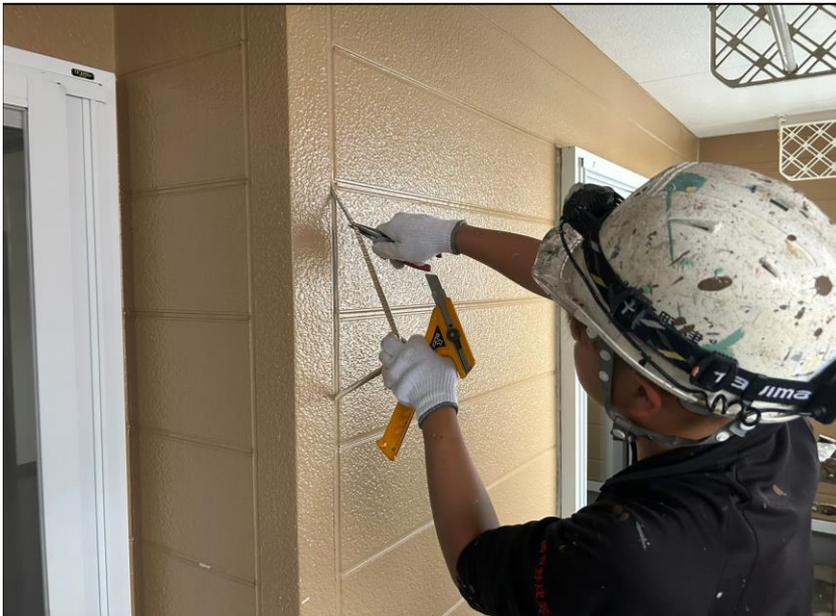

年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去中
備考	




年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去後
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	外壁
使用材料	2液形ウレタン樹脂コーキング
工事内容	材料搬入
備考	6L×4缶 プライマー=2缶 搬入



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	外壁
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗り
備考	

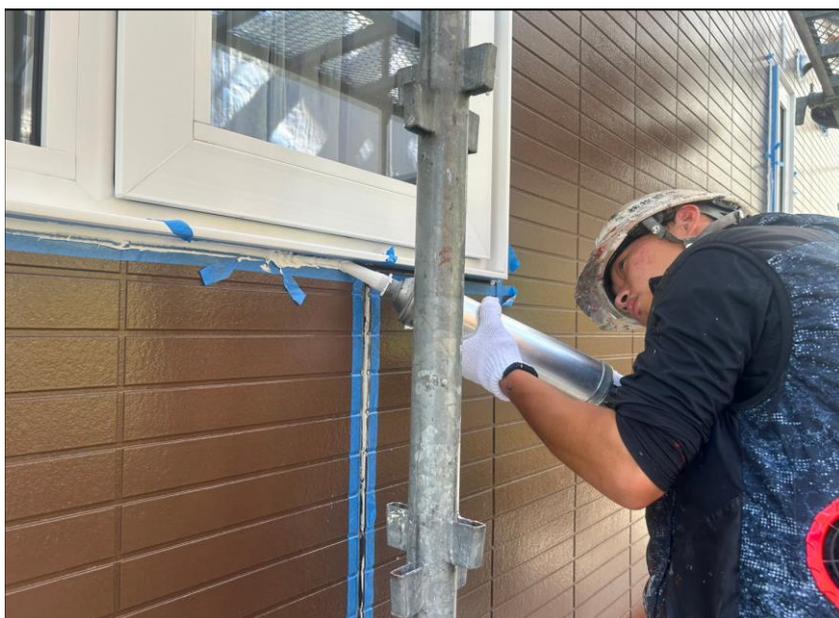

年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	




年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	2F外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了




年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	1F外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了




年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	幕板、水切り、物置
使用材料	ハイボンファインデクロ 色: 赤さび色
工事内容	材料搬入 16キロ×1セット
備考	1液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料

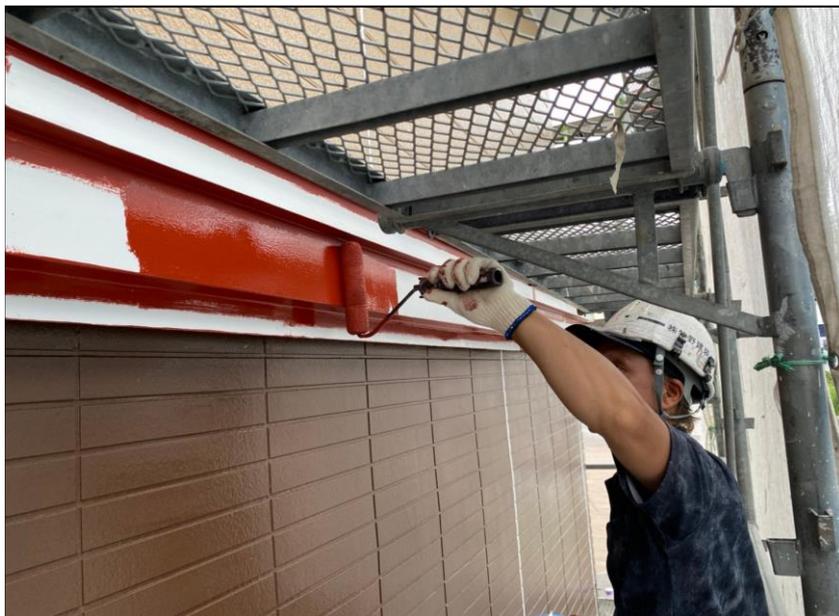


年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	幕板(帯)
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	

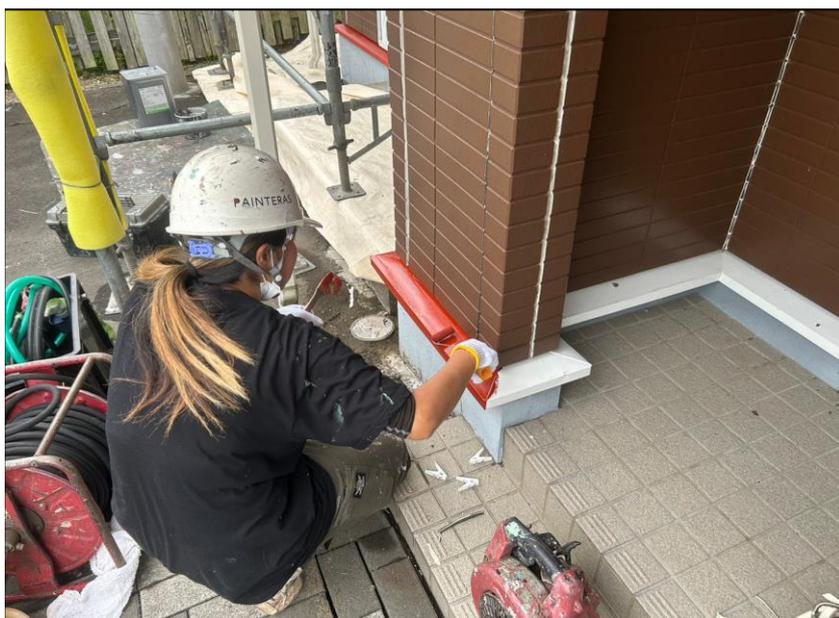

年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	水切り
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	

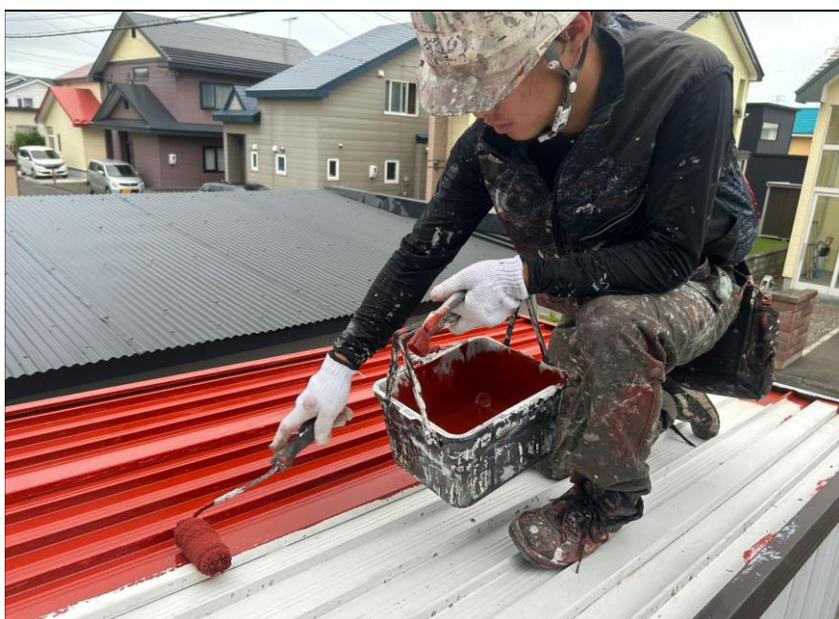

年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	物置
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	

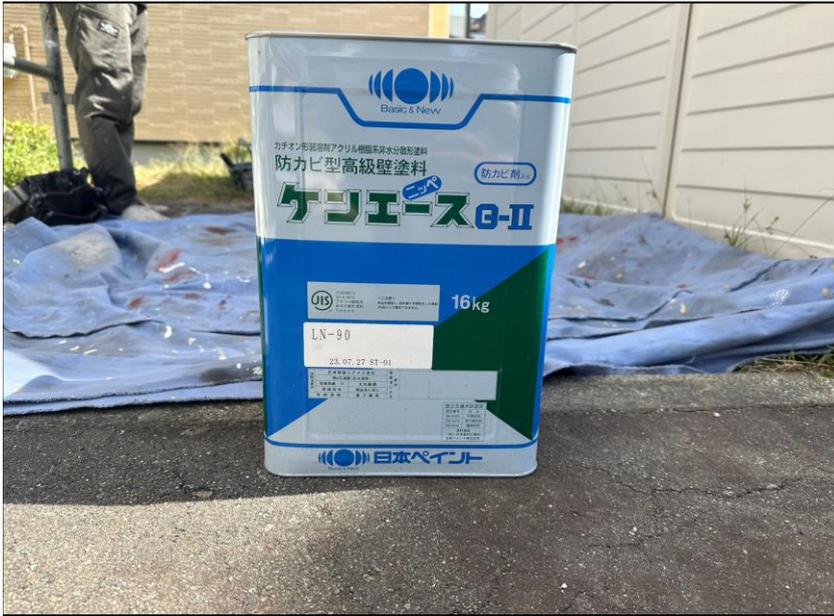

年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	外壁
使用材料	マイルドシーラーES
工事内容	材料搬入 16 ^キ □×1缶
備考	特殊エポキシ樹脂 浸透、固着性が高く、下地の補強効果に優れている。旧塗膜との密着性が抜群に良い

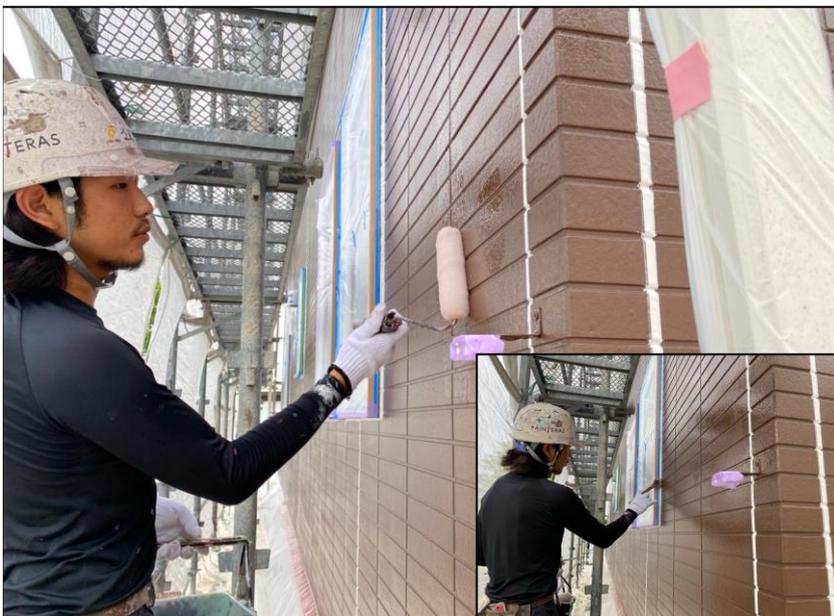

年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	外壁
使用材料	マイルドシーラーES
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドフッ素 色番:15-30F
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×3セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD型 フッ素樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現 し、耐候性1種に相当する性 能を持つ塗料

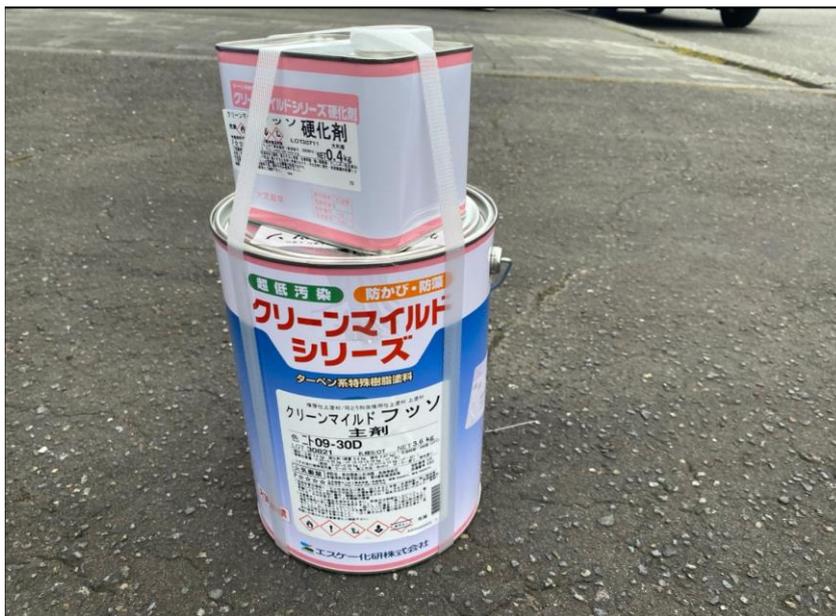

年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドフッ素 色番:09-30D
工事内容	材料搬入 4 ^キ ×1セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD型 フッ素樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現 し、耐候性1種に相当する性 能を持つ塗料



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	2F外壁
使用材料	クリーンマイルドフッ素
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	1F外壁
使用材料	クリーンマイルドフッ素
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	




年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	幕板(帯)
使用材料	クリーンマイルドフッ素
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	水切り
使用材料	クリーンマイルドフッ素
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	外壁
使用材料	ボンドコーク
工事内容	補修
備考	外壁の隙間を埋めました

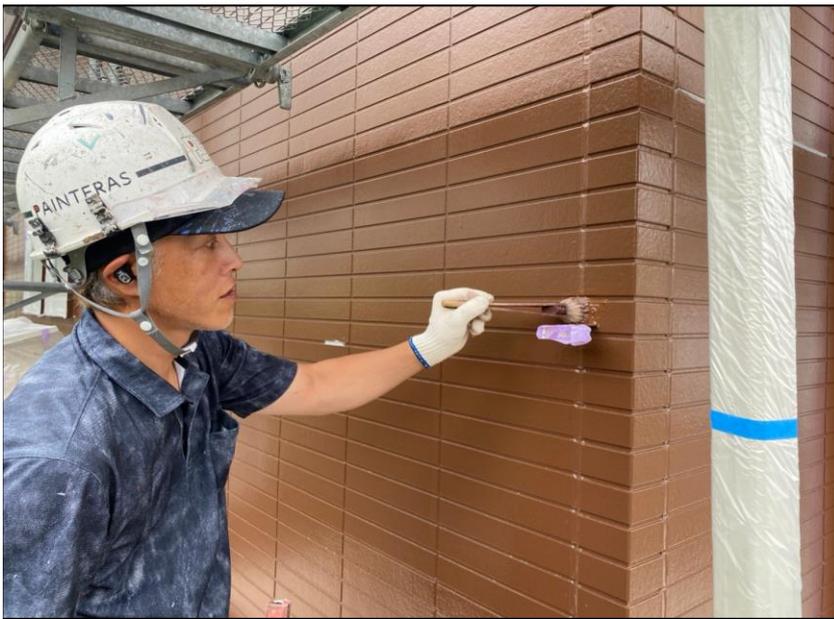

年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	1F外壁
使用材料	クリーンマイルドフッ素
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	




年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	1F外壁
使用材料	クリーンマイルドフッ素
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	幕板(帯)
使用材料	クリーンマイルドフッ素
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	




年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	水切り
使用材料	クリーンマイルドフッ素
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	

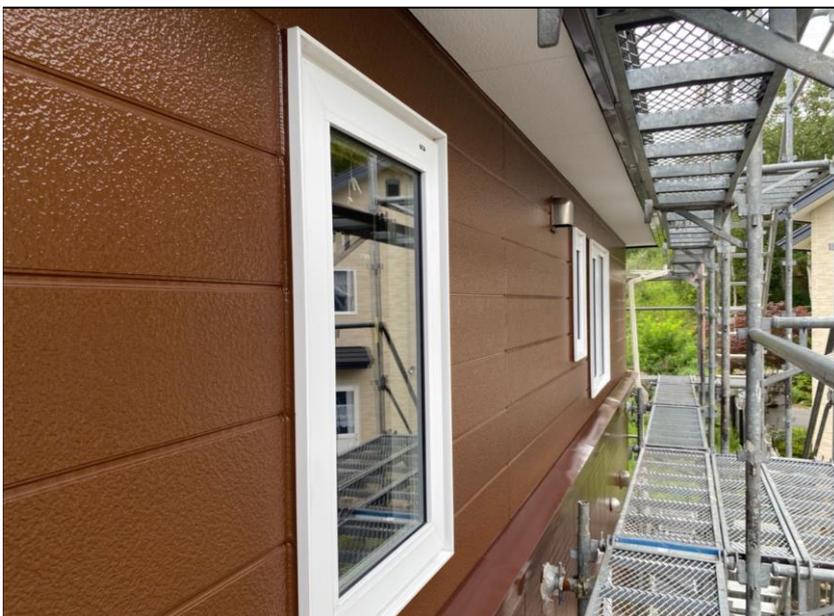


年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	2F外壁
使用材料	クリーンマイルドフッ素
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	幕板(帯)
使用材料	クリーンマイルドフッ素
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了

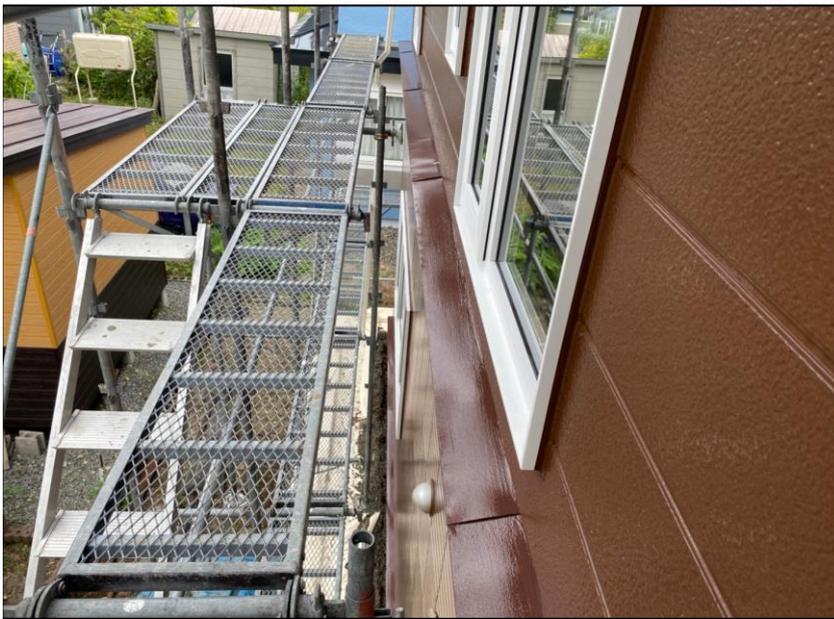

年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	幕板(帯)
使用材料	クリーンマイルドフッ素
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了

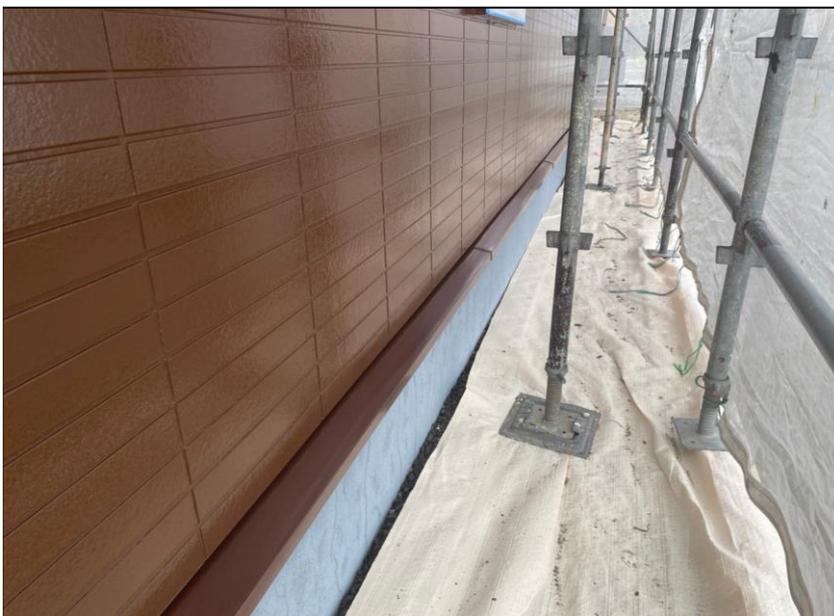

年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	1F外壁、水切り
使用材料	クリーンマイルドフッ素
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	基礎
使用材料	アンダーフィラエクスセル
工事内容	材料搬入 16キロ×1セット
備考	水性厚膜型下塗り材



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	基礎
使用材料	アンダーフィラエクスセル
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	基礎
使用材料	アンダーフィラエクスセル
工事内容	下塗り
備考	完了



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	基礎
使用材料	シリコン浸透ガード
工事内容	材料搬入 16 ^キ □×1セット
備考	コンクリート用塗料




年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	基礎
使用材料	シリコン浸透ガード
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	基礎
使用材料	シリコン浸透ガード
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	玄関ドア
使用材料	サンドペーパー
工事内容	下地処理
備考	

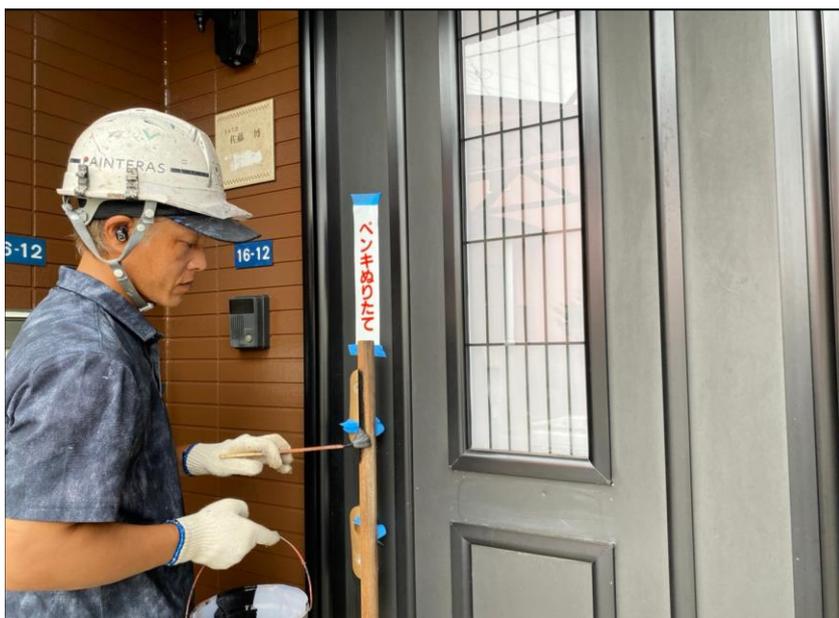

年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	玄関ドア
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	

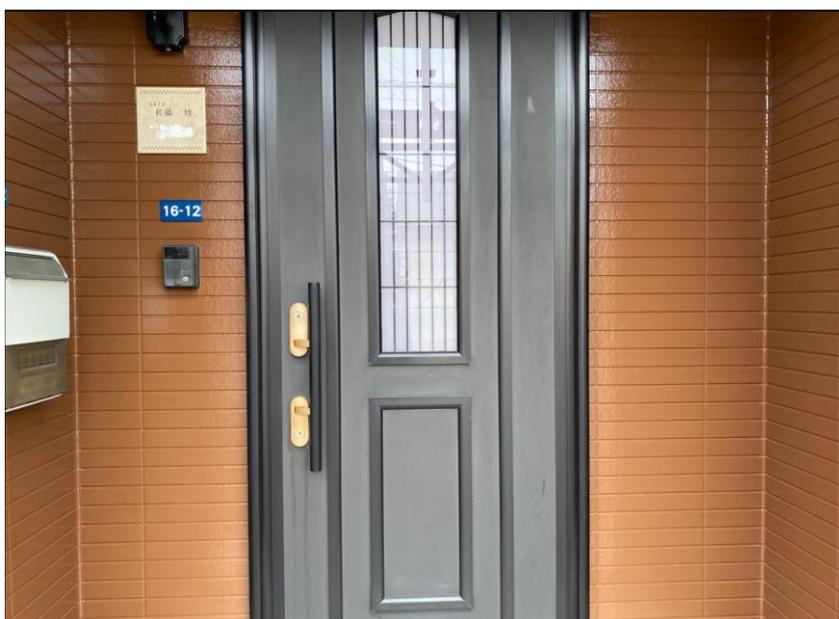

年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	玄関ドア
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	屋根
使用材料	トタン
工事内容	屋根葺き替え
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	屋根
使用材料	トタン
工事内容	屋根葺き替え
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	屋根
使用材料	トタン
工事内容	屋根葺き替え
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	屋根
使用材料	トタン
工事内容	屋根葺き替え
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	破風
使用材料	トタン
工事内容	屋根葺き替え
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	破風
使用材料	トタン
工事内容	屋根葺き替え
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー
工事内容	清掃
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー
工事内容	清掃
備考	



年月日	2023. 8. 18~8. 30
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー
工事内容	清掃
備考	



年月日	2023. 8. 30
工事部位	戸建て住宅
使用材料	
工事内容	工事完了
備考	



年月日	2023. 8. 30
工事部位	戸建て住宅
使用材料	
工事内容	工事完了
備考	



年月日	2023. 8. 30
工事部位	戸建て住宅
使用材料	
工事内容	工事完了
備考	



Before



After-



PAINTERAS

株式会社牧野建装
