



年月日	2022. 9. 25
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2022. 9. 25~10. 12
工事部位	全体
使用材料	枠組み足場
工事内容	仮設足場組立
備考	完了



年月日	2022. 9. 25~10. 12
工事部位	屋根
使用材料	マジックロン(研磨材)
工事内容	下地調整(ケレン)
備考	



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	屋根
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整(ケレン)
備考	錆が酷かったので、機械工具によるケレンの実施



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	破風
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整(ケレン)
備考	



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	シャッター
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整(ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	土間
使用材料	電動ペーパーサンダー#16
工事内容	下地調整(ケレン)
備考	浮いている塗膜を機械工具により除去しました。



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	高圧水をあて、ホコリや潮、汚れや黄砂などを除去



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	高圧水を外壁面にあて、ホコリや潮、汚れなどを除去



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	シャッター
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ケレンカスを洗浄



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	シャッター
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ケレンカスを洗浄



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	玄関ドア
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	コリや泥などの汚れなどを洗浄



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	屋根、破風
使用材料	ハイボン20デクロ 色:ブラウン
工事内容	材料搬入 20 <sup>キロ</sup> ×2セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	屋根
使用材料	ハイボン20デクロ
工事内容	錆止め塗装 (下塗り)
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりと錆止め塗料を塗りこみます。この作業は時間がかかる為に施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。




年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	屋根
使用材料	ハイボン20デクロ
工事内容	錆止め塗装 (下塗り)
備考	先行塗完了



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了

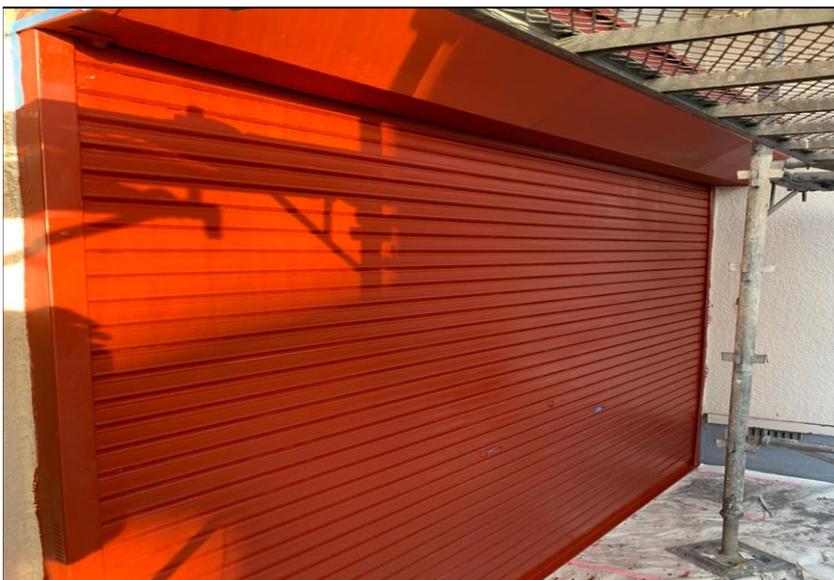

年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	シャッター
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	屋根、破風
使用材料	ファインルーフSI 色番:エンペラーブルー
工事内容	材料搬入 15キロ×2セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂トタン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用により、優れた耐候性及び耐久性を発揮します。



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	下塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中もしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。」



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2022. 9. 25~10. 12
工事部位	屋根
使用材料	
工事内容	
備考	穴あき箇所



年月日	2022. 9. 25~10. 12
工事部位	屋根
使用材料	FRP、コーキング
工事内容	補修
備考	FRPとコーキングで補修



年月日	2022. 9. 25~10. 12
工事部位	屋根
使用材料	FRP、コーキング
工事内容	補修
備考	完了



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	東面2階外壁
使用材料	
工事内容	
備考	欠損状況



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	東面2階外壁
使用材料	
工事内容	
備考	こぶし大の穴が開いている状態でした。




年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	東面2階外壁
使用材料	
工事内容	外壁交換
備考	穴が大きく補修できない状態でしたので、建材を張り替えました。



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	西面2階外壁
使用材料	
工事内容	外壁交換
備考	赤く囲んだ外壁も腐って穴が開いていましたので交換しました。



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	東面2階外壁
使用材料	
工事内容	外壁交換
備考	赤く囲んだ外壁も腐って穴が開いていましたので交換しました。

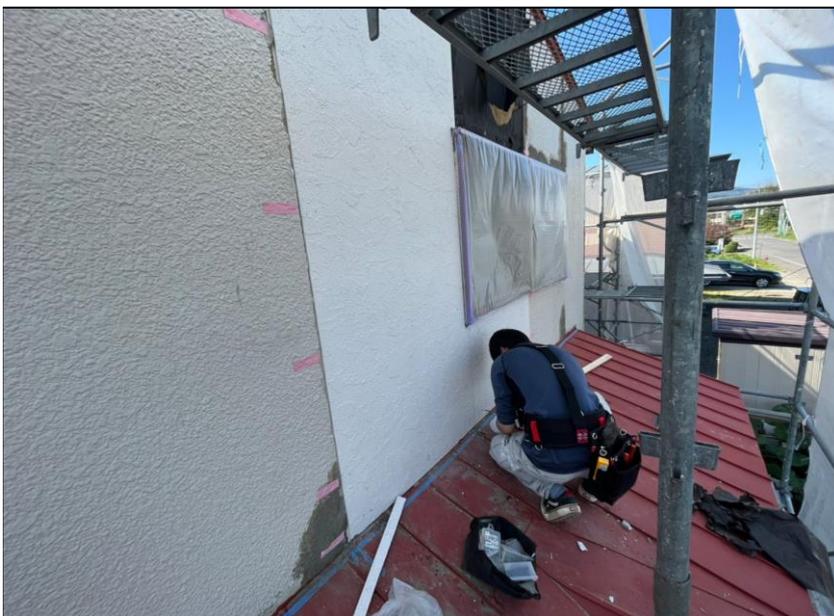

年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	東面2階外壁
使用材料	
工事内容	外壁交換
備考	外壁貼替中



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	外壁
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	錆止めタッチアップ
備考	コーキングの打ち替え



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	外壁
使用材料	樹脂モルタル
工事内容	外壁補修
備考	完了



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	外壁
使用材料	樹脂モルタル
工事内容	外壁補修
備考	完了



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	外壁
使用材料	アンダーフィラーエクセル
工事内容	材料搬入 15 <sup>キ</sup> □×4セット
備考	厚膜型の下塗り塗料 微弾性でクラックに追従し、 伸びる下塗り塗料であり防 水性のある外壁塗料です



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	外壁
使用材料	アンダーフィラーエクセル
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	外壁
使用材料	アンダーフィラーエクセル
工事内容	下塗り
備考	完了



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料搬入 15 <sup>キ</sup> □×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	外壁
使用材料	レナラック
工事内容	材料搬入 20 <sup>キ</sup> × 13缶
備考	模様材塗料



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	外壁
使用材料	レナラック
工事内容	模様材吹き付け
備考	

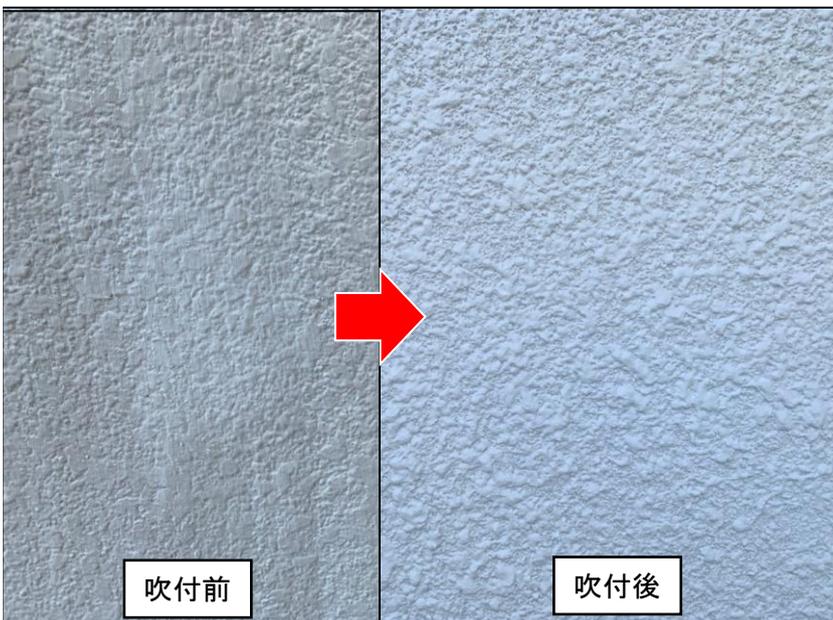


年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	外壁
使用材料	レナラック
工事内容	模様材吹き付け
備考	



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドウレタン 色番:25-90D
工事内容	材料搬入 15 <sup>キ</sup> ×3セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD型 アウレタン樹脂塗料  セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現し、 耐候性1種に相当する性能を持つ塗料



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドウレタン
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	

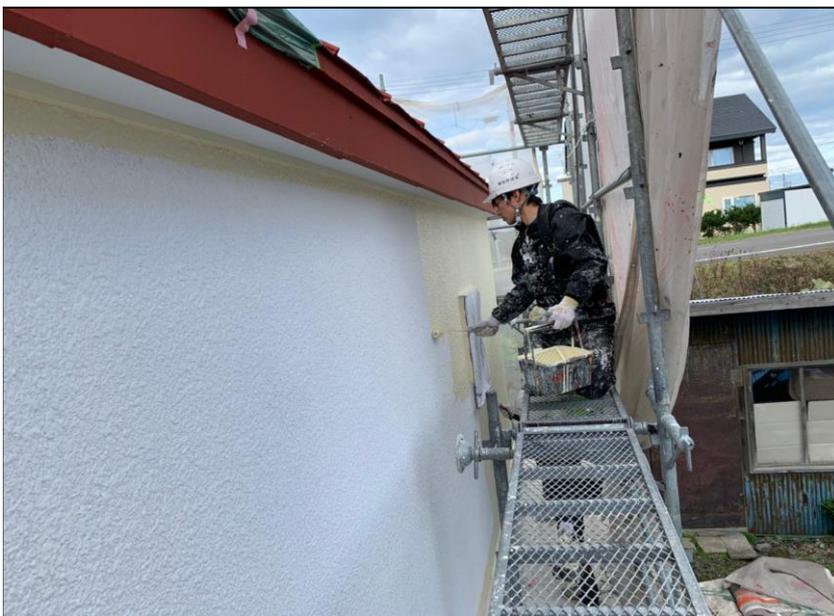


年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドウレタン
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドウレタン
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドウレタン
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	

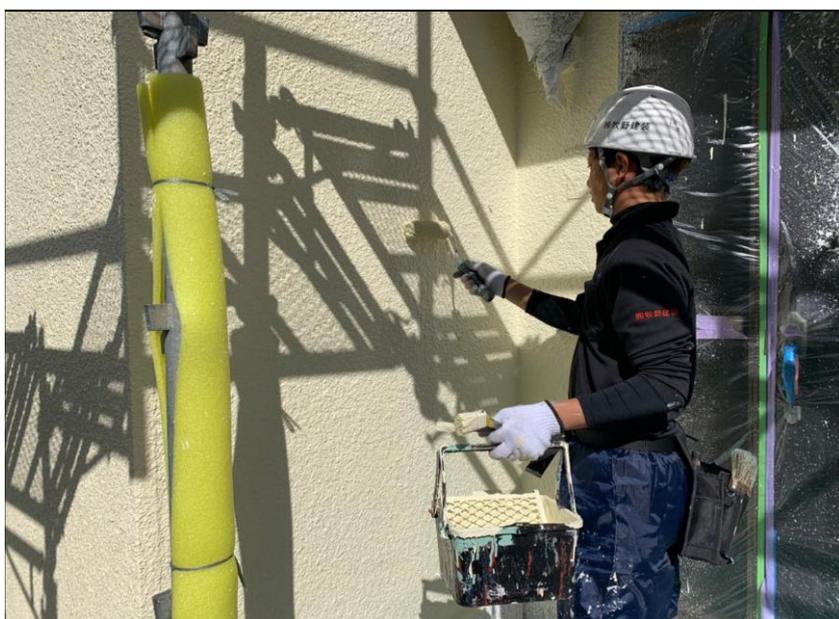


年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドウレタン
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドウレタン
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	基礎、土間
使用材料	1液浸透性シーラー
工事内容	材料搬入 15 <sup>kg</sup> × 1缶
備考	下塗り塗料

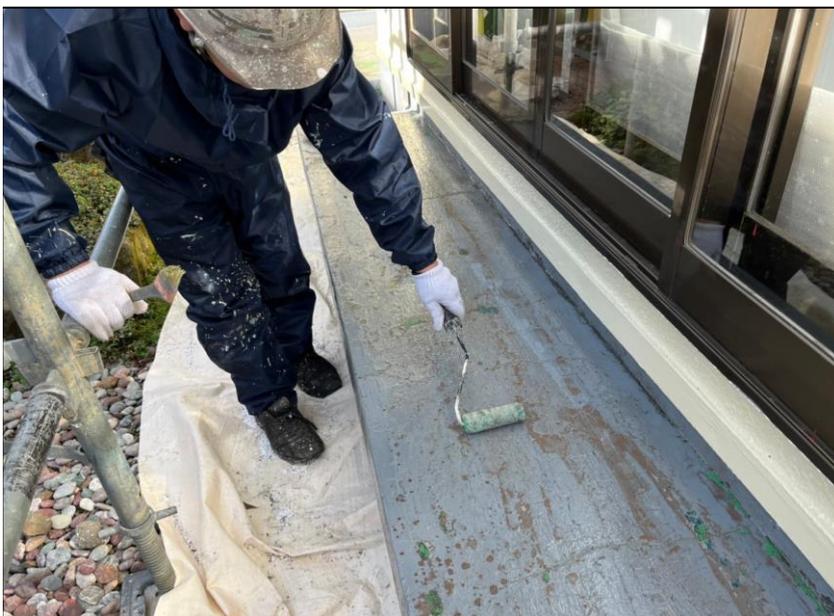

年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	基礎、土間
使用材料	1液浸透性シーラー
工事内容	下塗り
備考	取付け完了



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	基礎、土間
使用材料	クリンカラーAベスト
工事内容	材料搬入 16 <sup>キ</sup> ×1缶
備考	1液形アクリル樹脂で取り扱いやすく、速乾性で屋外にも適用できるタイプ。 つや有りタイプとつや消しタイプがあり、一般工場から倉庫、事務所、店舗などに適用でき、密着性に優れています。



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	基礎、土間
使用材料	クリンカラーAベスト
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	基礎、土間
使用材料	クリンカラーAベスト
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2022. 9. 25~10. 12
工事部位	屋根
使用材料	雪止め
工事内容	材料搬入 11個
備考	



年月日	2022. 9. 25~10. 12
工事部位	屋根
使用材料	雪止め
工事内容	取付け
備考	



年月日	2022. 9. 25~10. 12
工事部位	屋根
使用材料	雪止め
工事内容	取付け
備考	完了



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	塗装
備考	完了



年月日	2022. 9. 25～10. 12
工事部位	シャッター
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	塗装
備考	完了

年月日	
工事部位	
使用材料	
工事内容	
備考	

余白



年月日	2022. 10. 12
工事部位	戸建て住宅
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了




年月日	2022. 10. 12
工事部位	戸建て住宅
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2022. 10. 12
工事部位	戸建て住宅
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	(株)牧野建装 PAINTERAS



**Before**



**After-**



**PAINTERAS**  
牧野建装

