



年月日	2023. 3. 22
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	




年月日	2023. 3. 27
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	仮設足場設置
備考	



年月日	2023. 3. 27~4. 10
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	
工事内容	下地処理
備考	雪止め撤去後

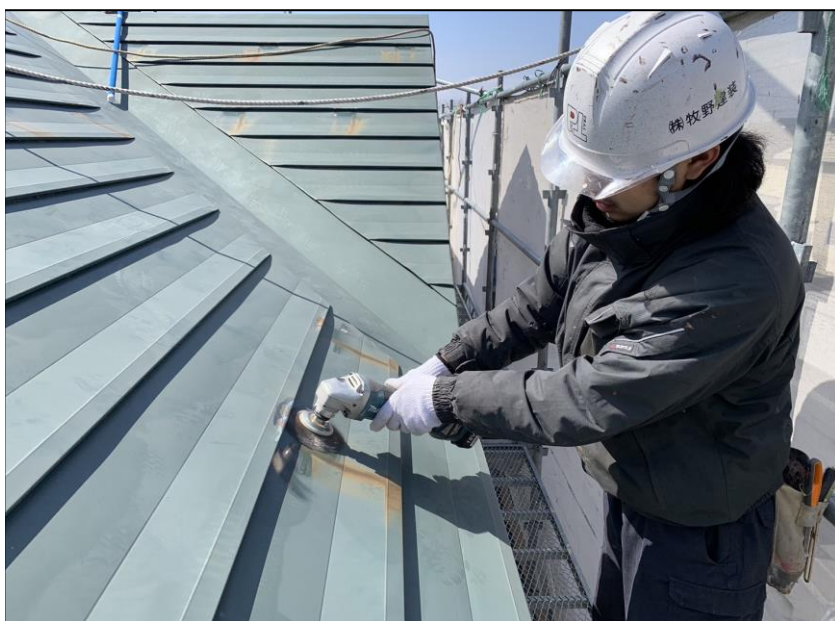

年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆びていた箇所については、機械工具でケレンの実施




年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	ケレン後



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	破風
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施




年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄。

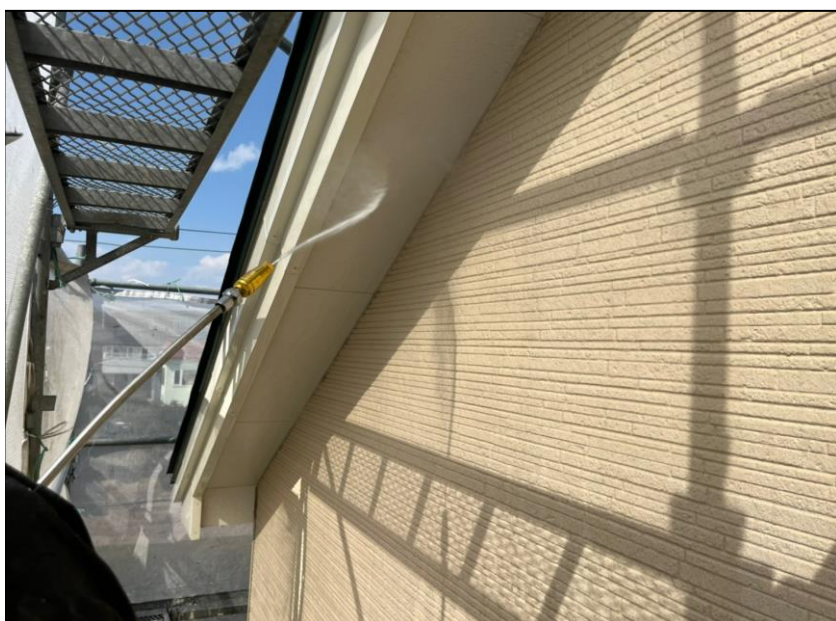


年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	軒天
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリなどの不純物を洗浄。



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を洗浄。

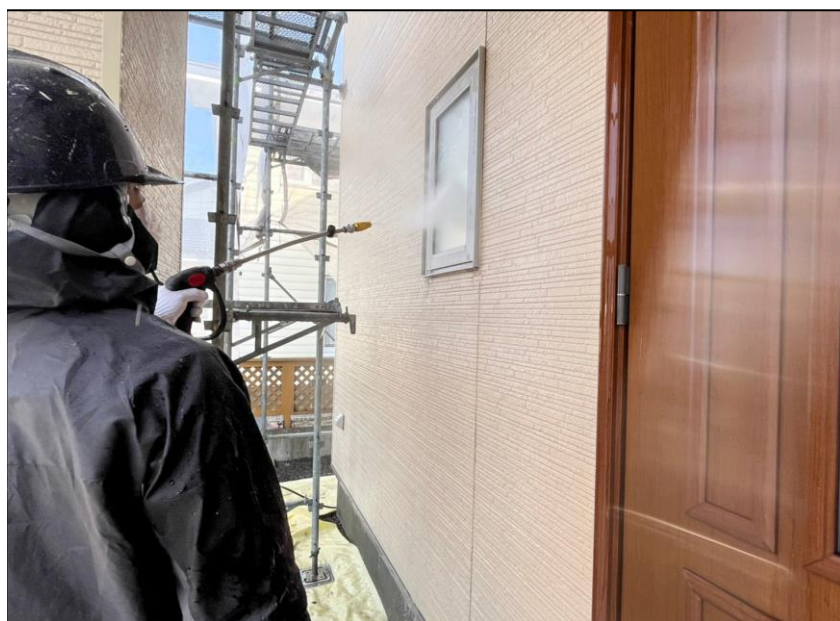

年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	窓
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	窓の汚れを洗浄

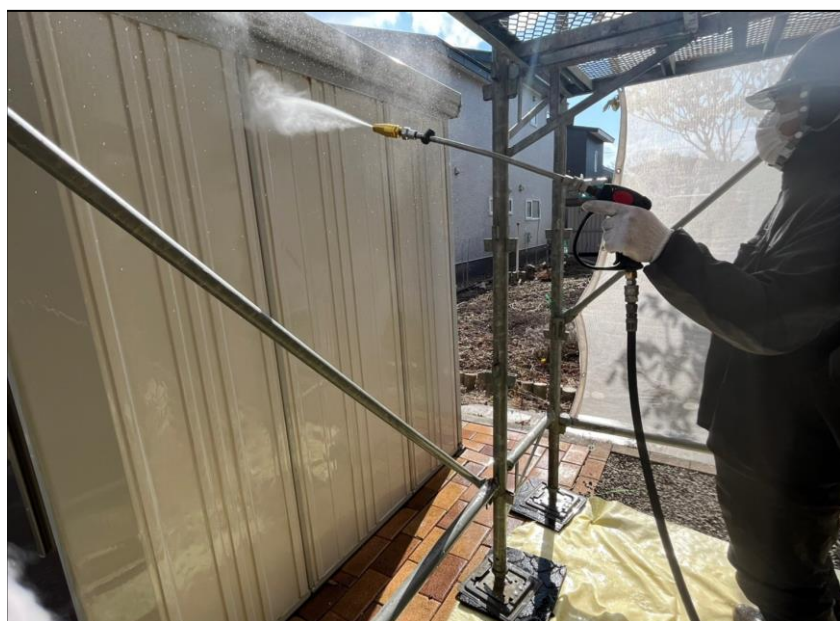

年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	物置
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	苔や藻などを高圧水洗浄にて除去



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去後
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	2液形ウレタン樹脂コーキング
工事内容	材料搬入
備考	6L×4缶 プライマー=2缶 搬入



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗り
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	




年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ハイボン20デクロ 色: ブラウン
工事内容	材料搬入 20 ^{キロ} ×2セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下 塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合す ることにより、高い防錆力、 高い密着力をほこる錆止め 塗料

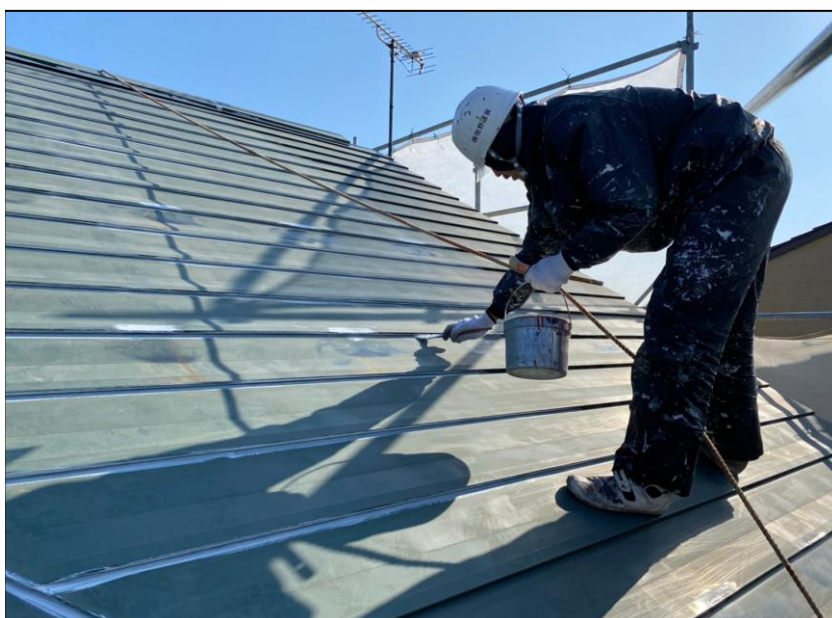

年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ハイボン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り 返し溝の中」もしっかりとサビ止 め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為に 施工を曖昧にしている業者が 多いのが現状ですが、当社で はしっかりと施工しております。



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ハイボン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	破風
使用材料	ハイボン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ハイボン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI 色番: マスカットグリーン
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×2セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂ト タン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用に より、優れた耐候性及び耐 久性を発揮します。



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	サビ止め作業同様、1番錆 びる箇所「板金面の折り返し 溝のもしっかりと中塗り塗 料を塗りこみました。



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	中塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了




年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	雪止め
使用材料	ハイボン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	雪止め
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	

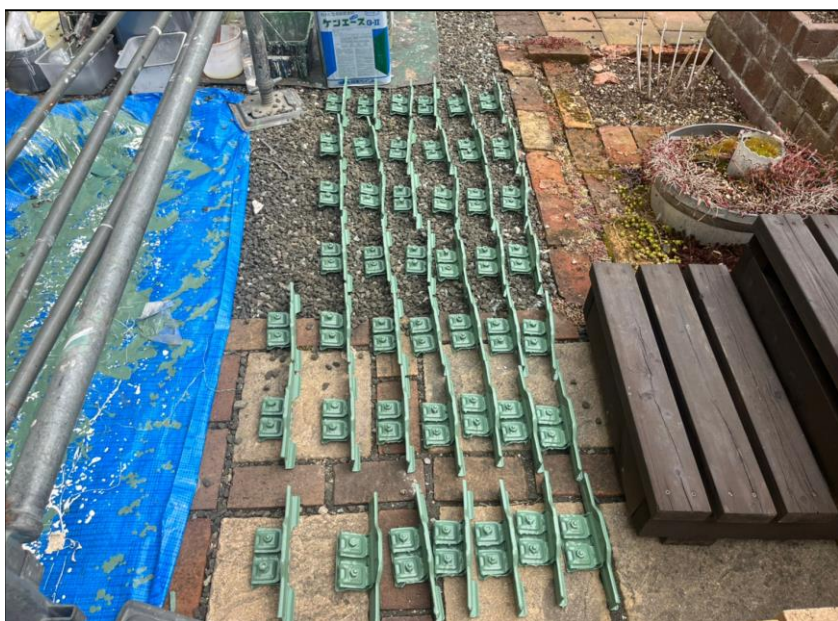

年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	雪止め
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	雪止め
使用材料	インパクトドライバー
工事内容	取付け
備考	完了



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	マイルドシーラーES
工事内容	材料搬入 16 ^{キロ} ×1缶
備考	特殊エポキシ樹脂 浸透、固着性が高く、下地の補強効果に優れている。旧塗膜との密着性が抜群に良い



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	マイルドシーラーES
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	マイルドシーラー-ES
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番:21-70H(3部つや)
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×3セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD 型ポリウレタン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現 し、耐候性1種に相当する性 能を持つ塗料



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	下塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	下塗り (上塗り1回目)
備考	




年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	




年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	

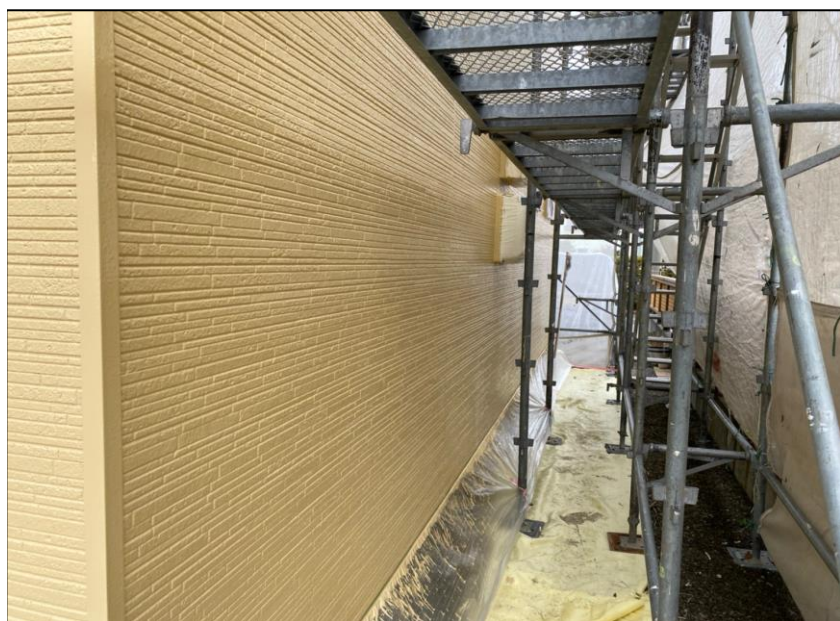


年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了

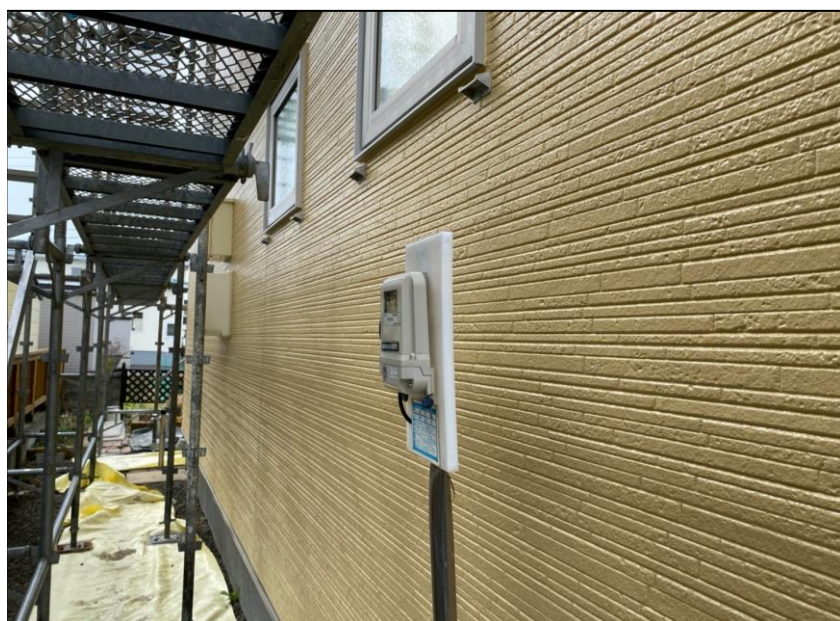

年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	換気口
使用材料	サンドペーパー＃180
工事内容	下地処理
備考	塗装面に細かい傷を付けることにより、塗料の密着を上げ、細かいごみを取り除きます。

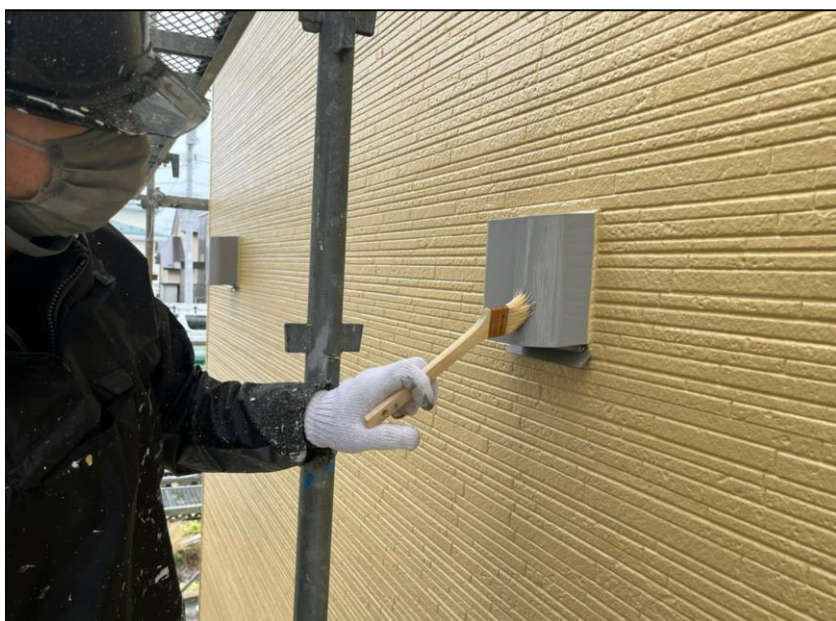

年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	換気口
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	換気口
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	物置
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地処理 (ケレン)
備考	塗装面に細かい傷を付けることにより、塗料の密着を上げ、細かいごみを取り除きます。



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	物置
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	下塗り (補修塗り)
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	物置
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	物置
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	窓
使用材料	硝子クリーナー
工事内容	清掃
備考	



年月日	2023. 3. 27～4. 10
工事部位	窓
使用材料	硝子クリーナー
工事内容	清掃
備考	



年月日	2023. 4. 15
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了




年月日	2023. 4. 15
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了




年月日	2023. 4. 15
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



Before



After-

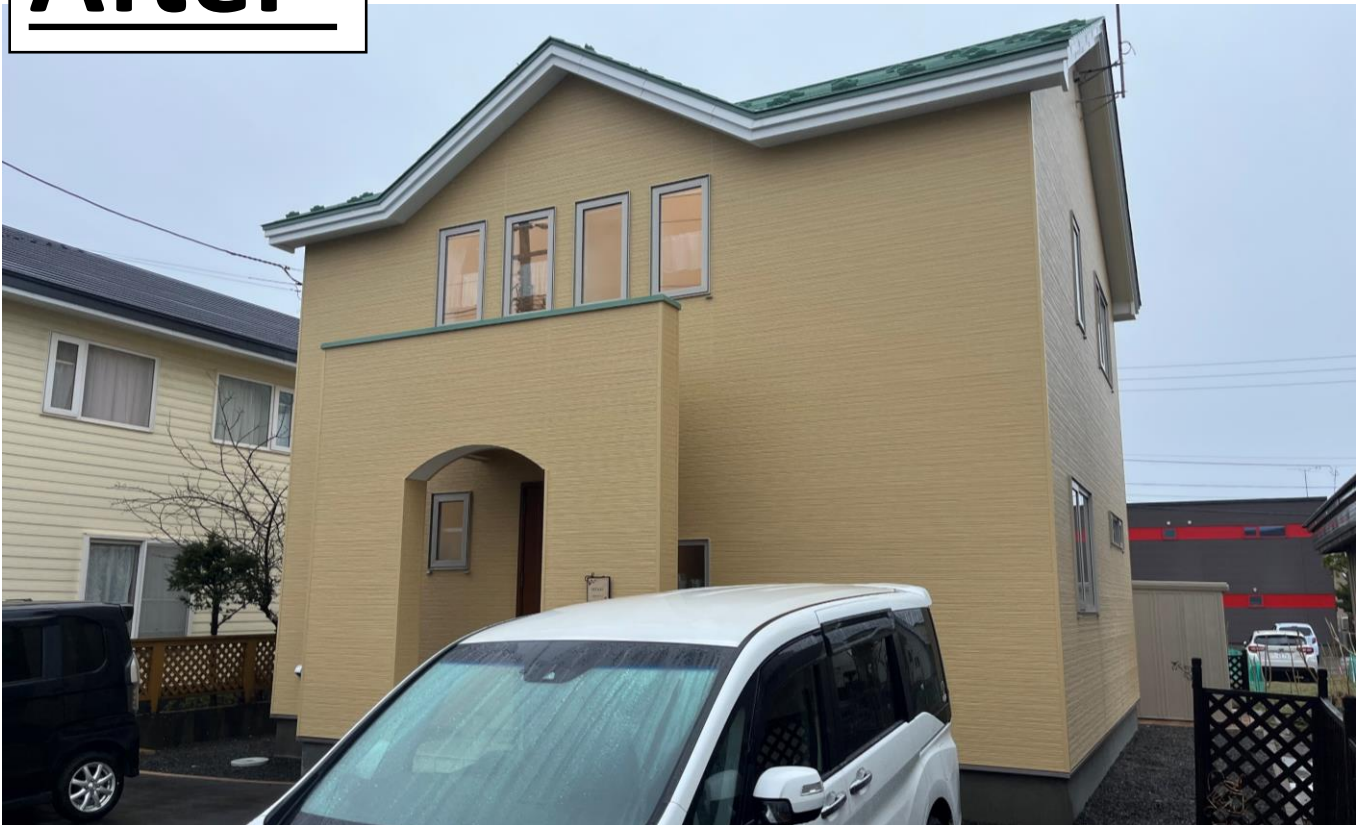

PAINTERAS
株式会社牧野建装
