




年月日	2024. 11. 8
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	




年月日	2024. 11. 8
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2024. 11. 8
工事部位	全体
使用材料	くさび足場
工事内容	仮設足場設置
備考	

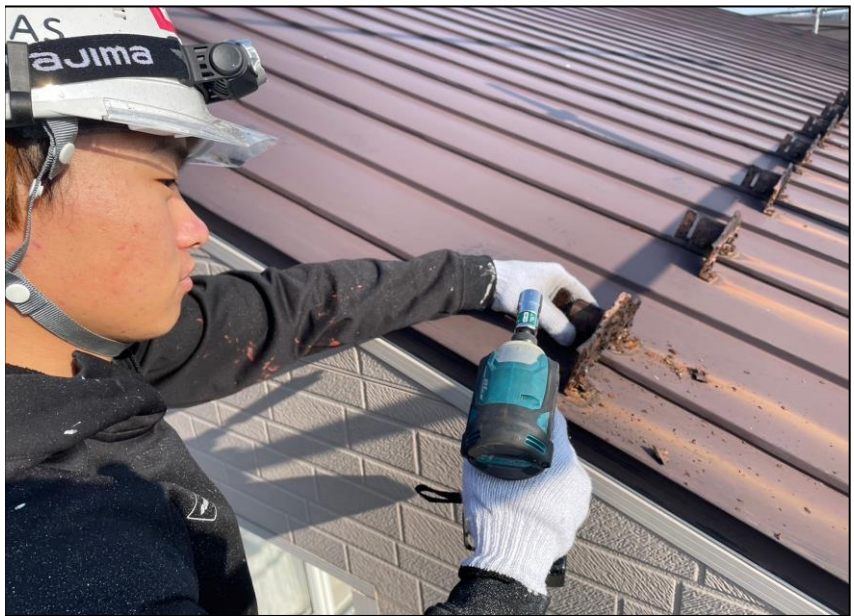

年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	雪止め
使用材料	インパクトドライバー
工事内容	雪止め撤去
備考	

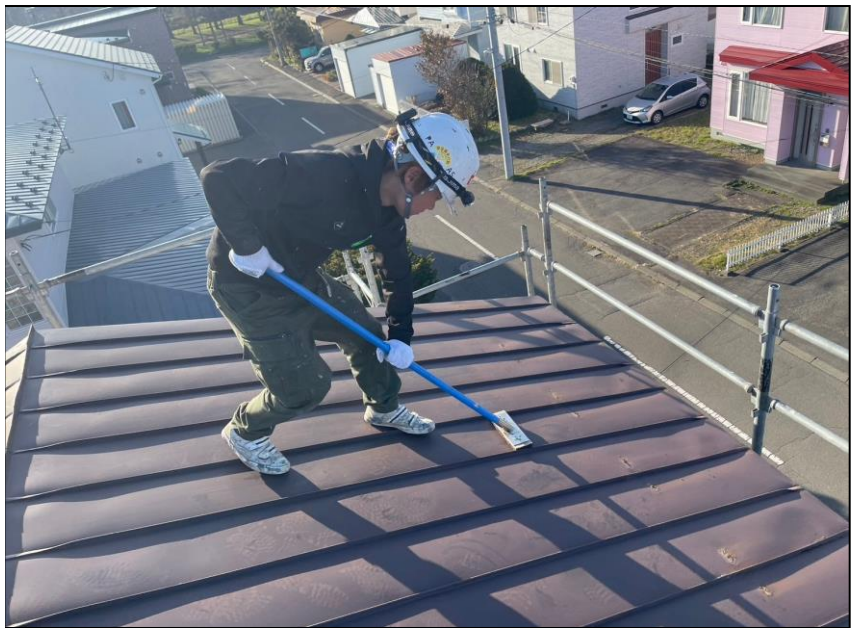


年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆箇所のケレンは、電動工具を使用いたしました。



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	破風、見返し
使用材料	サンドペーパー＃180
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施

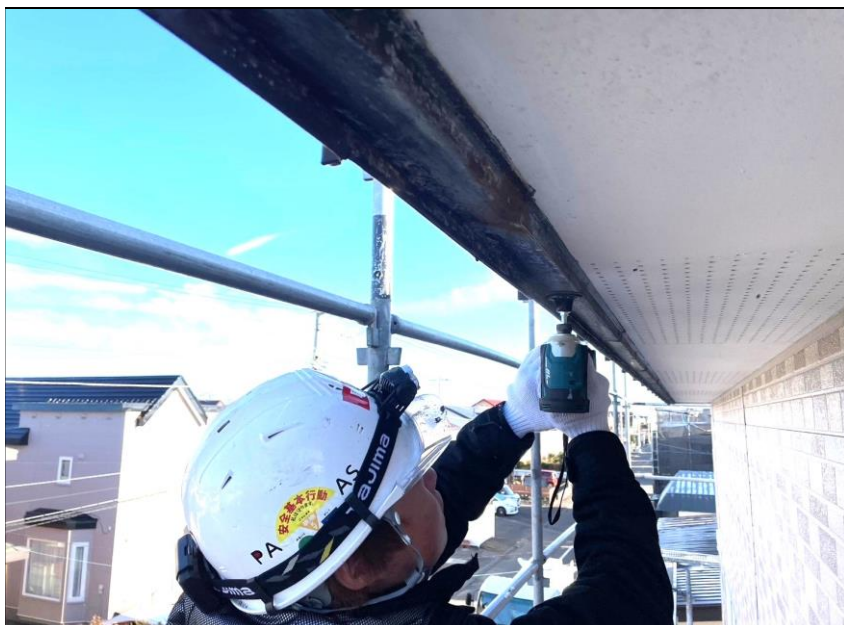

年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根
使用材料	電動インパクトカップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆箇所のケレンは、電動工具を使用いたしました。




年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	完了



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	破風
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	完了



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	破風見返し
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	完了

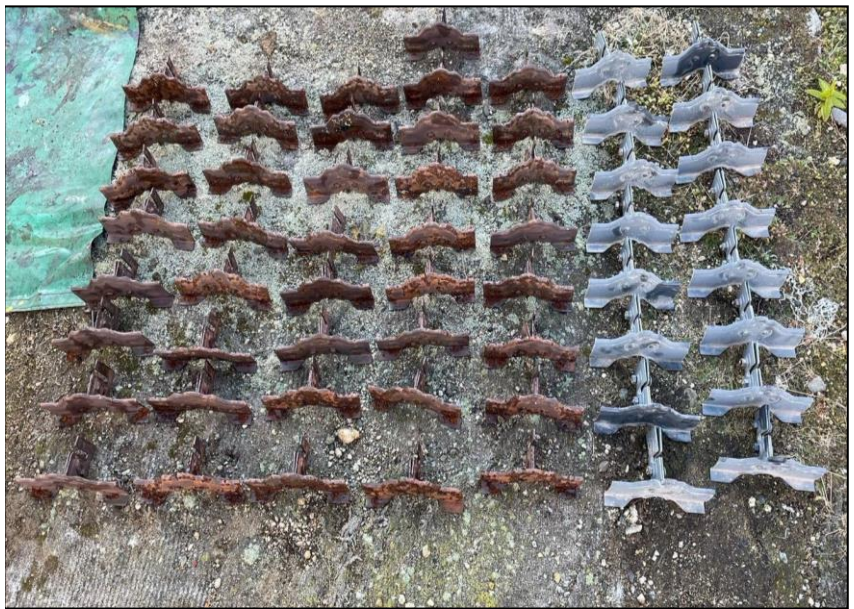

年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	雪止め
使用材料	電動インパクトドライバー
工事内容	撤去
備考	完了



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄。



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	バルコニー下屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	特にバルコニー下は汚れている為、念入りに洗うように指示しております。



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	破風
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	




年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根
使用材料	1液ハイボンファインデクロ 色黒さび色
工事内容	材料搬入 16キロ×1セット
備考	1液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	錆箇所補修塗り 及び 先行塗り
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。この作業は時間がかかる為に施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	錆箇所補修塗り
備考	完了

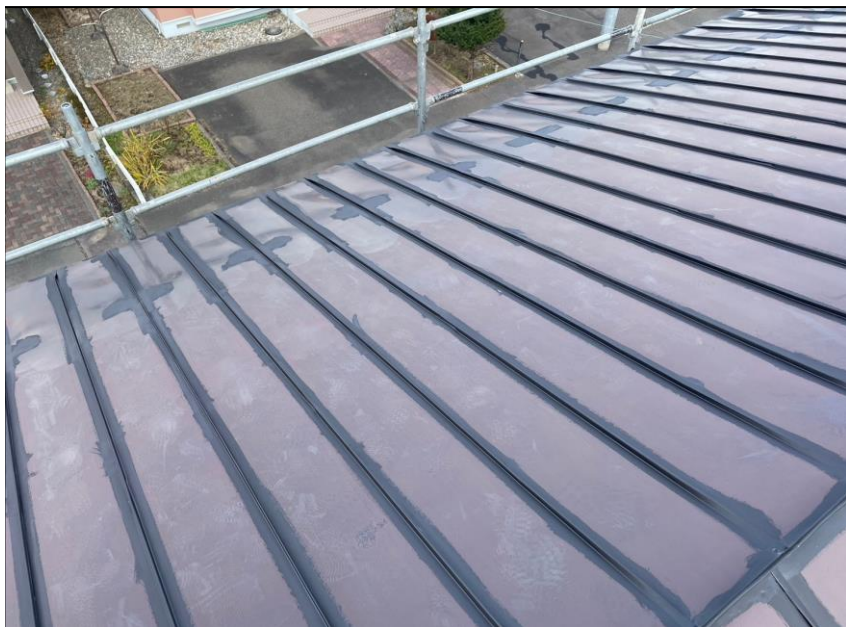

年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	先行塗り
備考	完了



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	バルコニー下屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	先行塗り
備考	完了



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	




年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	破風
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	破風
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了

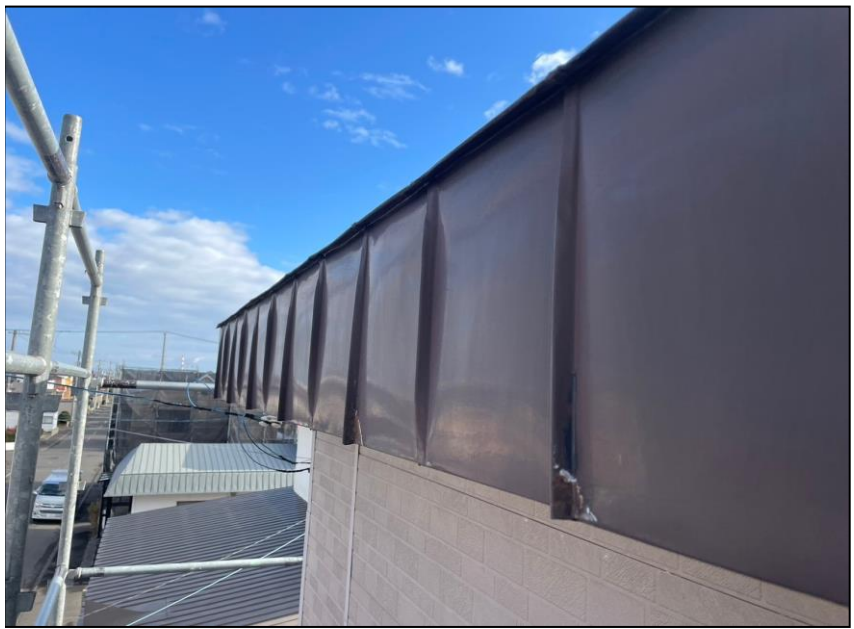

年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	破風
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	バルコニー下屋根
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	破風
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	軒天
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	軒天
使用材料	ハンマー、バール
工事内容	既存スレートボード撤去
備考	完了



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	軒天
使用材料	11mm有孔スレートボード
工事内容	復旧
備考	完了



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	換気フード
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	換気フード
使用材料	
工事内容	撤去
備考	完了



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	換気フード
使用材料	
工事内容	復旧
備考	完了




年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根、破風
使用材料	ファインルーフSI 色番:ノール
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×2セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂ト タン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用に より、優れた耐候性及び耐 久性を発揮します。



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り (先行塗り)
備考	サビ止め作業同様、1番錆 びる箇所「板金面の折り返し 溝の中」もしっかりと上塗り 塗料を塗りにみました。



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り (先行塗り)
備考	完了

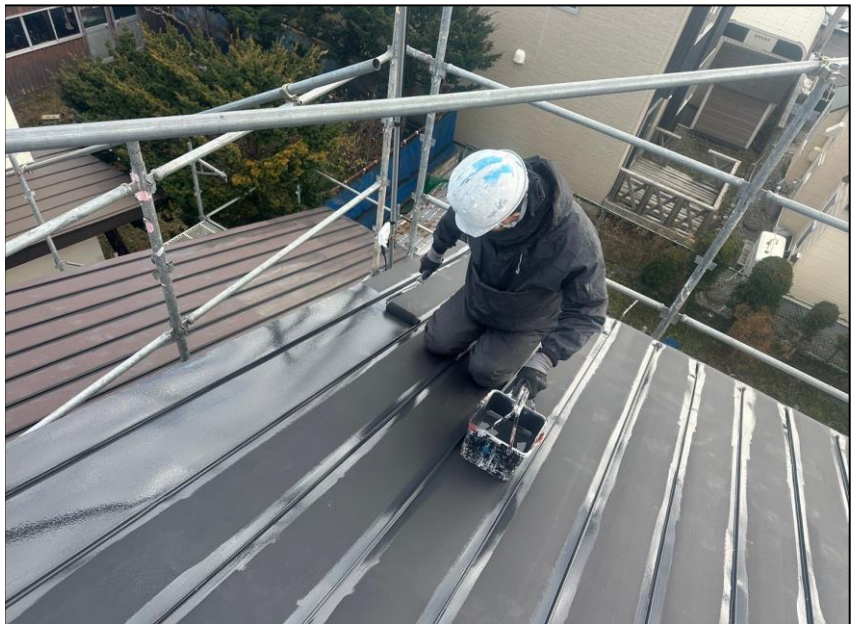

年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	雪止め
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	錆びていなかった雪止め16個塗装



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	玄関上小屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	雪止め
使用材料	
工事内容	41個搬入
備考	立て置き用雪止め (2本止め)



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	雪止め
使用材料	インパクトドライバー
工事内容	取付
備考	



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	雪止め
使用材料	インパクトドライバー
工事内容	取付
備考	完了



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	雪止め
使用材料	インパクトドライバー
工事内容	取付
備考	完了



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根、破風、軒天補修
使用材料	
工事内容	工事完了
備考	



年月日	2024. 11. 11～11. 23
工事部位	屋根、破風、軒天補修
使用材料	
工事内容	工事完了
備考	PAINTERAS 株式会社牧野建装
