



年月日	2025. 3. 19
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	仮設足場設置
備考	




年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、藻や苔などの不純物を洗浄



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	軒天
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリなどの不純物を洗浄

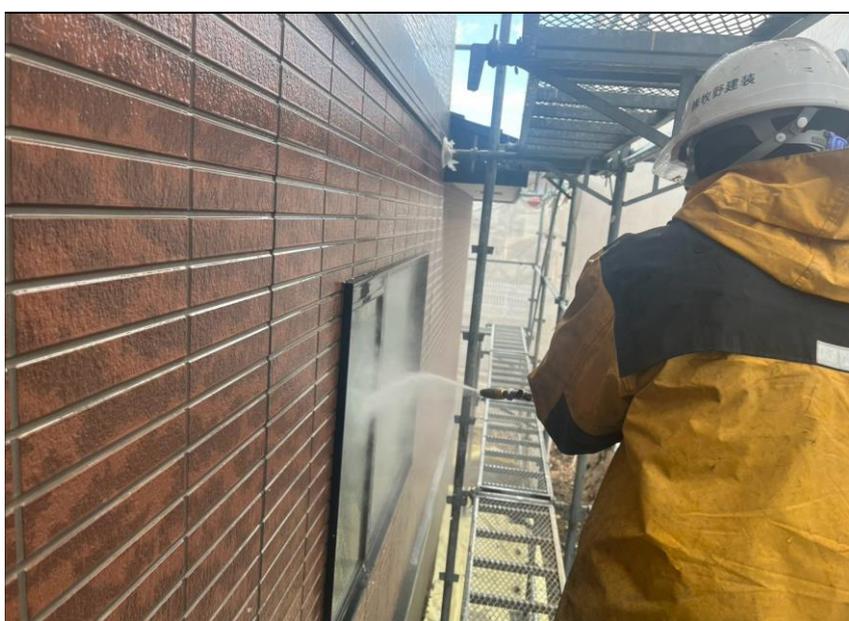


年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	窓
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや汚れなどを洗浄



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	玄関ドア
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや汚れなどを洗浄



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆びていない箇所については、手ケレンの実施 細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業

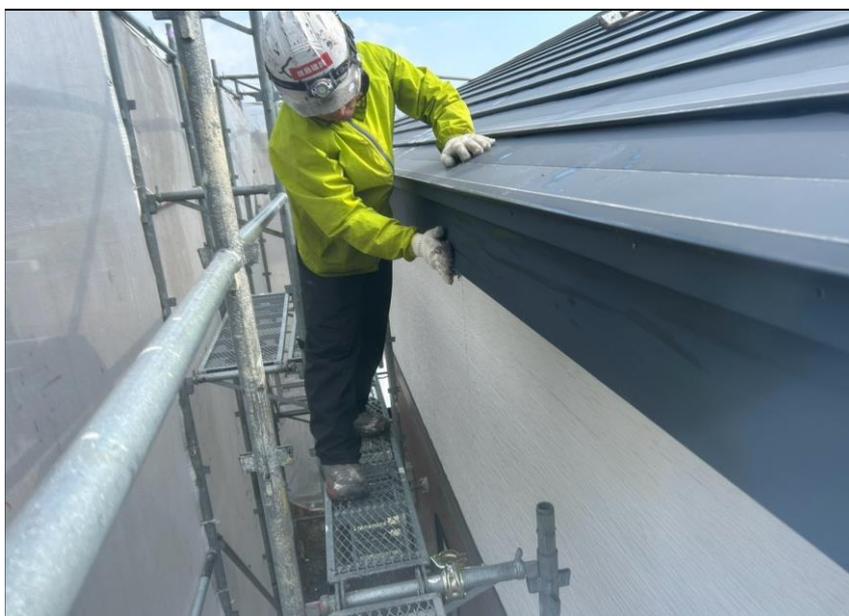

年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	破風
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	水切り
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	幕板(帯)
使用材料	ディスクカップワイヤーブラシ
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	意外に傷んでいたので電動工具を使用いたしました。



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去中
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去中
備考	




年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去後
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	2025. 3. 20~4. 8
使用材料	外壁
工事内容	コーキング撤去用カッター
	既存コーキング撤去後
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	2液形ウレタン樹脂コーキング
工事内容	材料搬入
備考	6L×5缶 プライマー=2缶 搬入

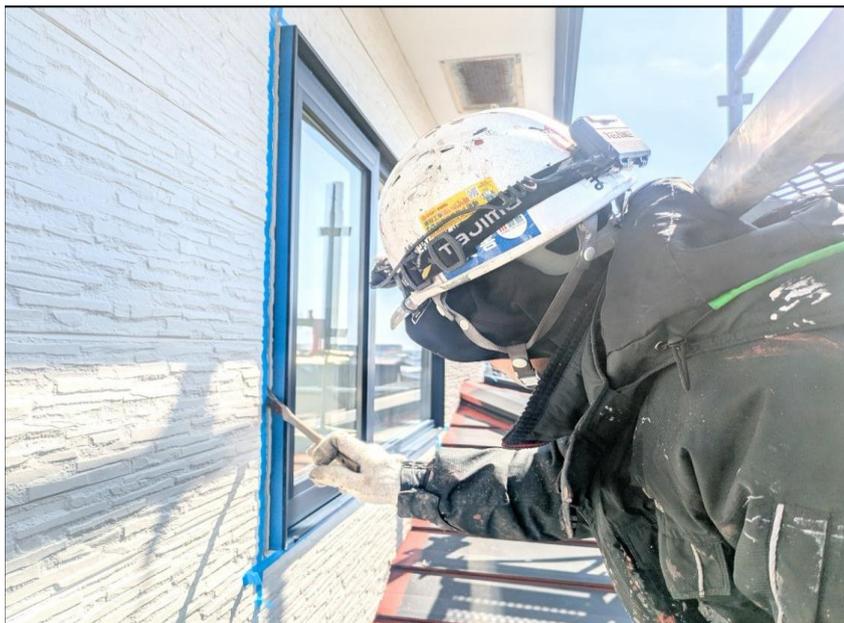

年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗布
備考	




年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	



年月日	2025. 3. 18~4. 11
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	へら押し(仕上げ)
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	へら押し(仕上げ)
備考	完了

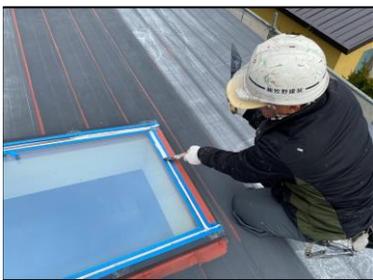

年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	天窓
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキング材充填 へら押し(仕上げ)
備考	完了



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	屋根、破風
使用材料	ハイボン20デクロ 色: 赤さび色
工事内容	材料搬入 16キロ×2セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	屋根
使用材料	ハイボン20デクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。この作業は時間がかかる為に施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	屋根
使用材料	ハイボン20デクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	先行塗完了



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	完了



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	屋根、破風
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	完了



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	屋根、破風
使用材料	デュフロンDFルーフ 色番:チョコレート
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×2セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊フッ素樹脂トタン屋根用塗料 特殊フッ素樹脂の採用により、優れた耐候性及び耐久性を發揮します。



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	屋根
使用材料	デュフロンDFルーフ
工事内容	中塗り (上塗り1回目先行塗り)
備考	サビ止め作業同様、1番錆びる箇所「板面の折り返し溝」のももしっかりと中塗り塗料を塗りこみました。



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	屋根
使用材料	デュフロンDFルーフ
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	破風
使用材料	デュフロンDFルーフ
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	屋根
使用材料	デュフロンDFルーフ
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	中塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	屋根
使用材料	デュフロンDFルーフ
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	




年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	破風
使用材料	デュフロンDFルーフ
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	屋根
使用材料	デュフロンDFルーフ
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	屋根
使用材料	デュフロンDFルーフ
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了

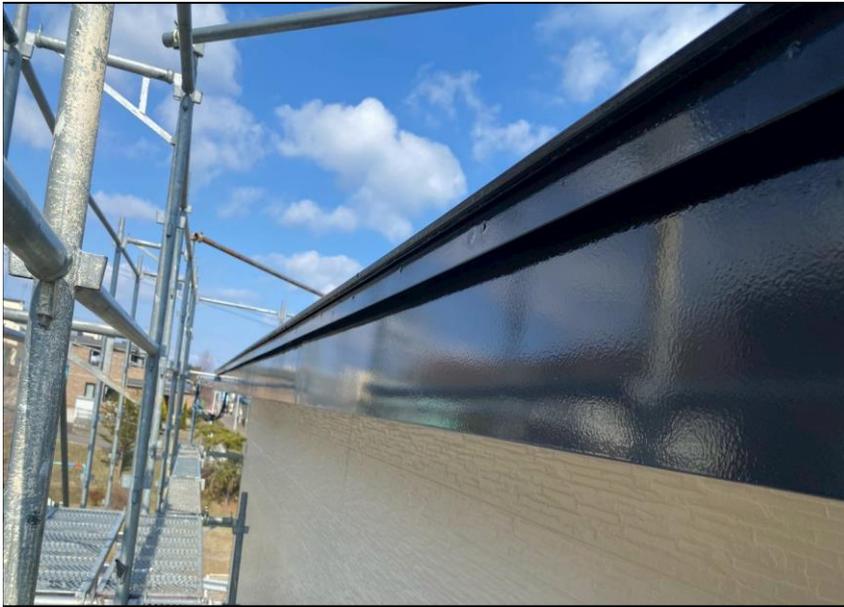

年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	破風
使用材料	デュフロンDFルーフ
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	軒天
使用材料	
工事内容	腐食部交換
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	軒天
使用材料	
工事内容	腐食部交換
備考	完了



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	軒天
使用材料	
工事内容	換気フード交換
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	軒天
使用材料	
工事内容	換気フード交換
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料搬入 15 ^{kg} × 1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	換気フード交換 上塗り
備考	完了



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	材料搬入 15キロ×2缶
備考	サイディング表面の劣化を調整し、上塗りの滑らかさを際立たせ、光沢のある美しい仕上げを提供します。また、特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮する下塗り塗料。



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	施工前
備考	

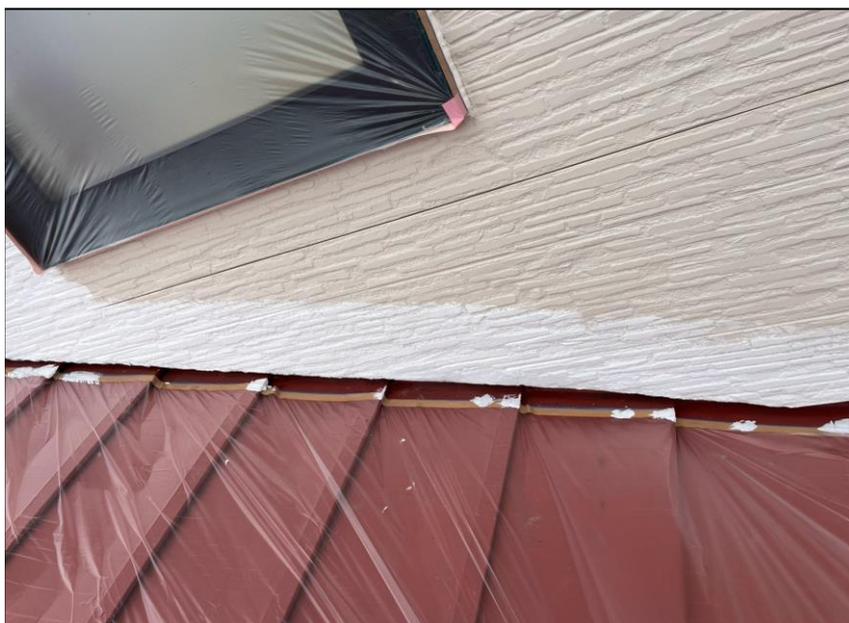

年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	下塗り
備考	増し塗り



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	下塗り
備考	完了



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番: 19-90D
工事内容	材料搬入 15 ^キ × 2セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD型シリコン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で従来にない超低汚染を実現し、耐候性1種に相当する性能を持つ塗料



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番: 19-90D
工事内容	下塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番: 19-90D
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番: 19-90D
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了




年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトDFクリアー 3分つや有り
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	セラミック系フッ素外壁保護 クリアー 高耐光性、紫外線吸収、超 低汚染、防カビ性に優れて いるクリアー塗料材です。



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクDFTクリアー 3分つや有り
工事内容	下塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクDFTクリアー 3分つや有り
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	

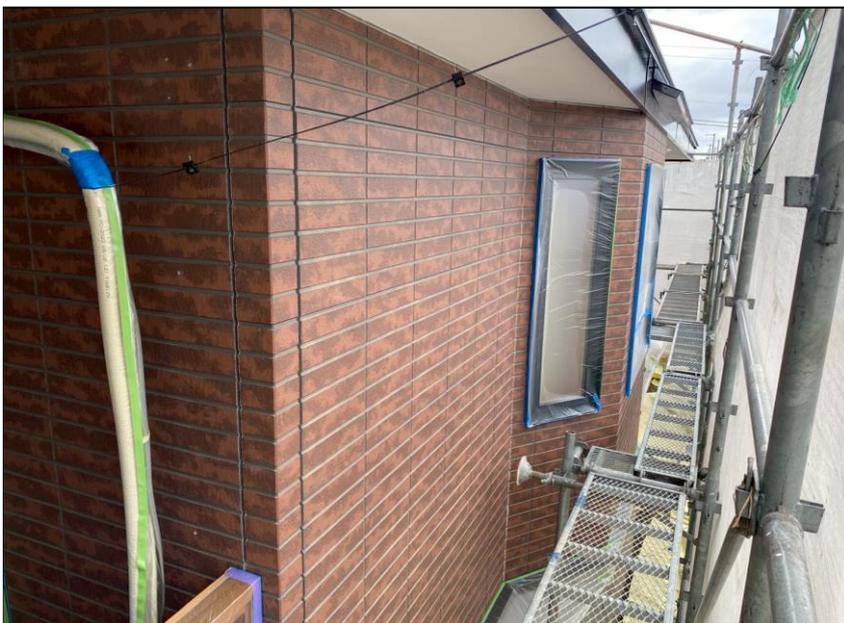


年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクDFTクリアー 3分つや有り
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	幕板(帯)
使用材料	パーフェクトサーフ
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	幕板(帯)
使用材料	デュフロンDFルーフ
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	

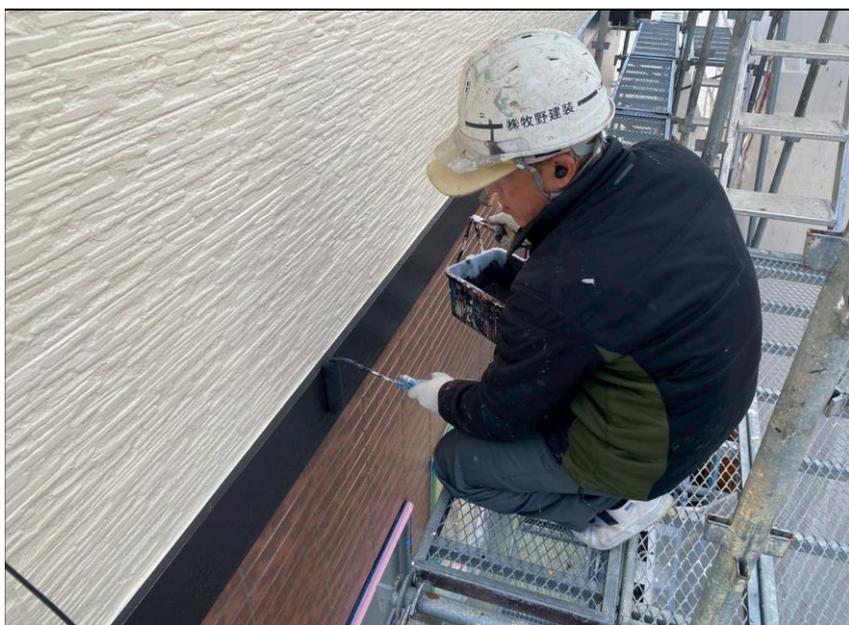


年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	幕板(帯)
使用材料	デュフロンDFルーフ
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	




年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	水切り
使用材料	ハイボン20デクロ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	水切り
使用材料	デュフロンDFルーフ
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	

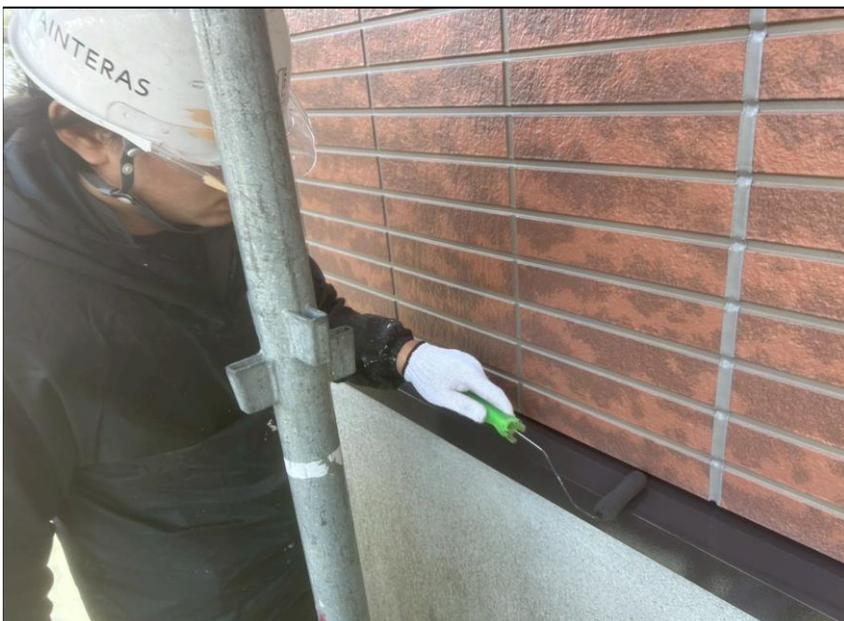

年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	水切り
使用材料	デュフロンDFルーフ
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	

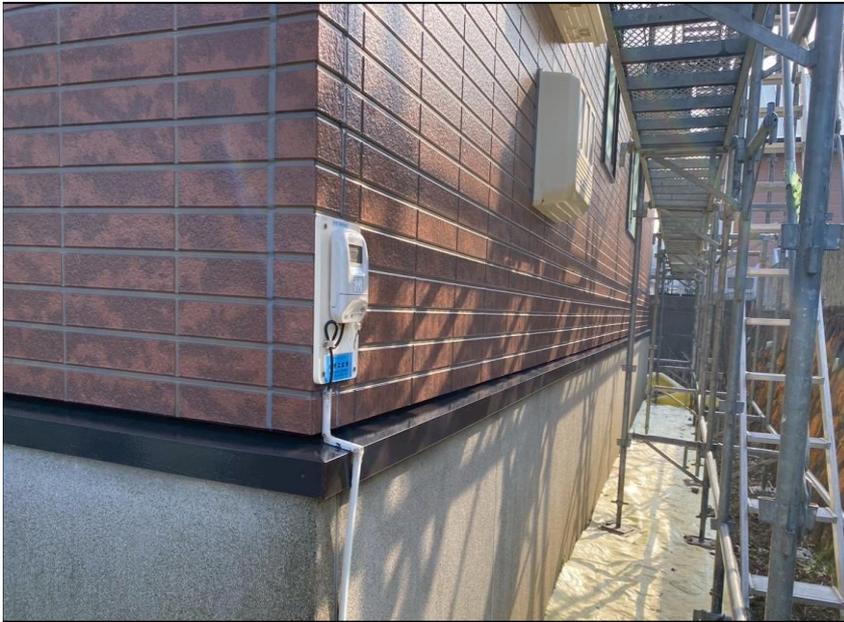

年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	水切り
使用材料	デュフロンDFルーフ
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	1F外壁
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	材料搬入
備考	4L×5缶 プライマー=2缶 搬入



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	1F外壁
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗り
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	1F外壁
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	1F外壁
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	1F外壁
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外灯
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	錆止め塗装 上塗り塗装
備考	施工前 施工後




年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	外灯
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	錆止め塗装 上塗り塗装
備考	施工前 施工後




年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー
工事内容	清掃
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	ウッドデッキ
使用材料	サンドペーパー ガードラックPRO
工事内容	下地調整 上塗り
備考	

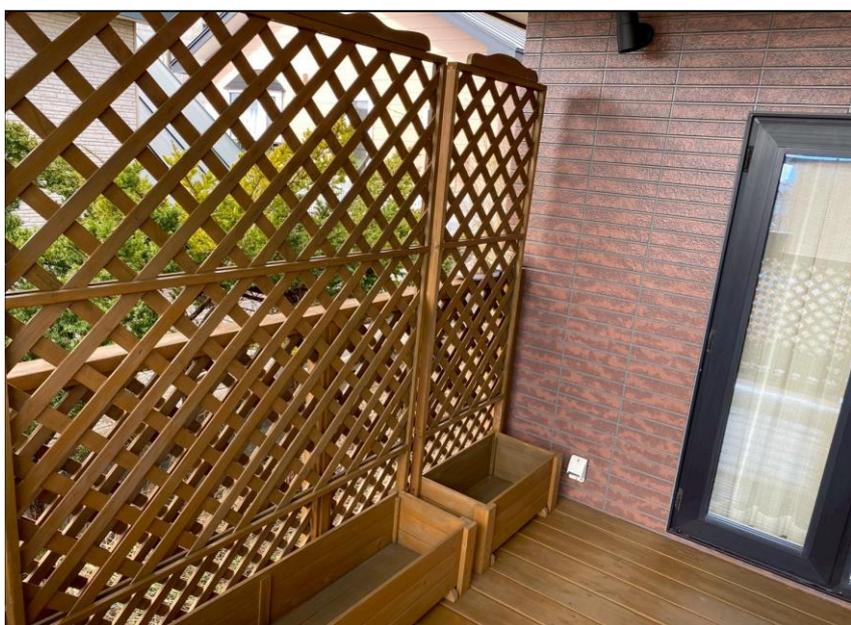

年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	ウッドデッキ
使用材料	ガードラックPRO
工事内容	上塗り
備考	完了

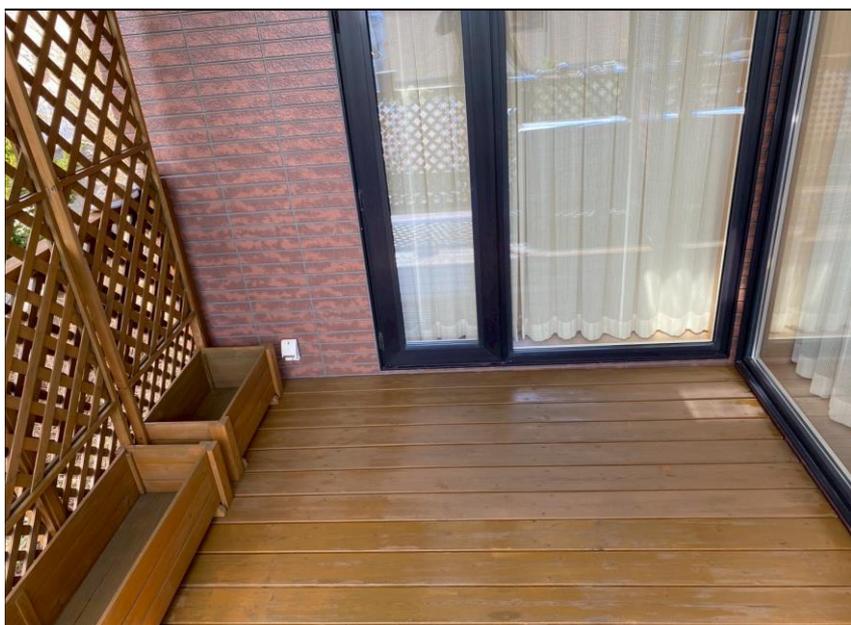

年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	ウッドデッキ
使用材料	ガードラックPRO
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事完了
備考	




年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事完了
備考	



年月日	2025. 3. 20~4. 8
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事完了
備考	PAINTERAS (株)牧野建装



Before



After-



PAINTERAS
株式会社牧野建装
