



年月日	2023. 7. 20
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2023. 7. 20
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	仮設足場設置
備考	




年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	ホコリなどの不純物を研磨材を使用しての除去作業



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	破風
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施

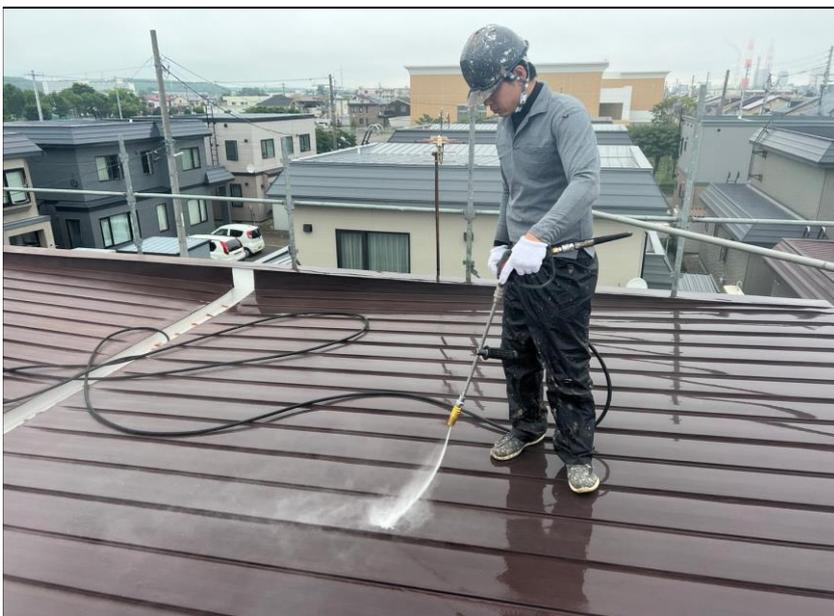

年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄。



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	ルーフドレン
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	高圧水洗浄前



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	ルーフドレン
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	苔や藻、ヘドロなどの汚れを高圧洗浄



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	ルーフドレン
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	高圧水洗浄後



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を洗浄。



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	窓
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの汚れを洗浄



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	土間
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	物置
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去後
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	2液形ウレタン樹脂コーキング
工事内容	材料搬入
備考	6L×4缶 プライマー=2缶 搬入



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗り
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押し (仕上げ)
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインデクロ 色: 赤さび色
工事内容	材料搬入 16 <sup>kg</sup> × 2セット
備考	1液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為に施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。




年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	先行塗完了




年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	物置屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	

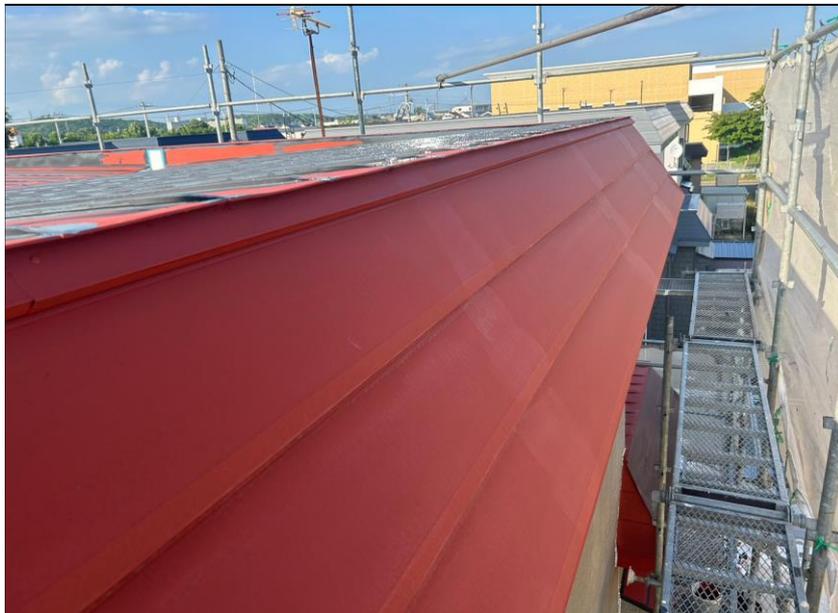

年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根(パラペット)
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了

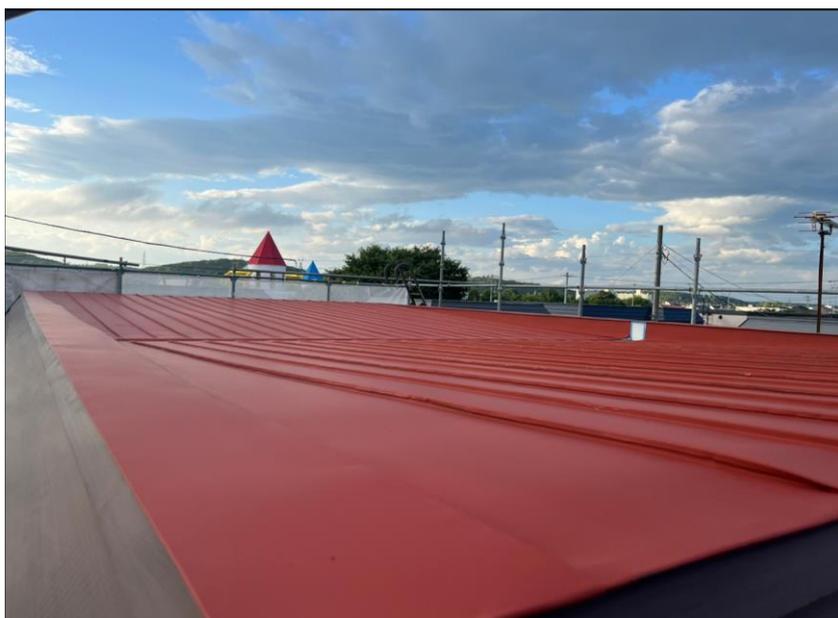

年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	物置屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSi 色番:ノアール
工事内容	材料搬入 15 <sup>キ</sup> □×2セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂トタン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用により、優れた耐候性及び耐久性を発揮します。



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	サビ止め作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のもしっかりと中塗り塗料を塗りこみました。




年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	先行塗完了



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根(パラペット)
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	

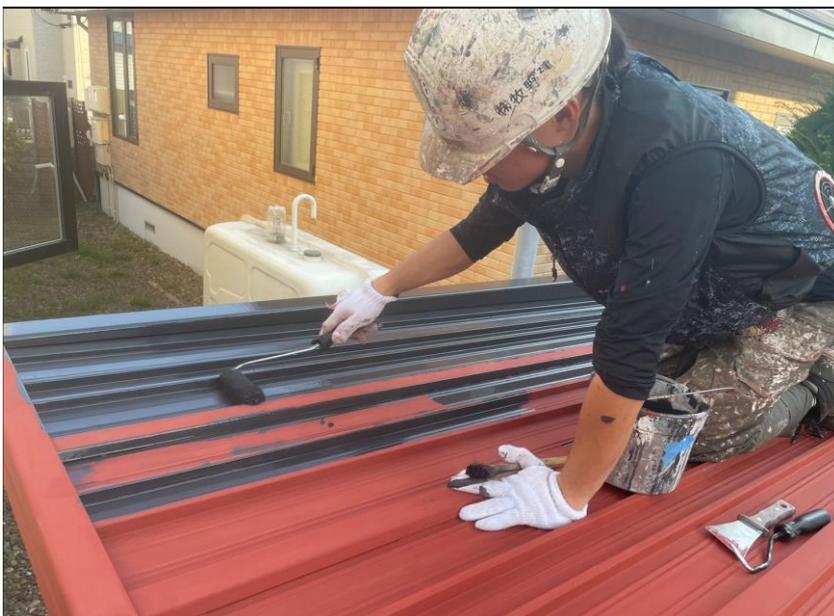

年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	物置屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	中塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	




年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了

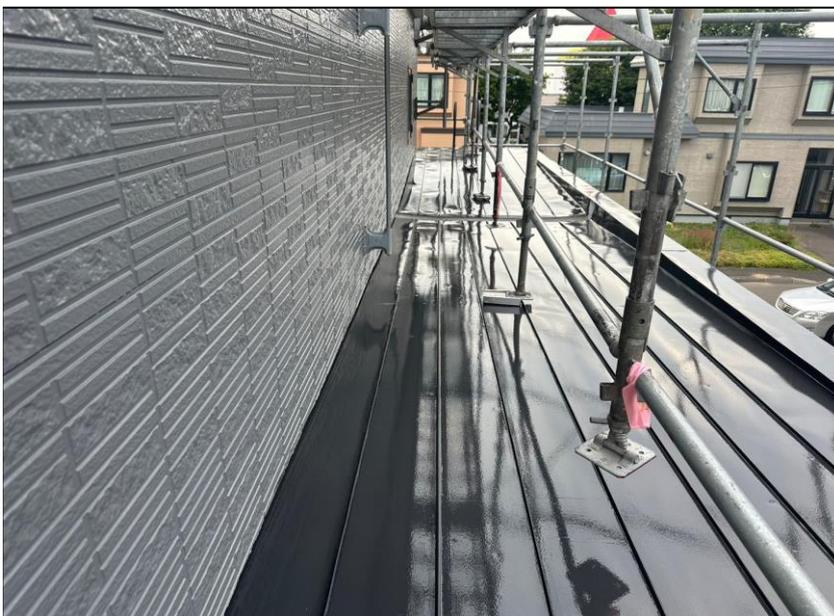

年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	軒天
使用材料	
工事内容	腐食状況
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	軒天
使用材料	軒天スレートボード
工事内容	軒天張替
備考	お見積りには貼替の工程は 入っておりませんでしたが サービスにて貼り換えておき ました。



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	軒天
使用材料	軒天スレートボード
工事内容	軒天張替
備考	完了



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	マイルドシーラーES
工事内容	材料搬入 16 <sup>キ</sup> ×1缶
備考	特殊エポキシ樹脂 浸透、固着性が高く、下地の補強効果に優れている。旧塗膜との密着性が抜群に良い



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	マイルドシーラーES
工事内容	下塗り
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料搬入 15 <sup>キ</sup> ×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番:N-40(3部つや)
工事内容	材料搬入 15 <sup>キ</sup> □×3セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD 型 <sup>ポ</sup> リウレタン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現 し、耐候性1種に相当する性 能を持つ塗料



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	




年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	物置外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	ボンドコーク
工事内容	補修
備考	外壁の隙間を埋めました




年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	ボンドコーク
工事内容	補修
備考	完了

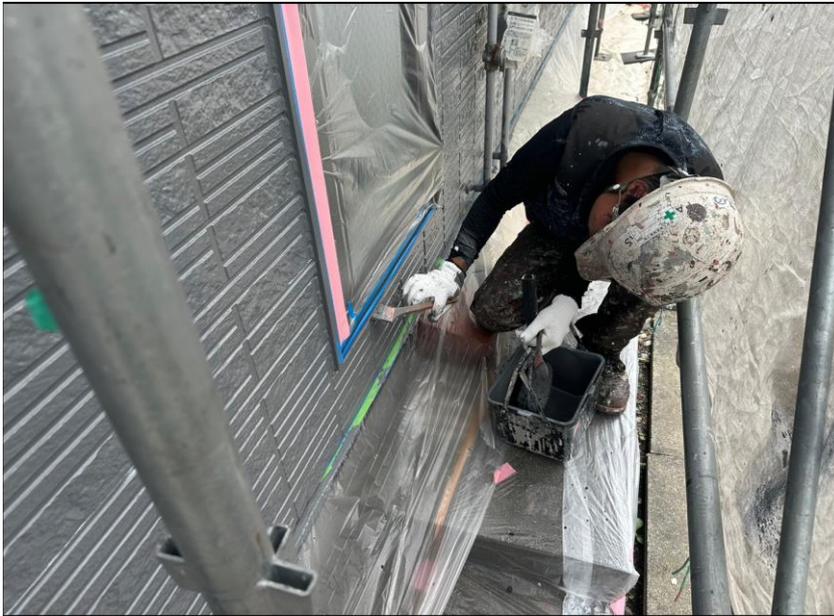

年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	




年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	

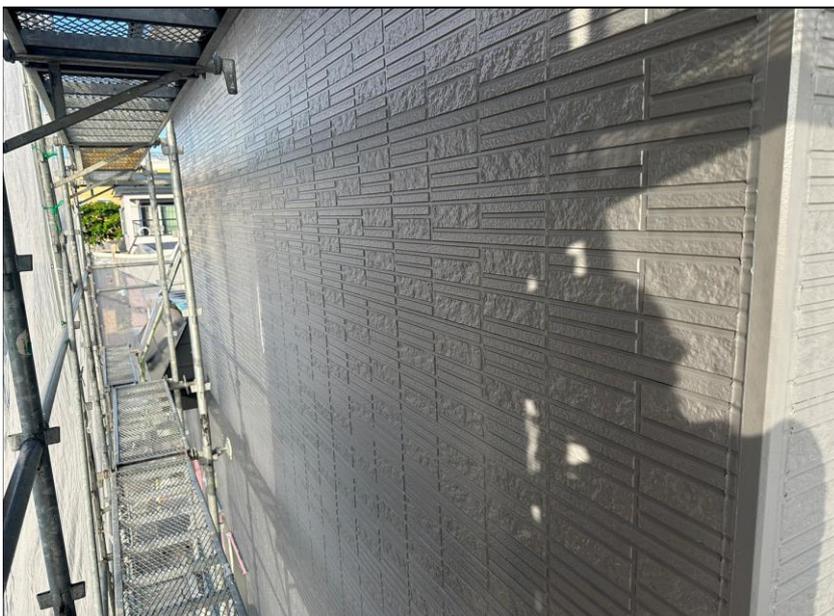

年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了

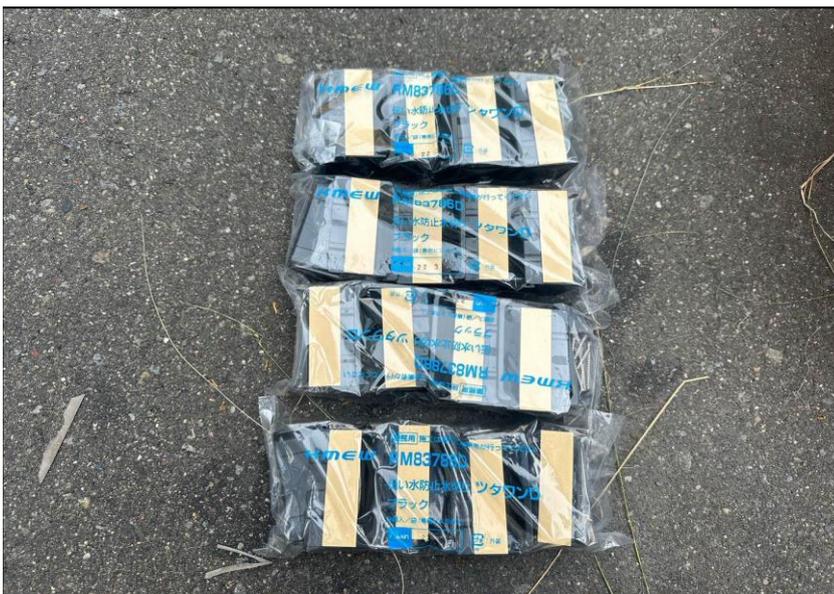

年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	伝い水防止水切り 8個入り4セット=32個
工事内容	材料搬入
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	外壁
使用材料	伝い水防止水切り
工事内容	取付け
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	換気フード
使用材料	サンドペーパー
工事内容	下地処理 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	換気フード
使用材料	サンドペーパー
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	換気フード
使用材料	サンドペーパー
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	ガス管
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	ガス管
使用材料	シルバートップ
工事内容	上塗り
備考	

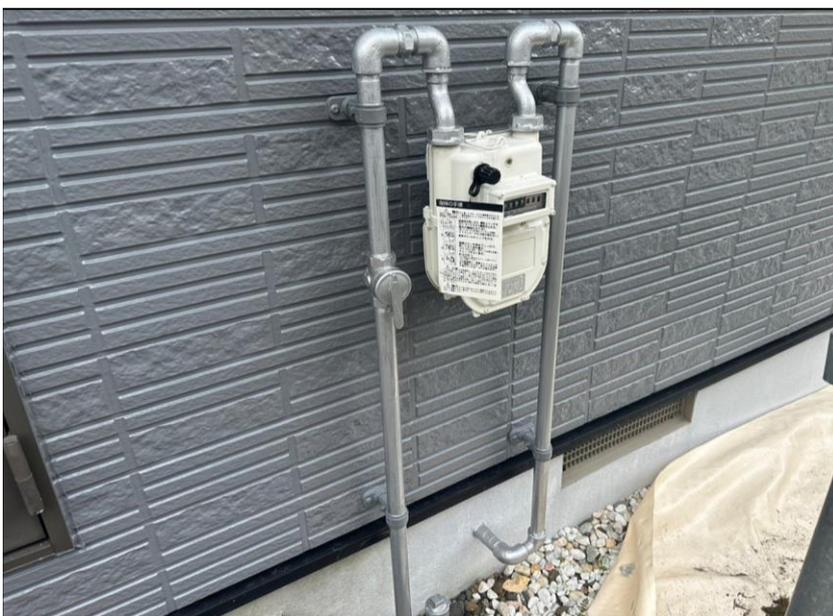

年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	ガス管
使用材料	シルバートップ
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースG II 色番:ライトグレー
工事内容	材料搬入 15 <sup>キ</sup> × 1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースG II
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースG II
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	ホームタンク
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	錆止め補修塗り
備考	




年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー
工事内容	清掃
備考	

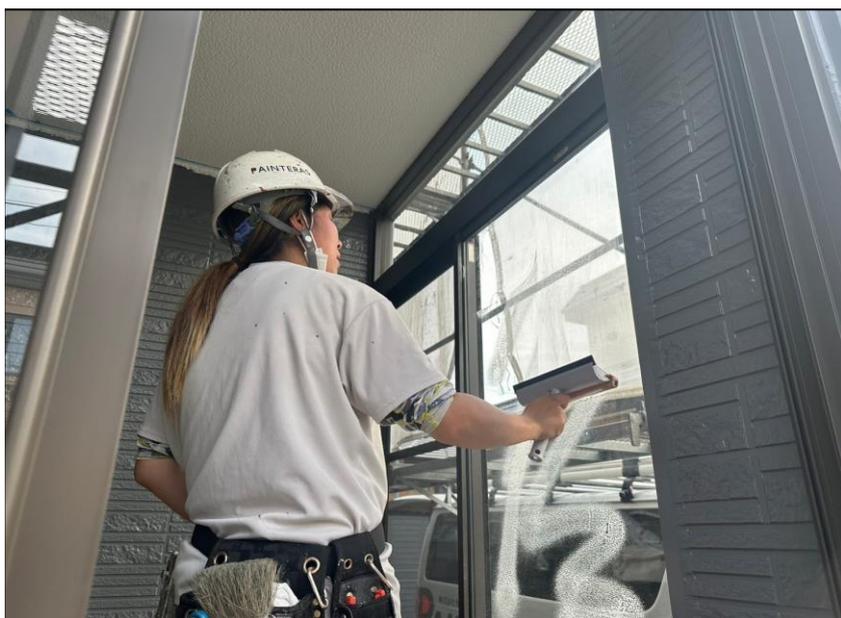

年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー
工事内容	清掃
備考	



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	物置
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了




年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2023. 7. 20~8. 7
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



**Before**



**After-**



**PAINTERAS**  
株式会社牧野建装
