



年月日	2022. 4. 20
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2022. 4. 27
工事部位	全体
使用材料	桝組み足場
工事内容	仮設足場組立
備考	飛散防止ネット張り 完了



年月日	2022. 4. 27
工事部位	全体
使用材料	桝組み足場
工事内容	仮設足場組立
備考	飛散防止ネット張り 完了



年月日	2022. 4. 27
工事部位	屋根
使用材料	マジックロン(研磨材)
工事内容	下地調整(ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業



年月日	2022. 4. 27
工事部位	屋根
使用材料	マジックロン(研磨材)
工事内容	下地調整(ケレン)
備考	



年月日	2022. 4. 27
工事部位	破風
使用材料	サンドペーパー(研磨紙)
工事内容	下地調整(ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業



年月日	2022. 4. 27
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄。



年月日	2022. 4. 27
工事部位	破風
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	高圧水をあて、ホコリや潮、汚れなどを除去



年月日	2022. 4. 27
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	高圧水を外壁面にあて、ホコリや潮、汚れなどを除去



年月日	2022. 4. 27
工事部位	窓
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	高圧水を窓にあて、ホコリや潮、汚れなどを洗浄。




年月日	2022. 4. 27
工事部位	基礎
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	高圧水を基礎にあて、ホコリや潮、藻などの汚れなどを洗浄。




年月日	2022. 4. 27
工事部位	ポーチ部
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	高圧水をポーチ部にあて、ホコリや泥などの汚れなどを洗浄。



年月日	2022. 4. 28～4. 29
工事部位	屋根、破風
使用材料	ハイポン20デクロ 色:ブラウン
工事内容	材料搬入 20 ^{キロ} ×2セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料

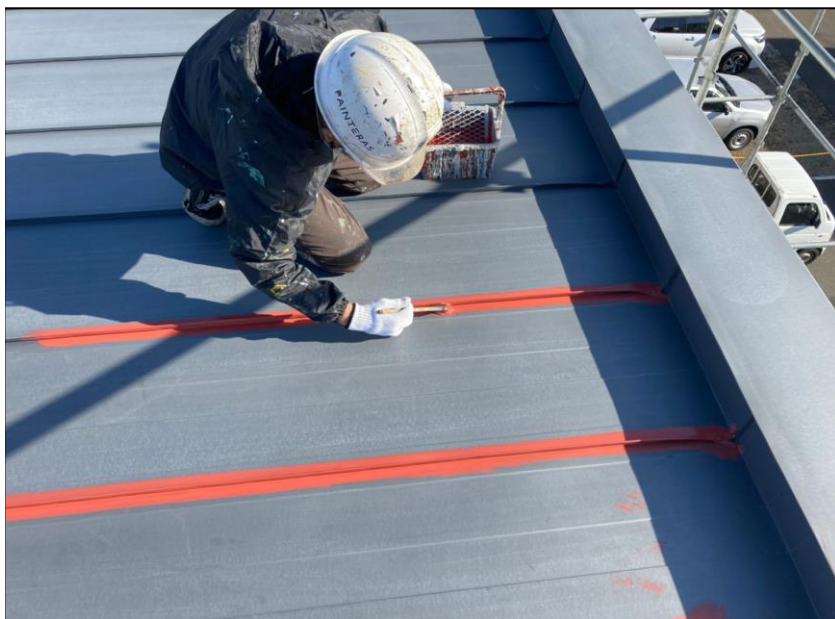


年月日	2022. 4. 28～4. 29
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為に施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。

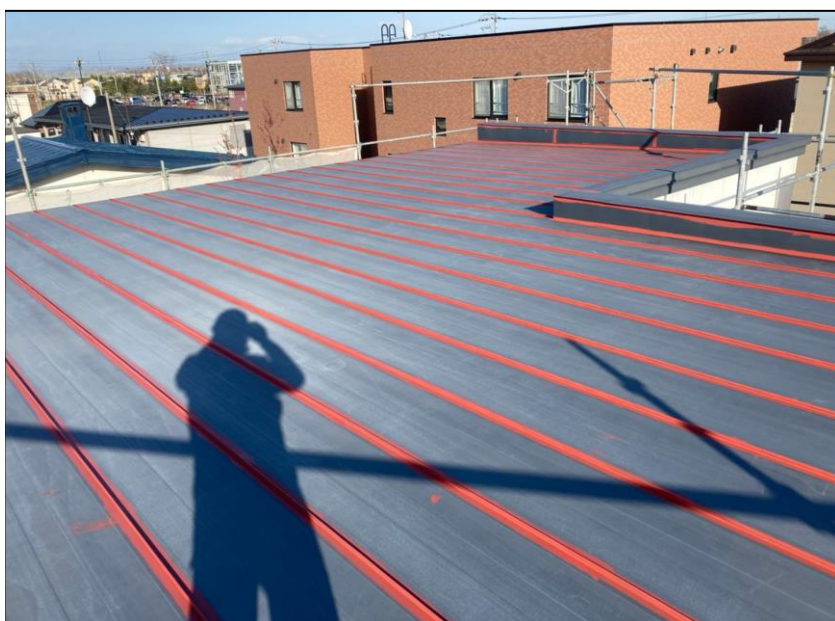

年月日	2022. 4. 28～4. 29
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	先行塗完了



年月日	2022. 4. 28～4. 29
工事部位	屋根
使用材料	ハイボン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	

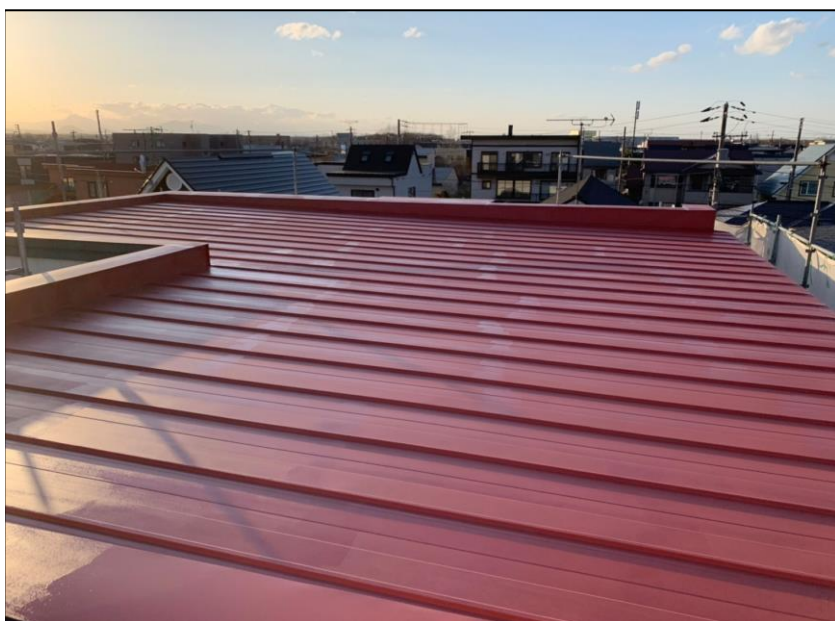


年月日	2022. 4. 28～4. 29
工事部位	屋根
使用材料	ハイボン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2022. 4. 29～5. 1
工事部位	屋根、破風
使用材料	ファインルーフSI 色番:ノアール
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×2セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂トタン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用により、優れた耐候性及び耐久性を発揮します。



年月日	2022. 4. 29～5. 1
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	サビ止め作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと中塗り塗料を塗りこみました。

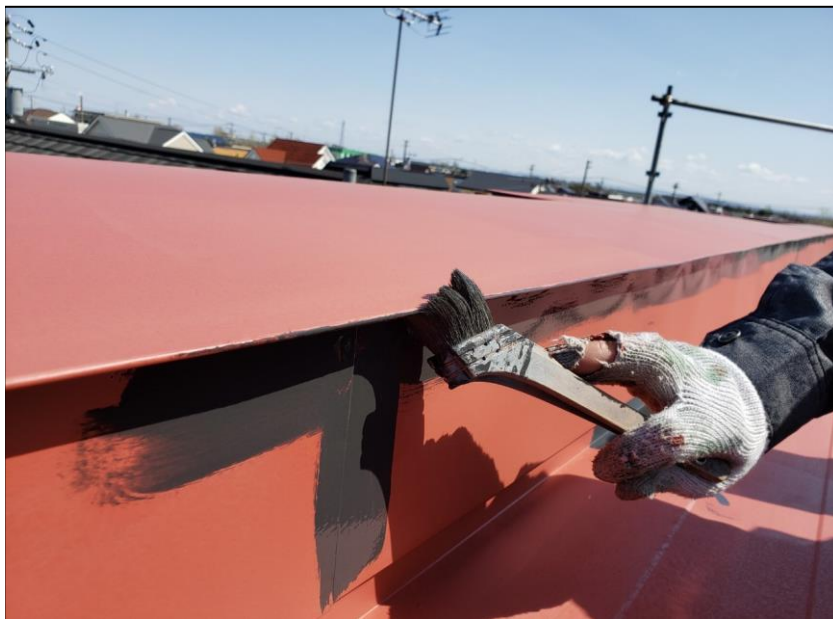


年月日	2022. 4. 29～5. 1
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2022. 4. 29～5. 1
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	先行塗完了



年月日	2022. 4. 29～5. 1
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	

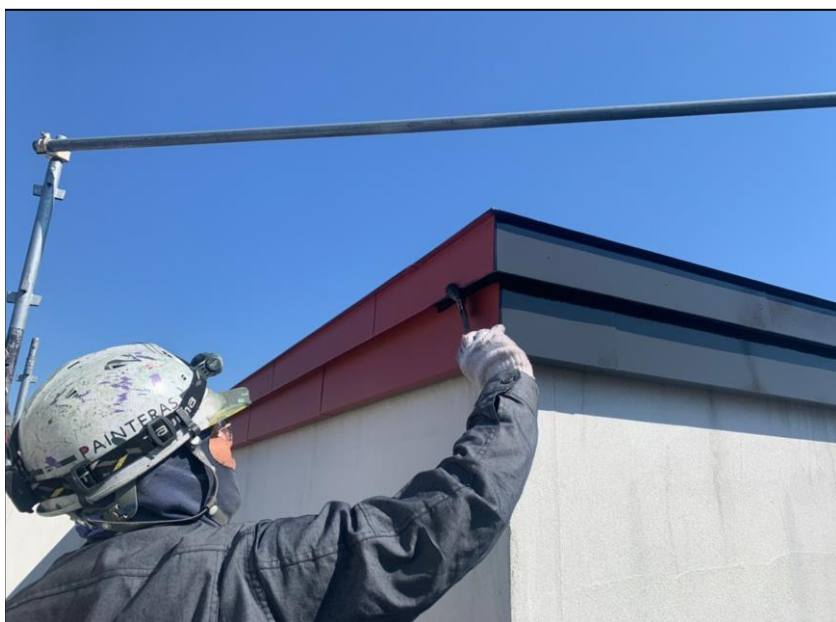

年月日	2022. 4. 29～5. 1
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2022. 5. 11～5. 13
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2022. 5. 11～5. 13
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	中塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。



年月日	2022. 5. 11～5. 13
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2022. 5. 11～5. 13
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2022. 5. 11～5. 13
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2022. 5. 6～5. 7
工事部位	外壁
使用材料	水性ミラクシーラーエコ
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×2セット
備考	下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮します。また、特殊設計により、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持する下塗り塗料です。



年月日	2022. 5. 6～5. 7
工事部位	外壁
使用材料	水性ミラクシーラーエコ
工事内容	下塗り (シーラー塗装)
備考	



年月日	2022. 5. 6～5. 7
工事部位	外壁
使用材料	水性ミラクシーラーエコ
工事内容	下塗り (シーラー塗装)
備考	




年月日	2022. 5. 7
工事部位	外壁
使用材料	アイカ ジョリパット
工事内容	欠損部補修
備考	補修前



年月日	2022. 5. 7
工事部位	外壁
使用材料	アイカ ジョリパット
工事内容	欠損部補修
備考	補修後



年月日	2022. 5. 7
工事部位	外壁
使用材料	
工事内容	錆止めタッチアップ
備考	外壁に錆汁が出て来ている箇所がありました。

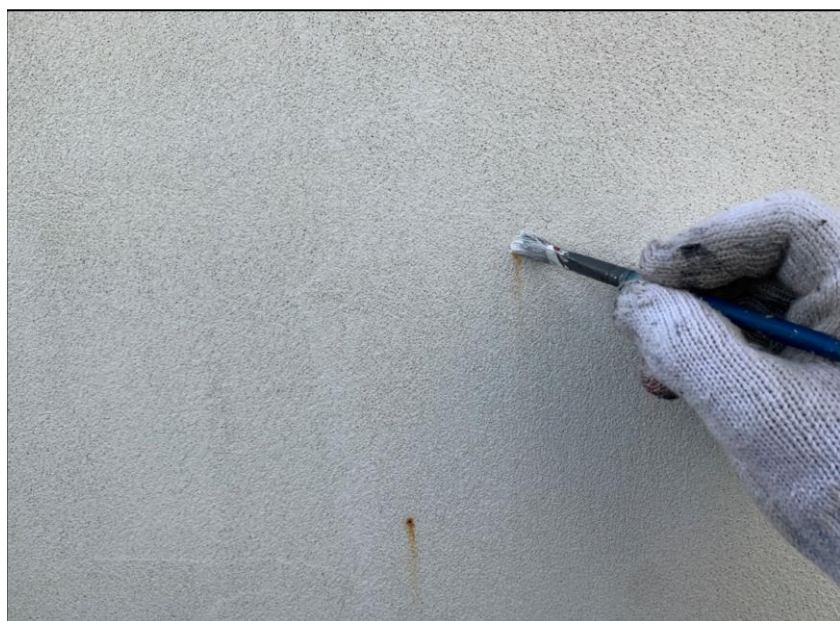

年月日	2022. 5. 7
工事部位	外壁
使用材料	
工事内容	錆止めタッチアップ
備考	錆止め塗装



年月日	2022. 5. 7
工事部位	外壁
使用材料	
工事内容	錆止めタッチアップ
備考	錆止め塗装完了



年月日	2022. 5. 9～5. 11
工事部位	外壁
使用材料	エスケーププレミアム無機
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×4セット
備考	ハイブリッド技術による無機系超耐候性樹脂やラジカルコントロール技術により、超耐候性を発揮する無機型塗料



年月日	2022. 5. 9～5. 11
工事部位	外壁
使用材料	エスケーププレミアム無機
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2022. 5. 9～5. 11
工事部位	外壁
使用材料	エスケーププレミアム無機
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	




年月日	2022. 5. 9～5. 11
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアム無機
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2022. 5. 9～5. 11
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアム無機
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2022. 5. 9～5. 11
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアム無機
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	

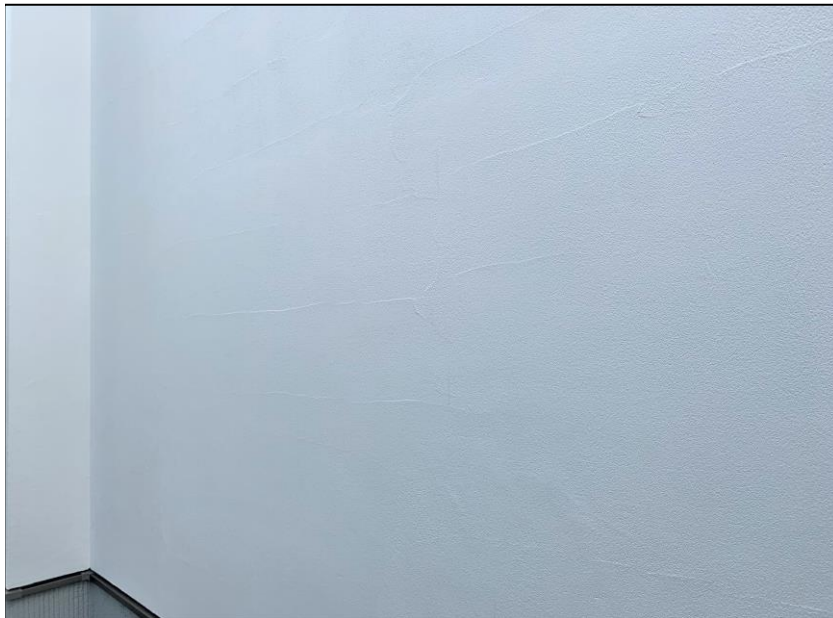

年月日	2022. 5. 9～5. 11
工事部位	外壁
使用材料	エスケーププレミアム無機
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了




年月日	2022. 5. 11～5. 12
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトクリアー 3部つや
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×1缶
備考	セラミック系外壁保護クリ ヤー 高耐光性、紫外線吸収、超 低汚染、防カビ性に優れて いるクリアー塗料材




年月日	2022. 5. 11～5. 12
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトクリアー 3部つや
工事内容	上塗り1回目 (下塗り)
備考	



年月日	2022. 5. 11～5. 12
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトクリアー 3部つや
工事内容	上塗り1回目 (下塗り)
備考	

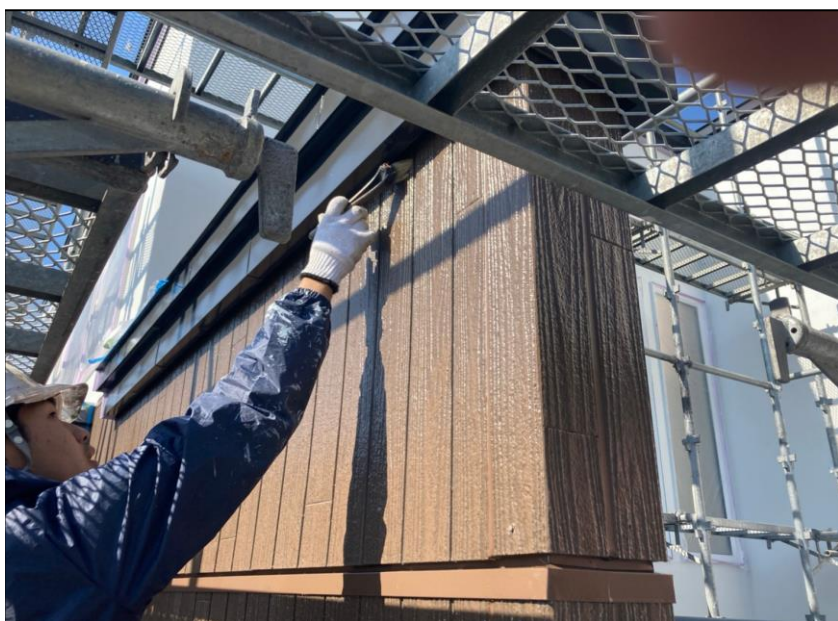

年月日	2022. 5. 11～5. 12
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトクリアー 3部つや
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	

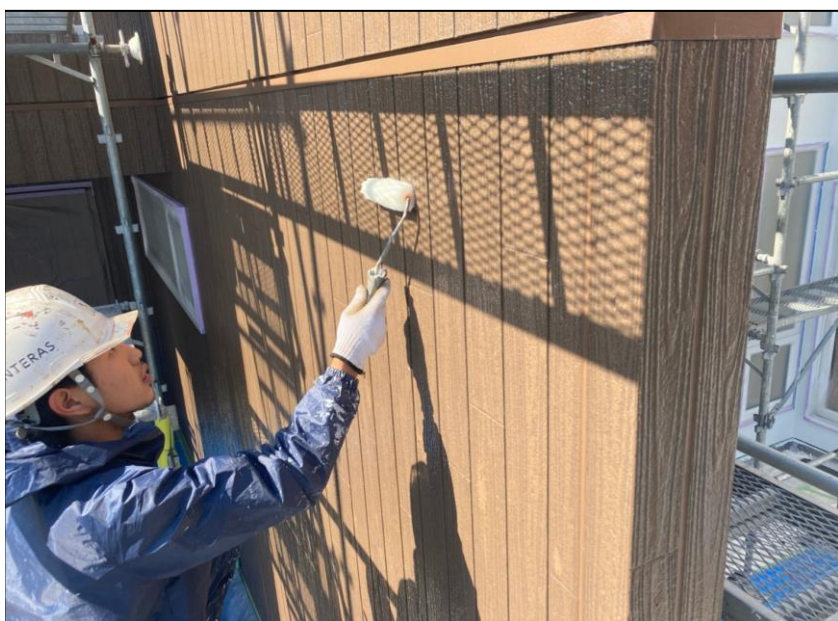

年月日	2022. 5. 11～5. 12
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトクリアー 3部つや
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	




年月日	2022. 5. 11～5. 12
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトクリアー 3部つや
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2022. 5. 10～5. 16
工事部位	木部
使用材料	ガードラックPRO チョコレート
工事内容	材料搬入 16 ^{キロ} × 1缶
備考	抜群の防腐・防虫・防カビ効果と撥水効果あり、木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない溶剤系浸透タイプ塗料




年月日	2022. 5. 10～5. 16
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り1回目 (下塗り)
備考	

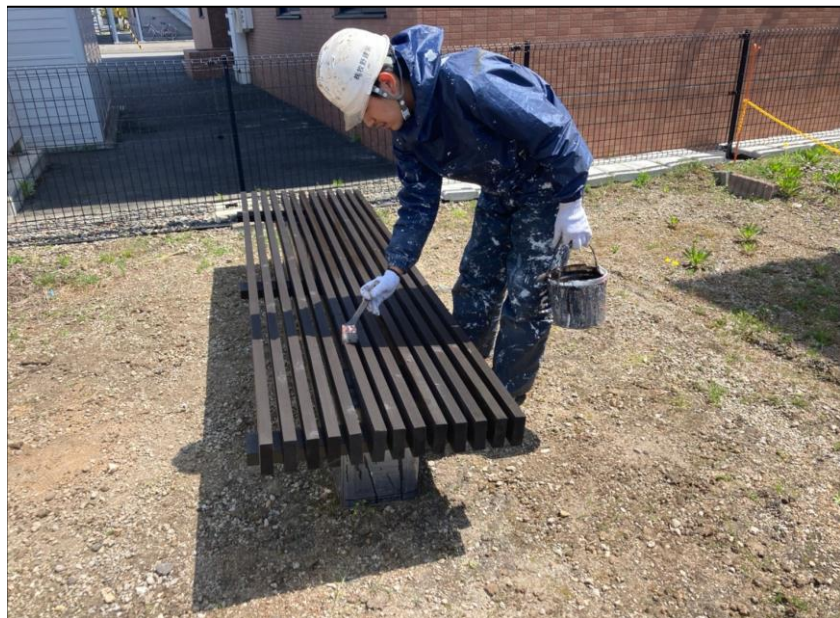

年月日	2022. 5. 10～5. 16
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2022. 5. 10～5. 16
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	

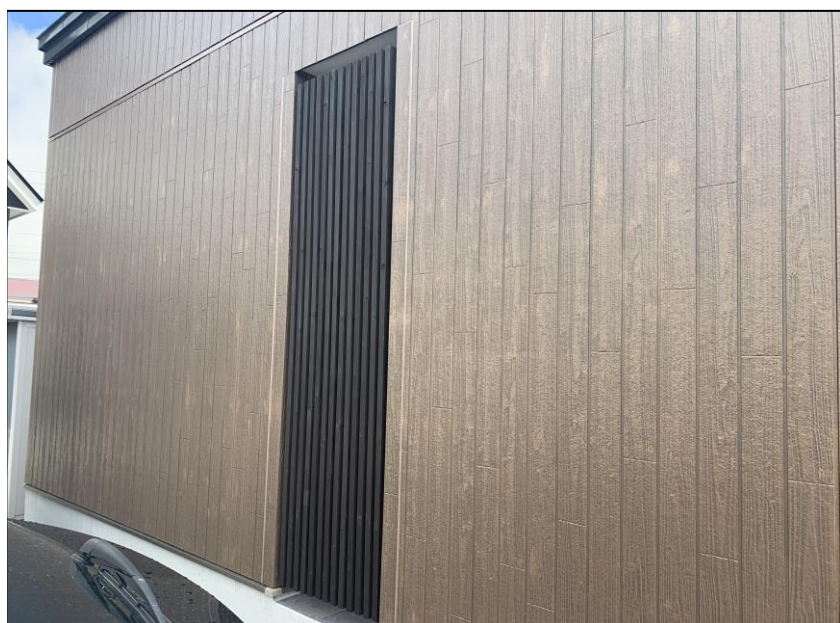

年月日	2022. 5. 10～5. 16
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	取付け完了




年月日	2022. 5. 10～5. 16
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	取付け完了




年月日	2022. 5. 13～5. 16
工事部位	外壁コーキング
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去中
備考	




年月日	2022. 5. 13～5. 16
工事部位	外壁コーキング
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去中
備考	

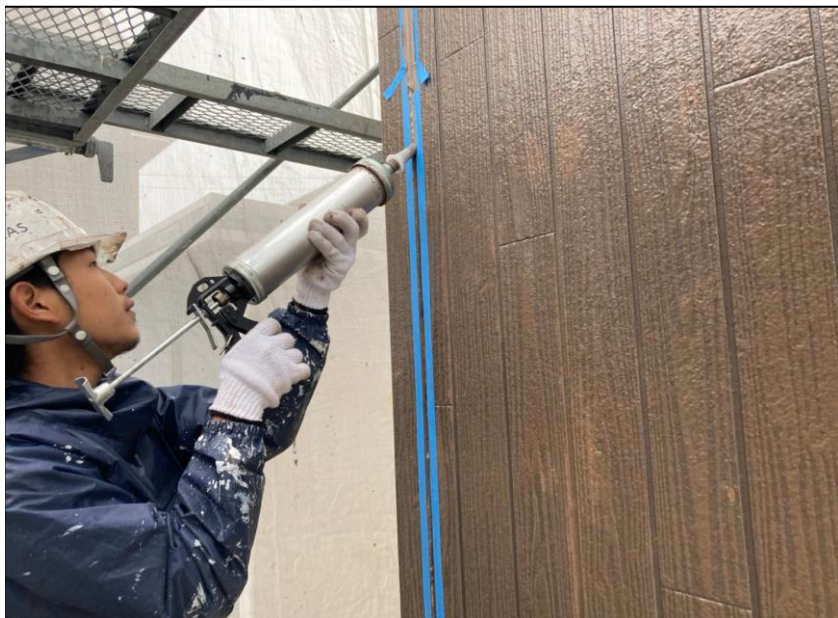

年月日	2022. 5. 13～5. 16
工事部位	外壁コーキング
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	

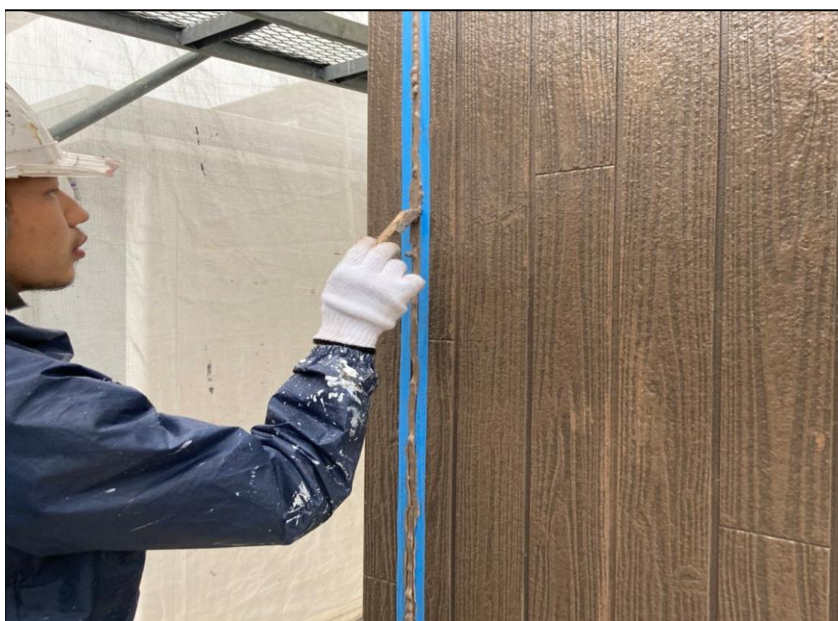

年月日	2022. 5. 13～5. 16
工事部位	外壁コーキング
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押し (仕上げ)
備考	

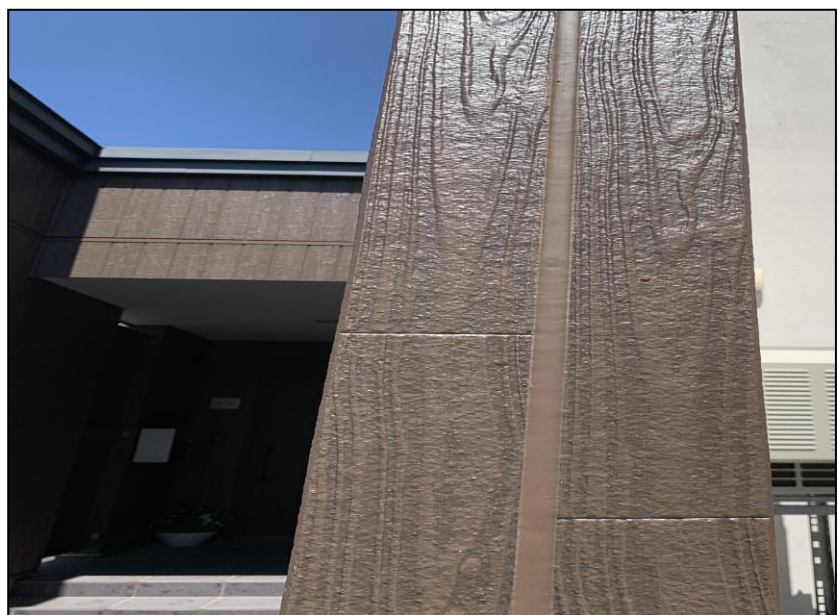

年月日	2022. 5. 13～5. 16
工事部位	外壁コーキング
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押し (仕上げ)
備考	完了



年月日	2022. 5. 16～5. 17
工事部位	基礎
使用材料	1液マイルドシーラー-ES
工事内容	材料搬入 16 ^キ □×1缶
備考	



年月日	2022. 5. 16～5. 17
工事部位	基礎
使用材料	クリーンカラーAベスト
工事内容	材料搬入 16 ^キ □×1缶
備考	1液形アクリル樹脂で取り扱いやすく、速乾性で屋外にも適用できるタイプ。 つや有りタイプとつや消しタイプがあり、一般工場から倉庫、事務所、店舗などに適用でき、密着性に優れています。



年月日	2022. 5. 16～5. 17
工事部位	基礎
使用材料	クリーンカラーAベスト
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2022. 5. 20
工事部位	戸建て住宅
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2022. 5. 20
工事部位	戸建て住宅
使用材料	
工事内容	仮設足場解体
備考	完了



年月日	2022. 5. 20
工事部位	戸建て住宅
使用材料	
工事内容	
備考	(株)牧野建装 PAINTERAS



Before



After-



PAINTERAS
牧野建装

