



年月日	2025. 4. 17
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	




年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地処理(ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施 錆びていた箇所については、電動工具を使用いたしました。




年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	破風
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地処理(ケレン)
備考	同上



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄。

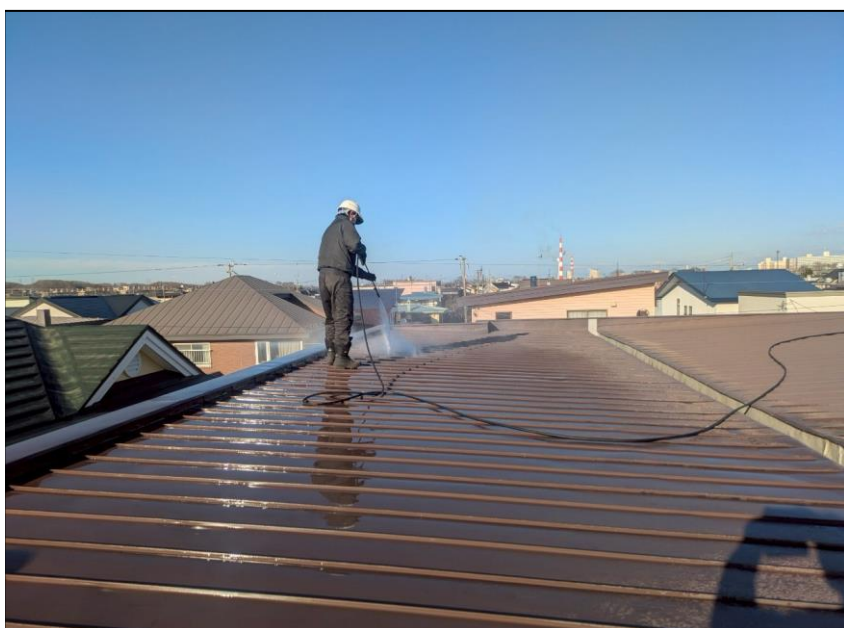

年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上

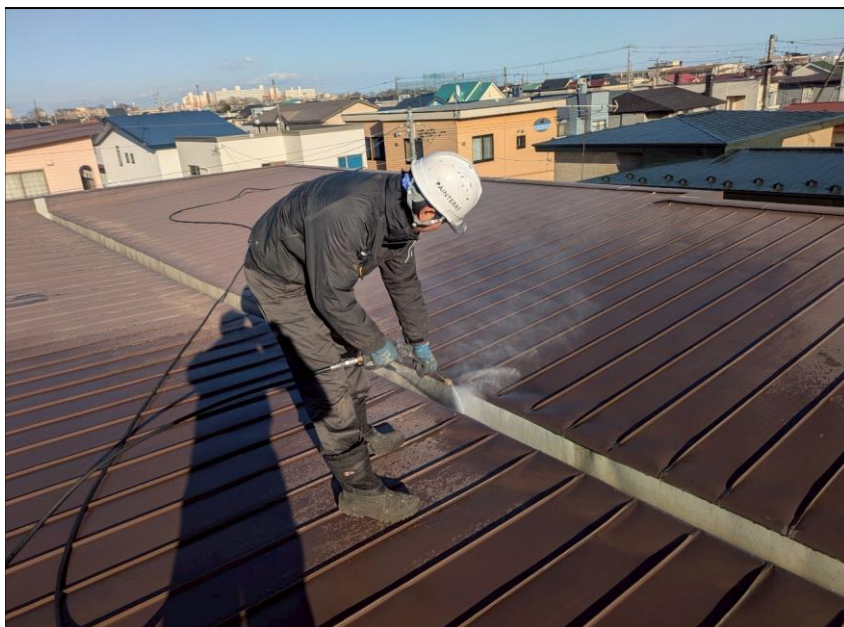

年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	スノーダクト
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	苔や藻、ヘドロなどの汚れを清掃



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	ホームタンク
使用材料	
工事内容	高圧水洗浄前
備考	



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	ホームタンク
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、藻や苔などの不純物を洗浄



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	ホームタンク
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	完了



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ 色: 赤さび色
工事内容	材料搬入 16 ^キ ×2セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	屋根
使用材料	
工事内容	
備考	コーキングが切れている状態



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	屋根
使用材料	
工事内容	
備考	コーキングが切れている状態



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	屋根
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	充填
備考	コーキングが切れていた箇所すべてに、新しいコーキング材を充填しました



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	屋根
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	充填
備考	完了




年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSi 色番:チャコールグレー
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×2セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂ト タン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用に より、優れた耐候性及び耐 久性を発揮します。



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	上塗り
備考	サビ止め作業同様、1番錆 びる箇所「板金面の折り返し 溝」のももしっかりと上塗り塗 料を塗りこみました。



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	屋根
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	上塗り
備考	先行塗完了

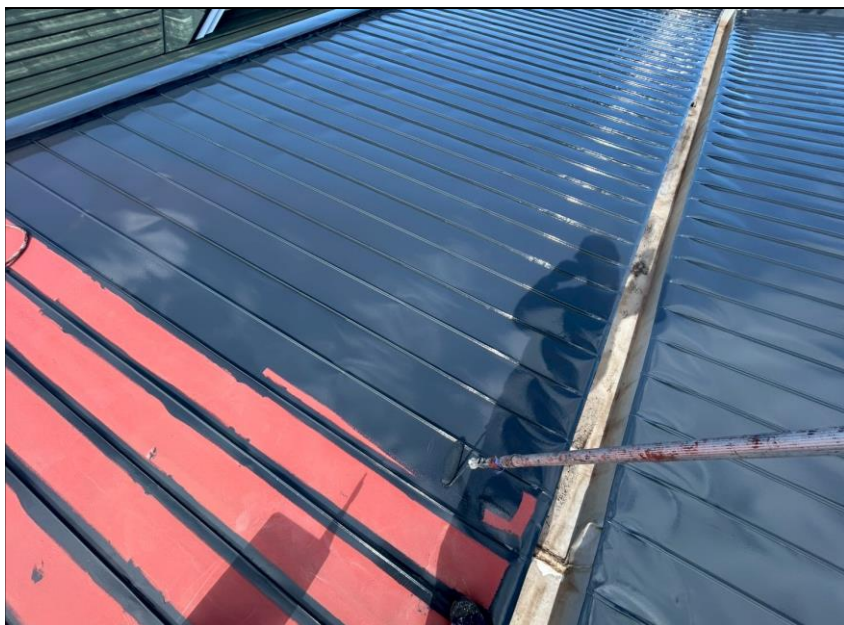

年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	屋根
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	破風
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	屋根
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	小屋根
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	小屋根
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	スノーダクト
使用材料	フローン プライマー-US
工事内容	材料搬入
備考	ウレタン防水用プライマー



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	スノーダクト
使用材料	フローン プライマー-US
工事内容	プライマー塗布
備考	完了

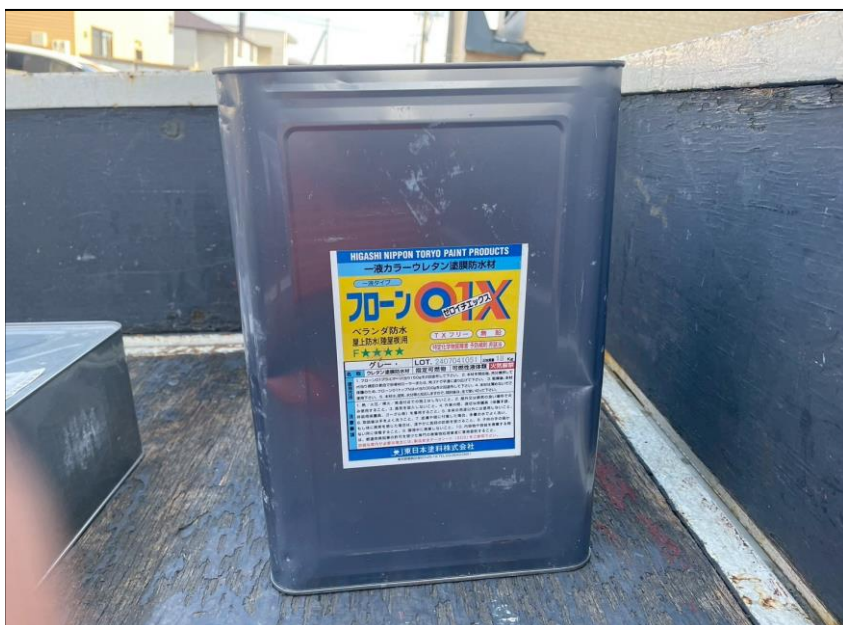

年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	スノーダクト
使用材料	フローン01X
工事内容	材料搬入
備考	ウレタン防水材料



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	スノーダクト
使用材料	フロン01X
工事内容	防水材塗布
備考	スノーダクトの亀裂箇所にウレタン防水材を塗布しました。



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	スノーダクト
使用材料	弾性トップ
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	ホームタンク
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	錆止め塗装 (補修塗り)
備考	



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 4. 17～4. 28
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了
