




年月日	2025. 5. 13
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2025. 5. 13
工事部位	屋根
使用材料	
工事内容	施工前
備考	

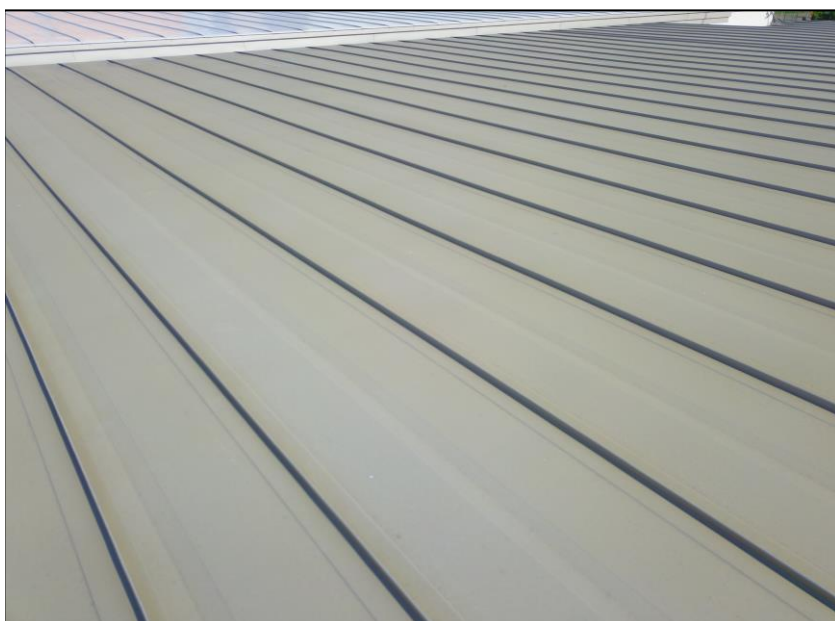


年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	全体
使用材料	くさび足場
工事内容	足場設置完了
備考	



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄。



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	破風
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を洗浄。

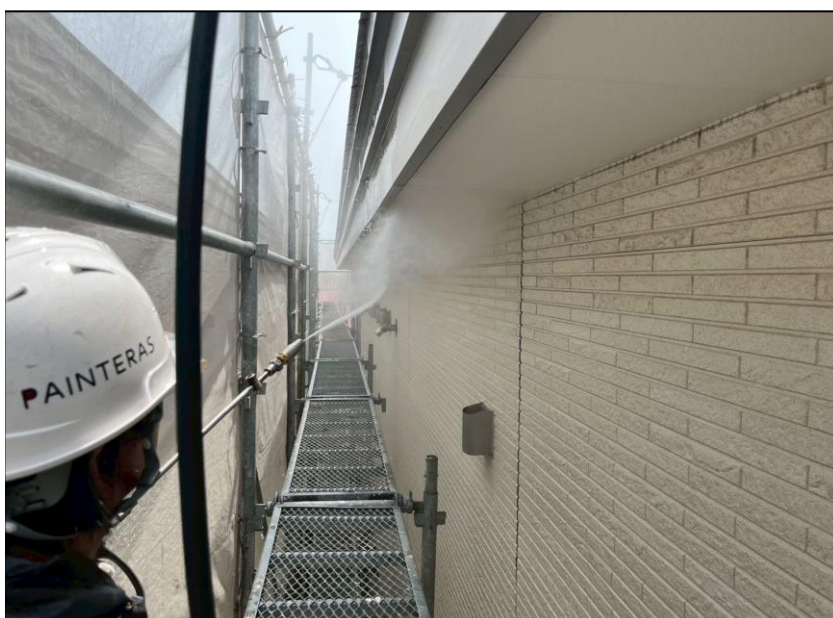

年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	軒天
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を洗浄。



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を洗浄。



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	土間
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	汚れなどを洗浄



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	ホームタンク ガスタンク
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、藻などの不純物を洗浄



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	屋根
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施すると共に錆落とし作業



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	破風
使用材料	マジックロン(研磨材)
工事内容	下地調整(ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	ガスタンク
使用材料	マジックロン(研磨材) ディスクペーパーサンダー
工事内容	下地調整(ケレン)
備考	ポイント① 段取りに時間を使いますが、錆を確実に落とす様にするため、錆びている箇所については、必ず電動工具を使用してケレンするよう指示しております。



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	ホームタンク
使用材料	マジックロン(研磨材)
工事内容	下地調整(ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去
備考	



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去
備考	撤去完了



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	2液形ウレタン樹脂コーキング
工事内容	材料搬入
備考	6L×6缶 プライマー＝2缶 搬入




年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗布
備考	ポイント② コーキングはプライマーを塗らないと外壁と密着しません。塗装の仕上がりに関係ない作業ですが、塗りが浅いと早期破断に繋がる為、確実に塗り込むように指導しております。



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了

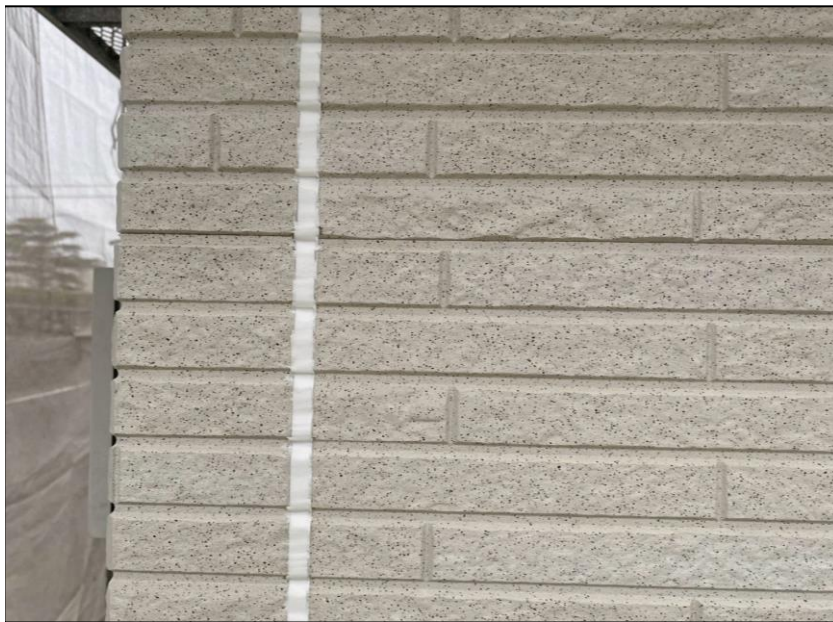


年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了




年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	屋根、破風、物置
使用材料	ハイボン20デクロW 色番: グレー
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料

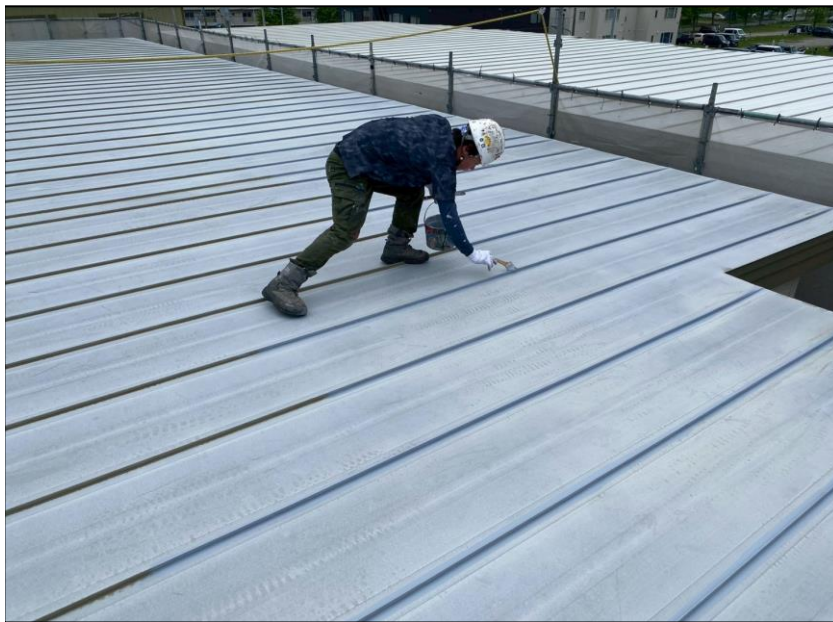

年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	屋根
使用材料	ハイボン20デクロW
工事内容	下塗り(錆止め塗装)
備考	ポイント③ 1番錆びる箇所『板金面の折り返し溝の中』もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。この作業は時間がかかる為に施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、弊社ではしっかりと奥まで塗りこむように指導しております。



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	屋根
使用材料	ハイボン20デクロW
工事内容	下塗り(錆止め塗装)
備考	

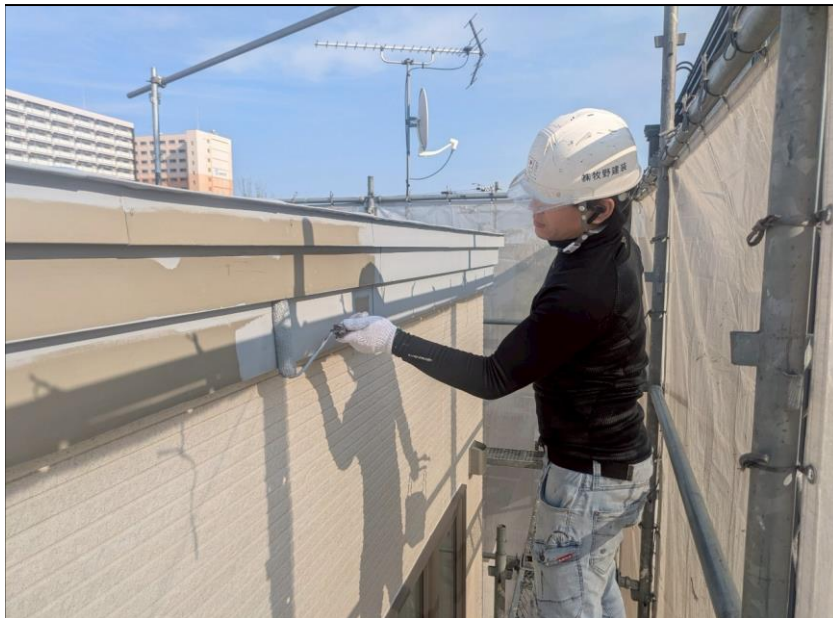

年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	破風
使用材料	ハイポン20デクロW
工事内容	下塗り(錆止め塗装)
備考	



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20デクロW
工事内容	下塗り(錆止め塗装)
備考	完了




年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20デクロW
工事内容	下塗り(錆止め塗装)
備考	完了



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	屋根、破風
使用材料	ファインルーフSI 色番:マウンテングレー
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×2セット 追加=1セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂トタン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用により、優れた耐候性及び耐久性を発揮します。



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り
備考	ポイント④ 下塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中もしっかりと中塗り塗料を塗りこみました。

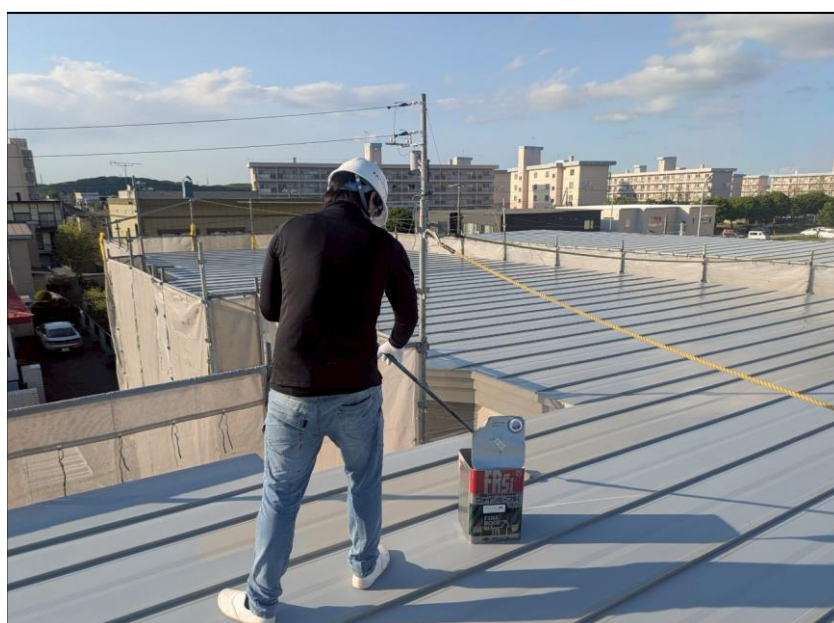


年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り
備考	



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り
備考	



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り
備考	完了

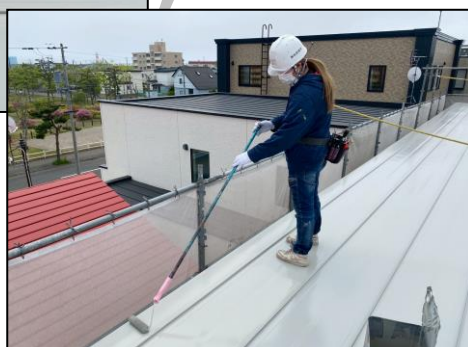

年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	ポイント⑤ 下塗り、中塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中もしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトSiクリアー
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×2セット
備考	セラミック系外壁保護クリヤー 高耐光性、紫外線吸収、超低汚染、防カビ性に優れているクリアー塗料材です。




年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトSiクリアー
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトSiクリアー
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	2液形編成シリコン樹脂コーキング NS2570typeNB
工事内容	材料搬入
備考	4L×10缶 プライマー=5缶 搬入

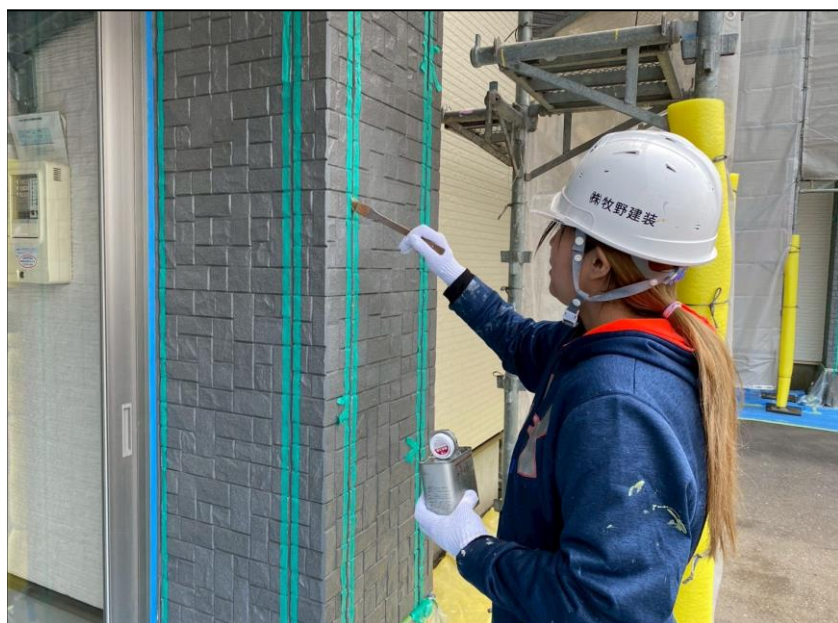


年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗り
備考	



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	NS2570typeNB
工事内容	コーキング材 充填
備考	



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	NS2570typeNB
工事内容	コーキング材 へら押え(仕上げ)
備考	完了

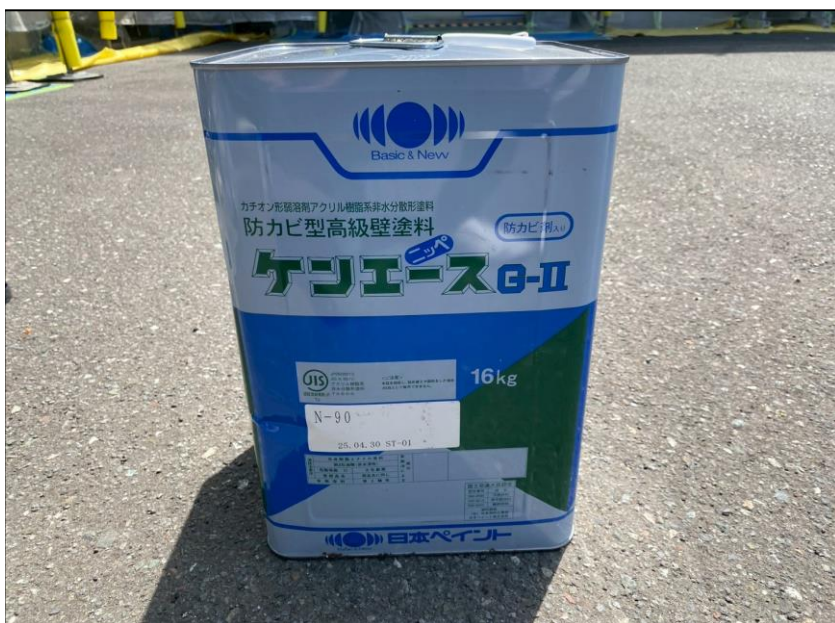

年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	水性ハイブリッドシーラー
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×2セット
備考	水性ハイブリッドシーラーは、様々な高耐久性の既存有機塗膜や前述のサイディング等、広範囲に適用できる特殊エポキシ樹脂シーラーです。



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	水性ハイブリッドシーラー
工事内容	下塗り
備考	

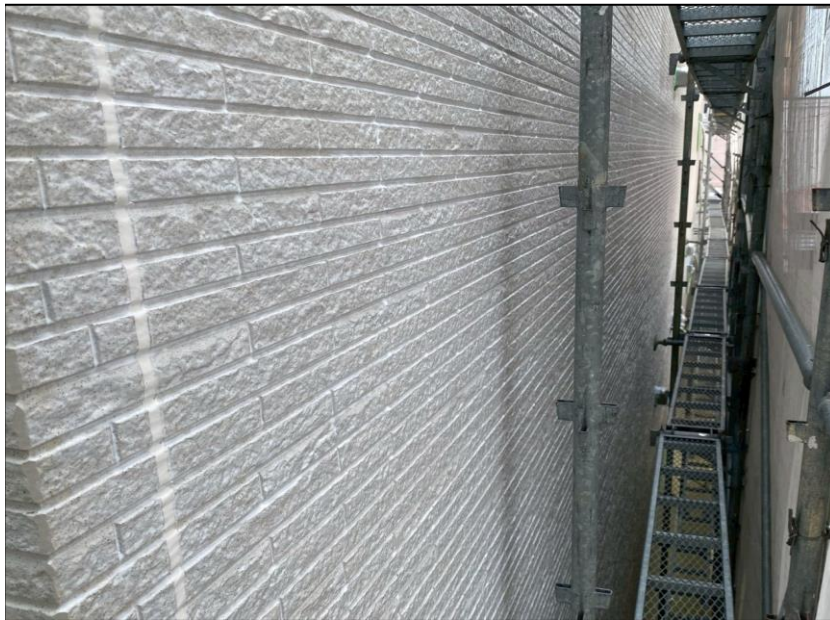

年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	水性ハイブリッドシーラー
工事内容	下塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番:25-85B(3分つや)
工事内容	材料搬入 16キ _ロ ×5缶 追加=3缶
備考	超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 強靱な塗膜は、超耐久性、超耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアムシリコン
工事内容	中塗り
備考	



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	エスケーププレミアムシリコン
工事内容	中塗り
備考	



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	エスケーププレミアムシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	エスケーププレミアムシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアムシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアムシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー
工事内容	清掃
備考	



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー
工事内容	清掃
備考	



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	ガスタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 13～6. 6
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 6. 6
工事部位	屋根
使用材料	ファイバールーフSi
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 6. 6
工事部位	屋根
使用材料	ファイバールーフSi
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 6. 6
工事部位	屋根
使用材料	ファイバールーフSi
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 6. 6
工事部位	レインボーハウスメロディⅡ
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了




年月日	2025. 6. 6
工事部位	レインボーハウスメロディⅡ
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2025. 6. 6
工事部位	レインボーハウスメロディⅡ
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



Before



After-



PAINTERAS

株式会社牧野建装
