



年月日	2025. 5. 20
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2025. 5. 23
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	仮設足場設置
備考	完了



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、藻や苔などの不純物を洗浄



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	窓
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや汚れなどを洗浄




年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	基礎
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	藻や苔などの不純物を洗浄



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	土間
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	汚れや泥などの不純物を洗 浄



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷 をつけて塗装下地の足付け 作業の実施 錆びていた箇所について は、電動工具を使用いたし ました。

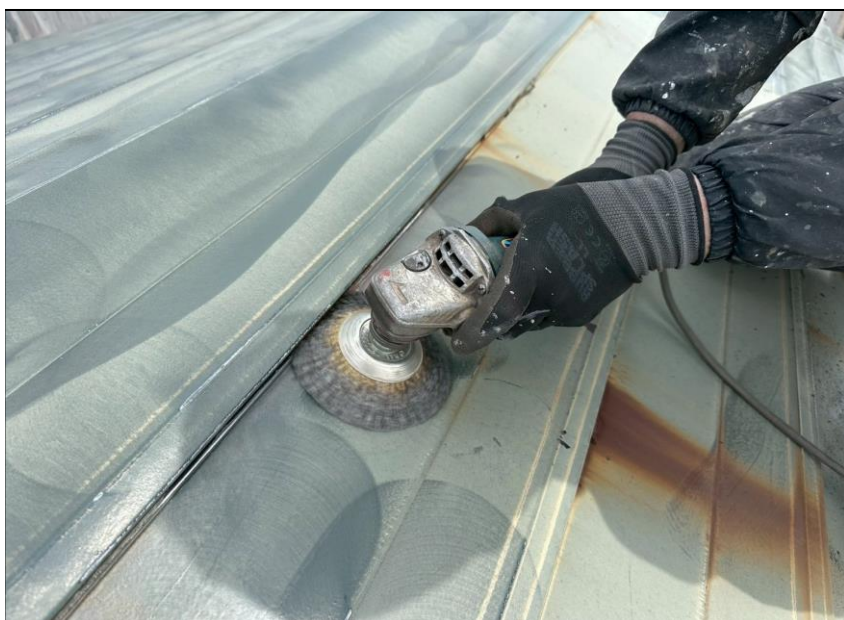


年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	電動工具を使用して確実な 錆び落としの実施



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	破風
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ガードセプター101P
工事内容	材料搬入 1kg × 1缶
備考	錆の奥深くまで浸透し、錆の 内部から固めてしまう防錆 塗料 錆の発生を遅らせることがで きます。

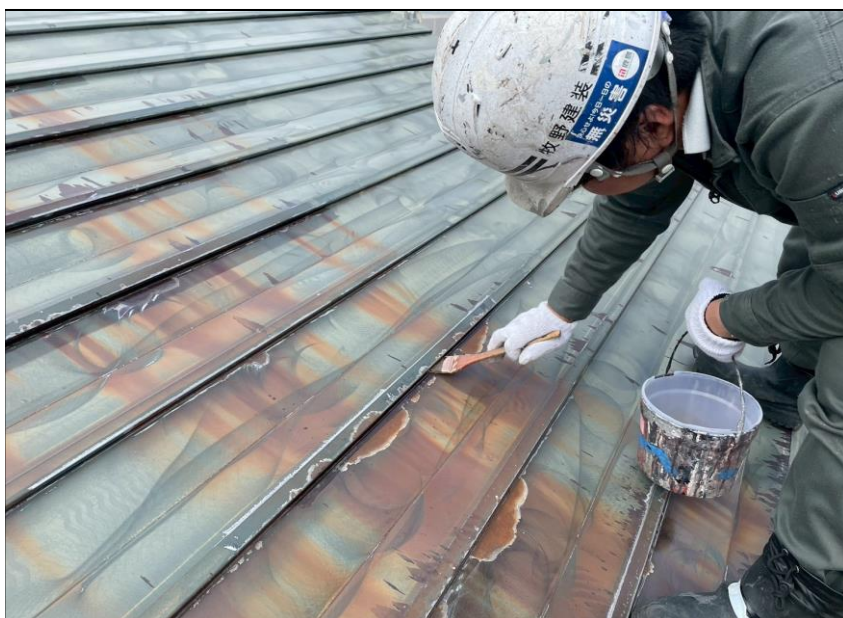


年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ガードセプター101P
工事内容	防錆処理
備考	錆びている箇所に塗布



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ガードセプター101P
工事内容	防錆処理
備考	屋根の溝の中も確実に塗り込みます



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	材料搬入 16 ^{キロ} ×1缶
備考	1液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料

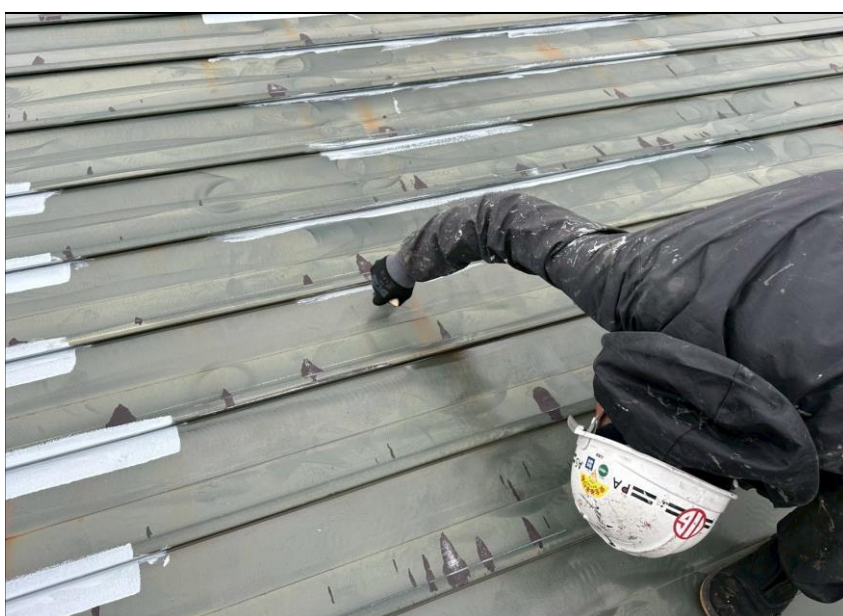

年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆箇所補修塗り)
備考	ガードセプター101Pを塗った錆びている箇所に増し塗りします



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆箇所補修塗り)
備考	完了




年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆箇所補修塗り)
備考	完了



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根、破風
使用材料	ハイボンファインプライマーII
工事内容	材料搬入 16 ^{キロ} ×1セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為に施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。

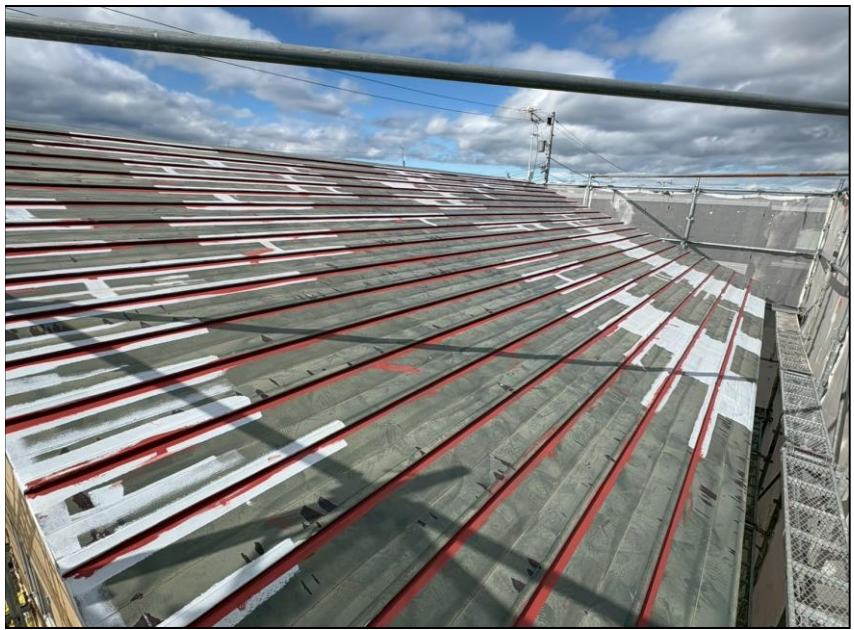

年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	屋根の折り込み溝の中の 先行塗り完了



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	破風
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	1層目塗り



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	破風
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	2層目塗り



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	錆びている箇所は、この時点で3回塗りになっております



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	破風
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	錆止めを2回塗りしております




年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI 色番:ノアール
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×3セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂ト タン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用に より、優れた耐候性及び耐 久性を発揮します。




年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	サビ止め作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと中塗り塗料を塗りこみました。



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	先行塗り完了

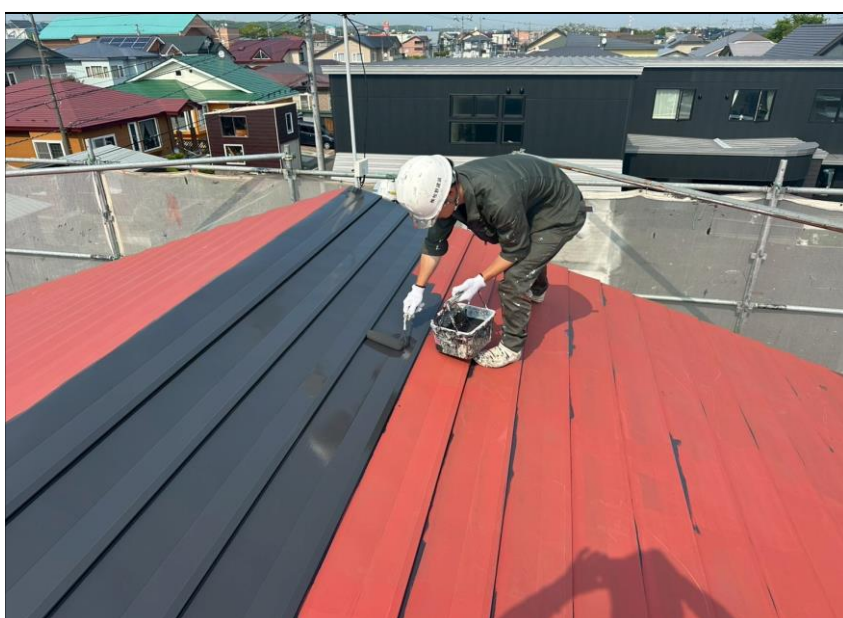

年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	

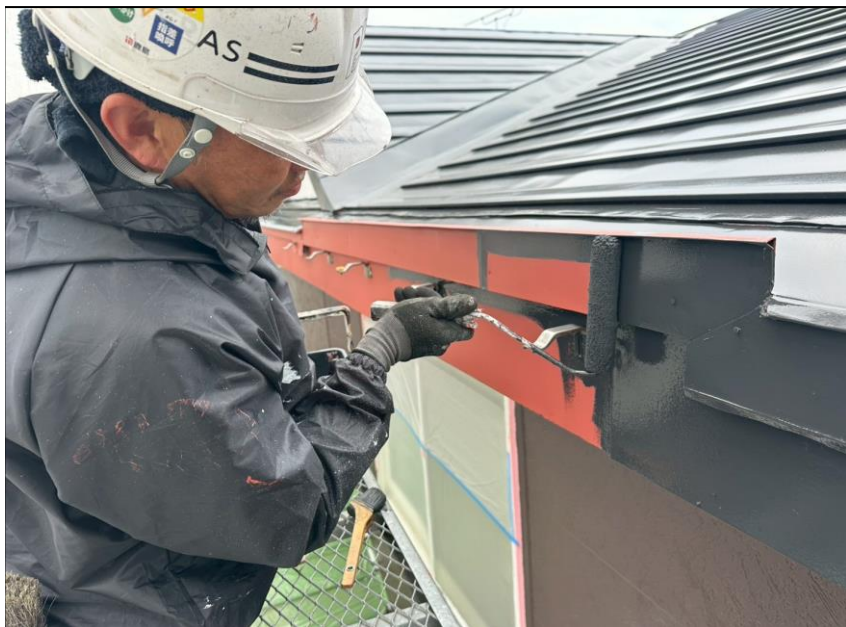

年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	完了



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	完了



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	中塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと上塗り塗料を塗りこみ



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	2液形ウレタン樹脂コーキング
工事内容	材料搬入
備考	6L×2缶 プライマー=1缶 搬入



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗布
備考	コーキングはプライマーを塗らないと外壁と密着しません。塗装の仕上がりに関係ない作業ですが、塗りが浅いと早期破断に繋がる為、確実に塗り込むように指導しております。



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了




年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	ファインプライマー II
工事内容	材料搬入 16 ^キ ×2セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料




年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	ファインプライマー II
工事内容	下塗り
備考	

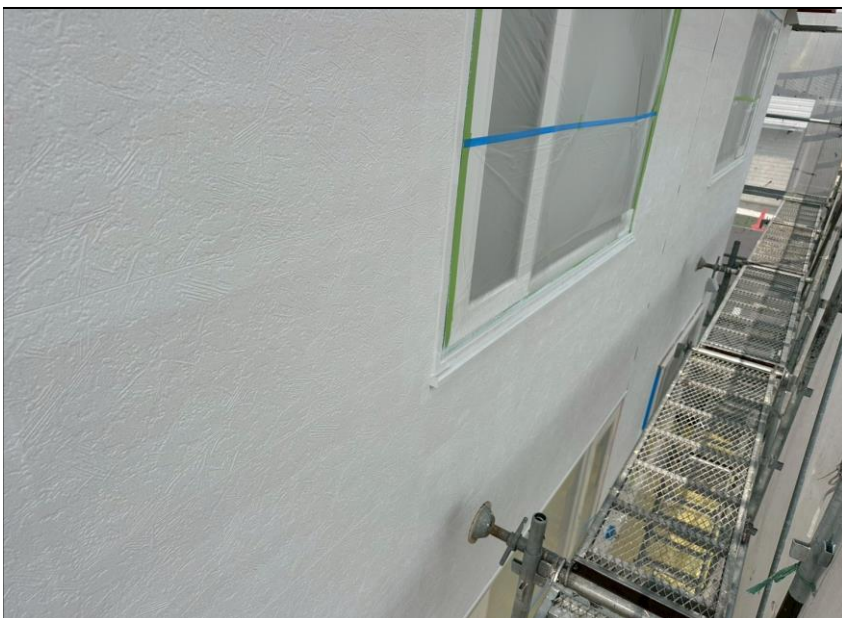

年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	ファインプライマー II
工事内容	下塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料

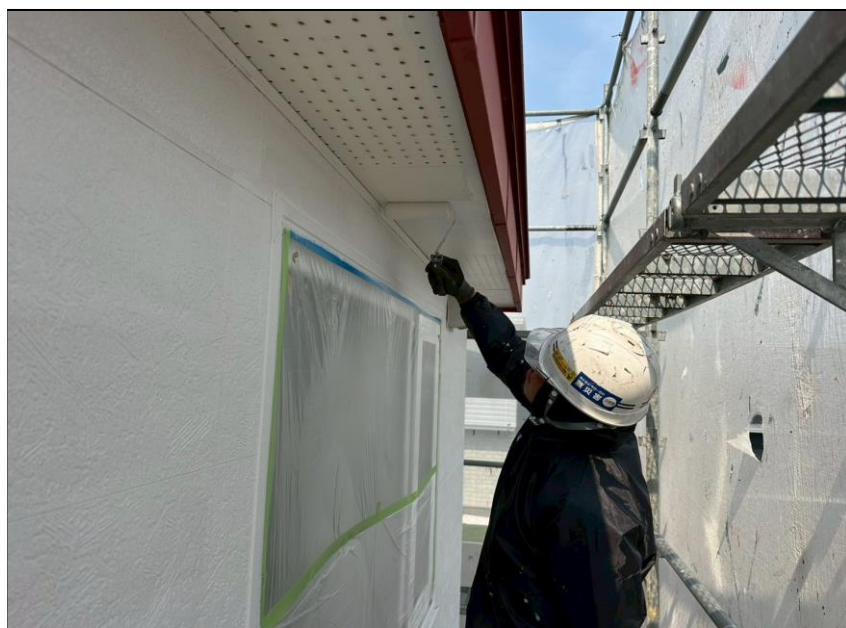

年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番:15-30B(5分つや)
工事内容	材料搬入 16キロ×2セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD 型ポリウレタン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現 し、耐候性1種に相当する性 能を持つ塗料



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番:22-90C(5分つや)
工事内容	材料搬入 4キロ×1セット
備考	同上



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	色番:15-30B



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	色番:15-30B



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	色番:22-90C



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	色番:15-30B



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	色番:22-90C




年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁換気フード
使用材料	
工事内容	交換前
備考	



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁換気フード
使用材料	
工事内容	交換完了
備考	



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了

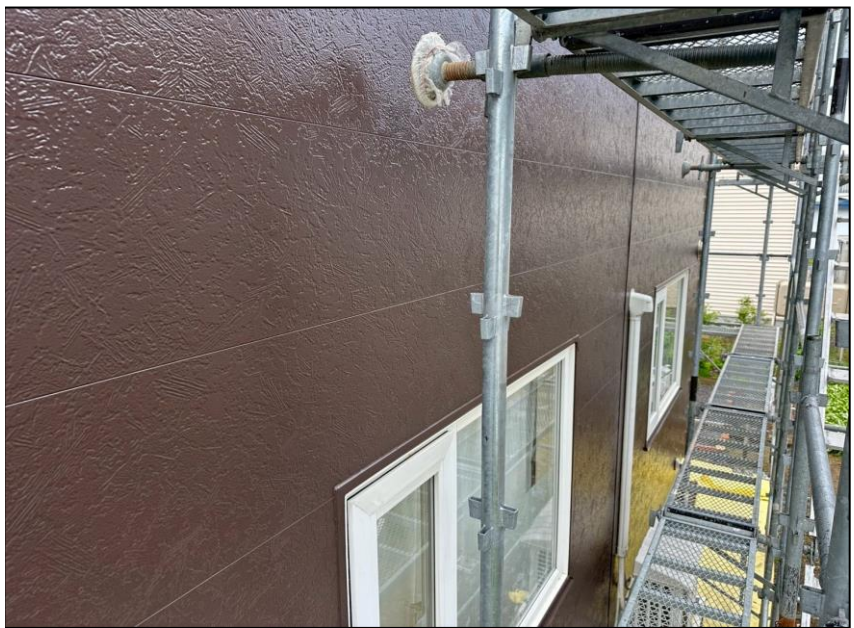

年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	土間
使用材料	ディスクサンダーペーパー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	基礎
使用材料	水性シリコン浸透ガード
工事内容	材料搬入 16 ^キ □×1缶
備考	遮水効果および超薄膜化により、ふくれ、はがれの心配が無く、吸水防止効果に優れています。また坊藻、防カビ力があります。



年月日	2025. 6. 7
工事部位	土間
使用材料	クリーンカラーAベスト
工事内容	材料搬入 16 ^キ □×1缶
備考	床にも塗れる密着に優れた床用つや消し塗料



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	基礎
使用材料	水性シリコン浸透ガード
工事内容	下塗り・上塗り
備考	



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	土間
使用材料	クリーンカラーAベスト
工事内容	下塗り・上塗り
備考	



年月日	2025. 6. 7
工事部位	基礎
使用材料	水性シリコン浸透ガード
工事内容	下塗り・上塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	土間
使用材料	クリーンカラーAベスト
工事内容	下塗り・上塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 6. 7
工事部位	ガスメーター配管
使用材料	アルミニウムペイント
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 23～6. 12
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装完了
備考	




年月日	2025. 6. 12
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	仮設足場撤去
備考	完了



年月日	2025. 6. 12
工事部位	
使用材料	
工事内容	塗装工事完了
備考	PAINTERAS (株)牧野建装



Before



After-



PAINTERAS
株式会社牧野建装
