



年月日	2025. 5. 7
工事部位	倉庫C棟
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2025. 5. 7
工事部位	倉庫C棟
使用材料	
工事内容	施工前
備考	




年月日	2025. 5. 7
工事部位	倉庫C棟
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を高圧水洗浄



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	小屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上

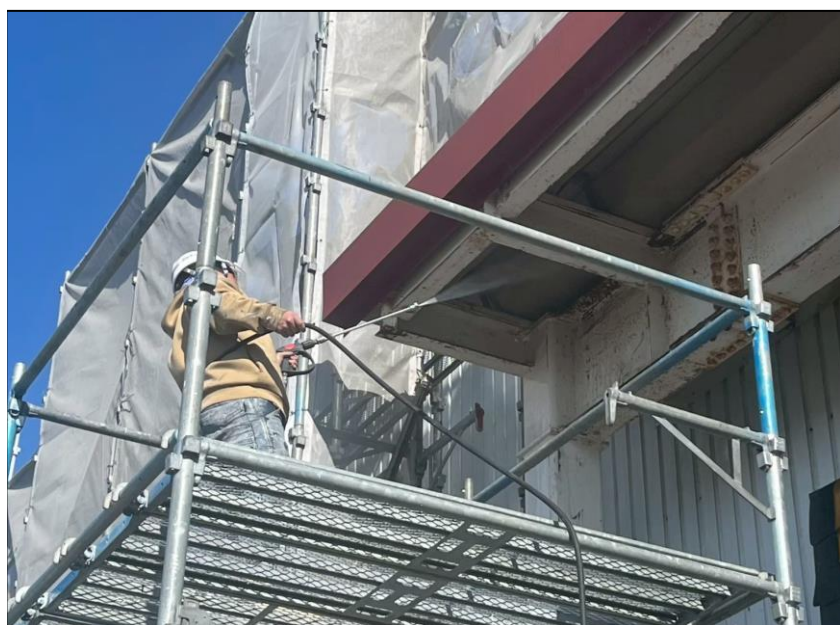


年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	ひさし下鉄骨
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を高圧水洗浄




年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	ひさし下
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を 高圧水洗浄



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上

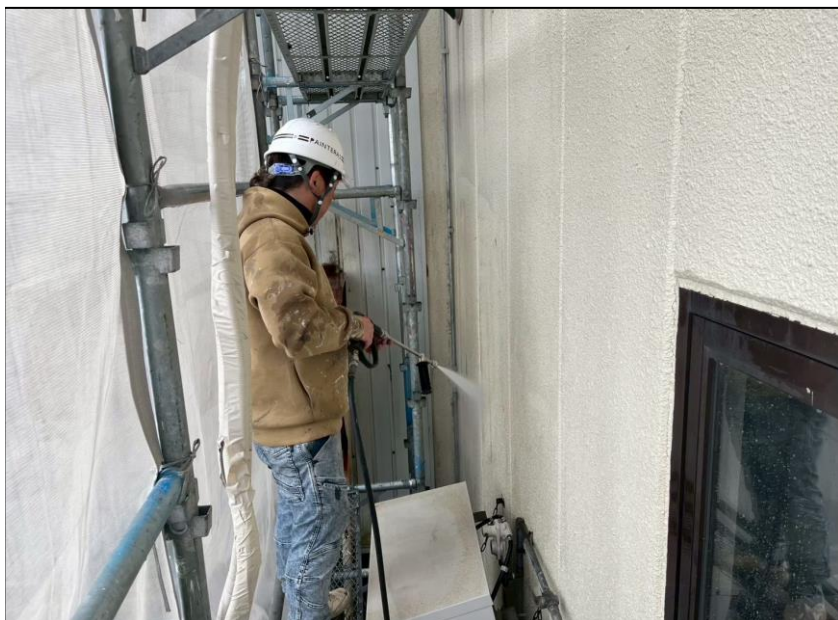

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(事務所)
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上

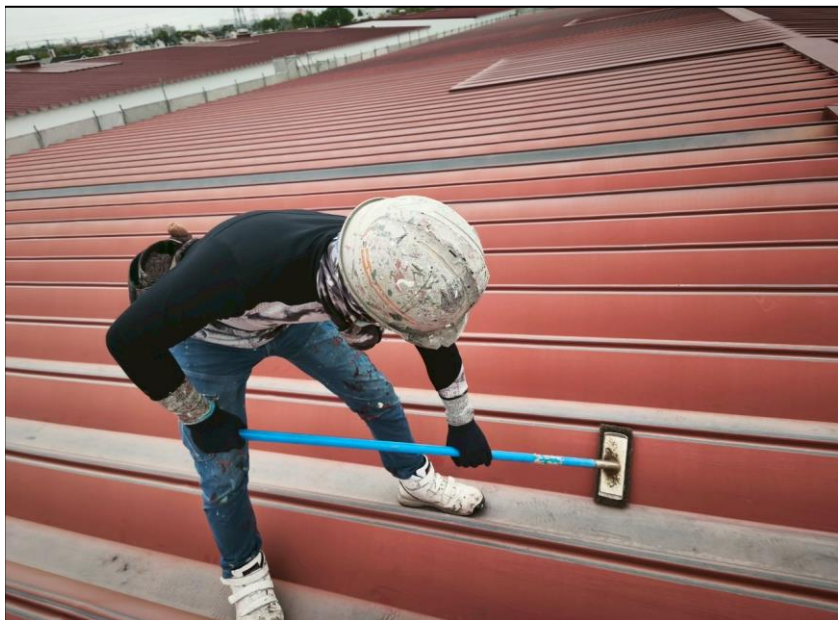

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすとともに高圧水洗 浄で落とせなかった不純物 を除去し、細かい傷をつけて 塗装下地の足付け作業の実 施



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	同上



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	小屋根
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	同上



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根、破風
使用材料	ハイポンプライマーⅡ 色:ブラウン色
工事内容	材料搬入 16 ^キ ×30セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根、破風
使用材料	ハイポンプライマーⅡ 色:ブラウン色
工事内容	材料搬入 16 ^キ ×15セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料




年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンプライマーⅡ
工事内容	先行塗り
備考	ローラーで塗れない箇所を刷毛で先行塗り



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	先行塗り

備考


ローラーで塗れない箇所を
刷毛で先行塗り

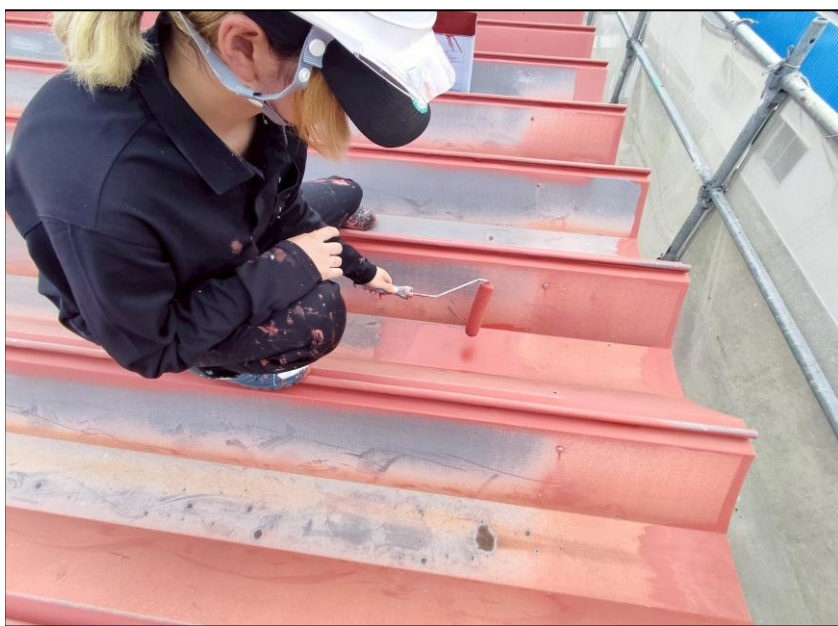

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	補修塗り

備考


錆びていた箇所もタッチアップ
塗装を行い、塗膜の膜厚
確保

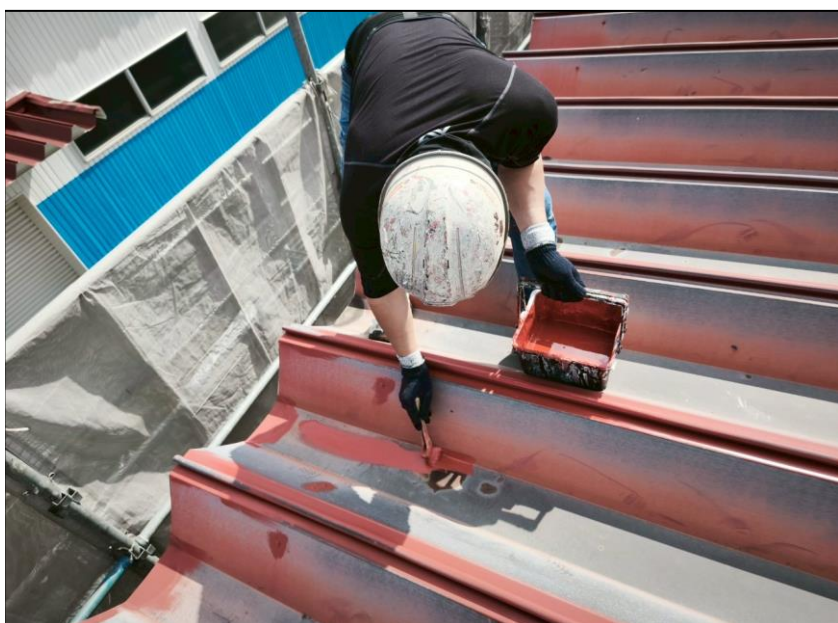


年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	補修塗り

備考

同上

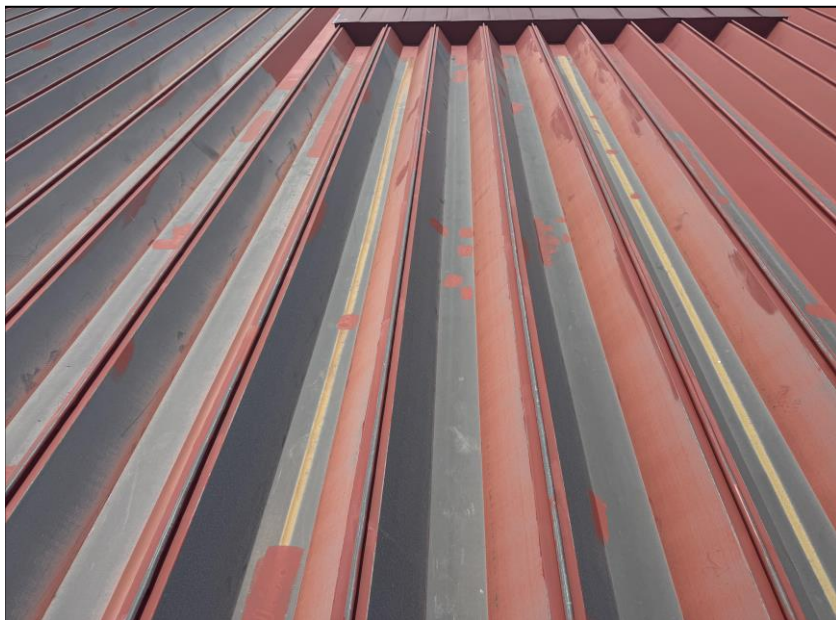


年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	先行塗り 補修塗り
備考	完了

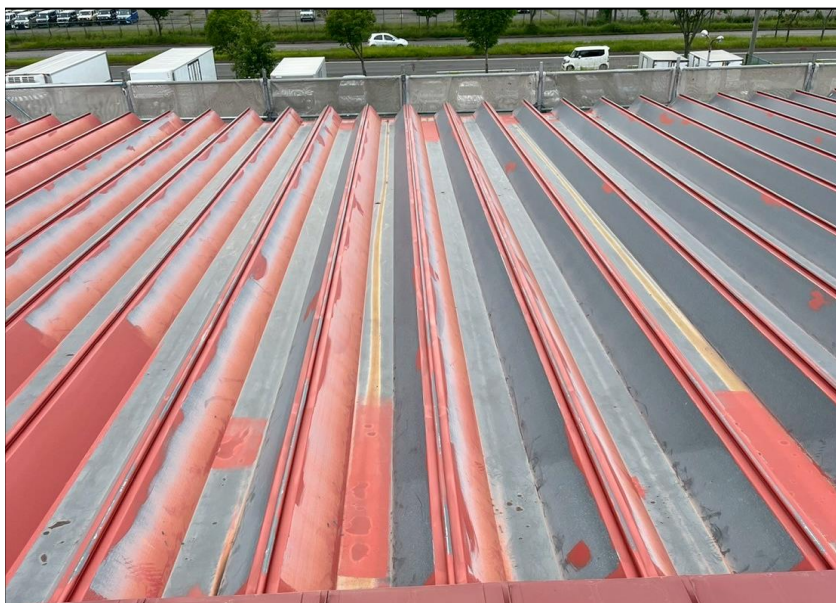

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	先行塗り 補修塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	

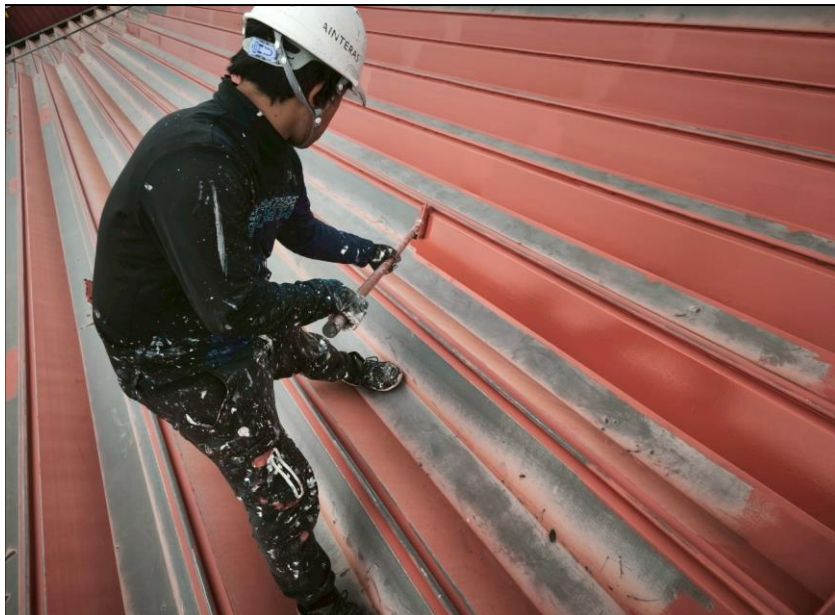

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了




年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根、破風
使用材料	ファインルーフSI 色番:サニーレッド
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×30セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂ト タン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用に より、優れた耐候性及び耐 久性を発揮します。




年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	先行塗り
備考	




年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	先行塗り
備考	

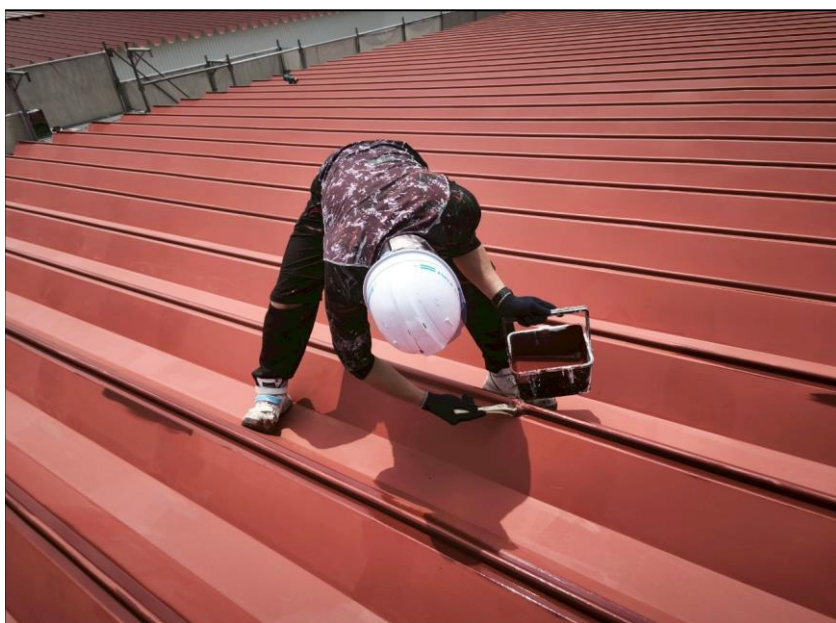


年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	先行塗り
備考	

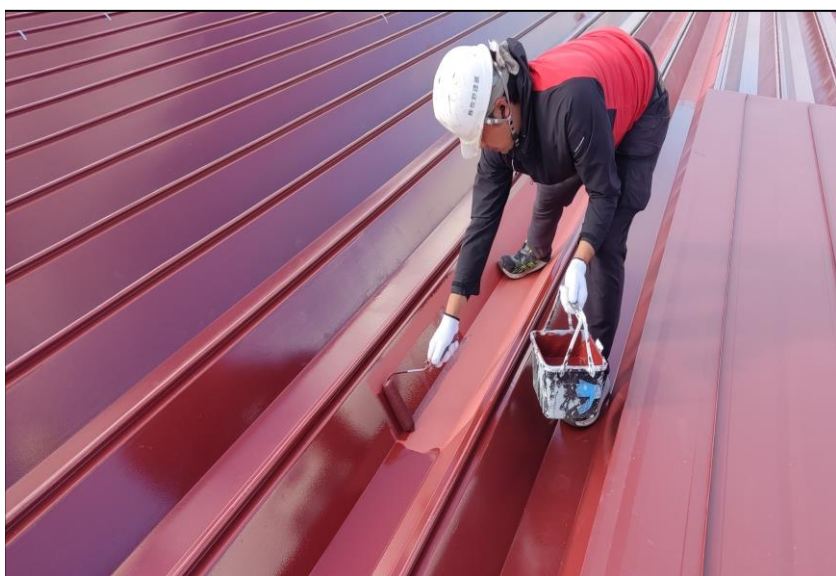


年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	

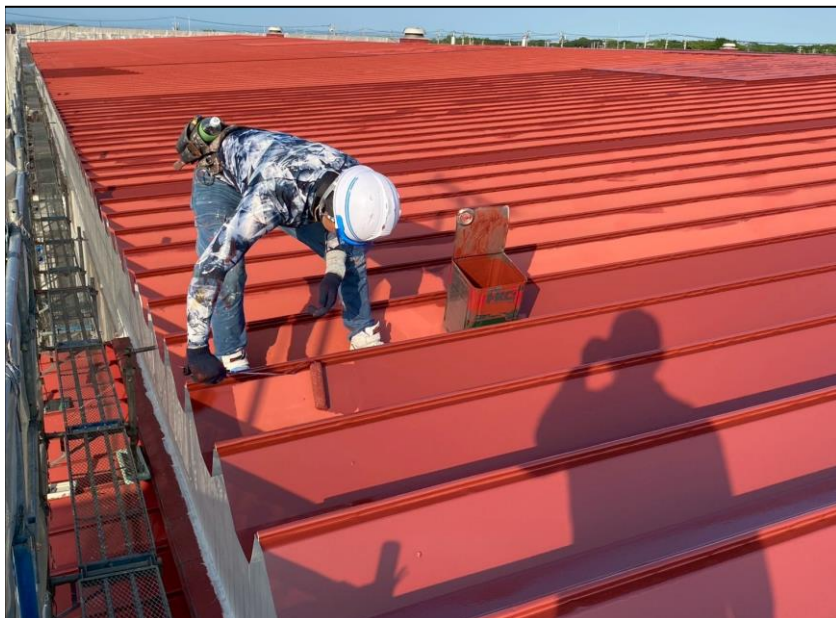

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	

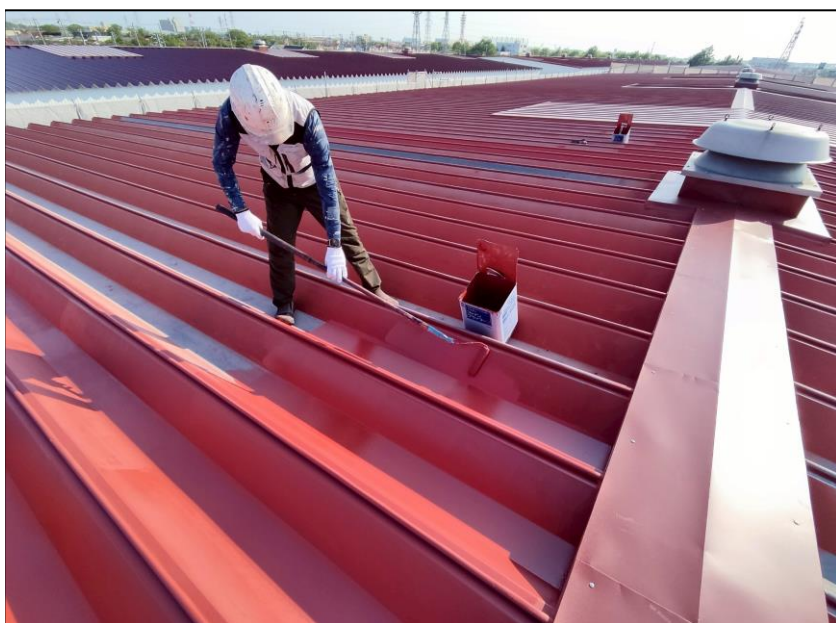


年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	

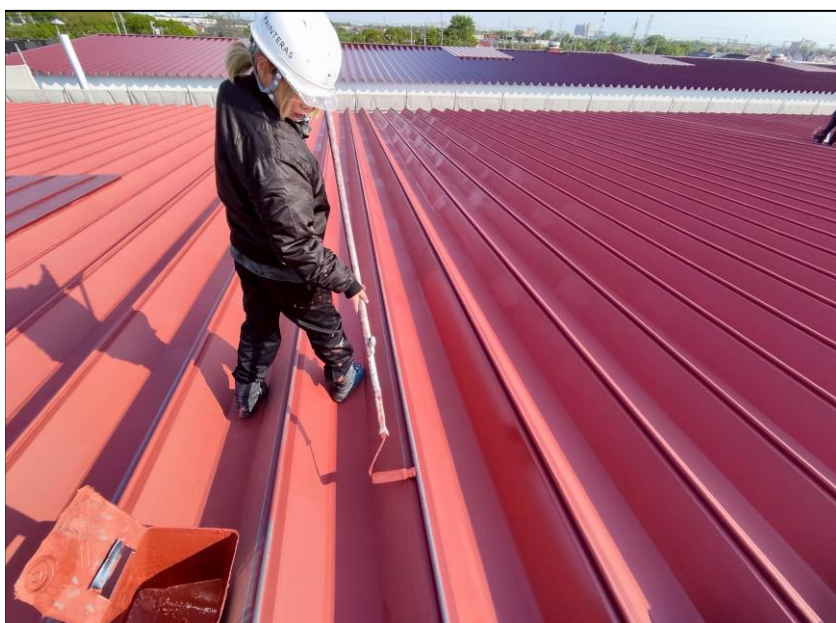

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了

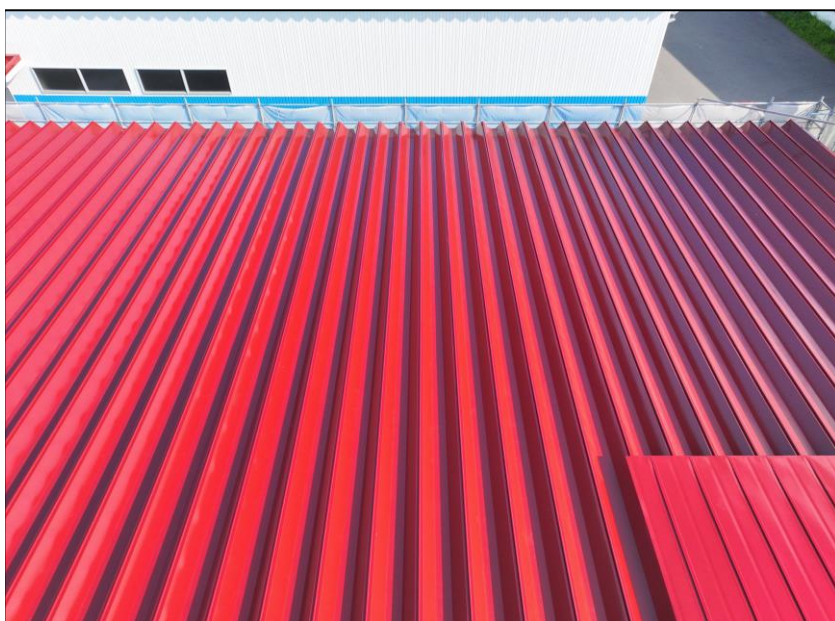

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	電動カップワイヤーブラシ
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施 錆びていた箇所については、電動工具を使用いたしました。



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	電動カップワイヤーブラシ
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	同上

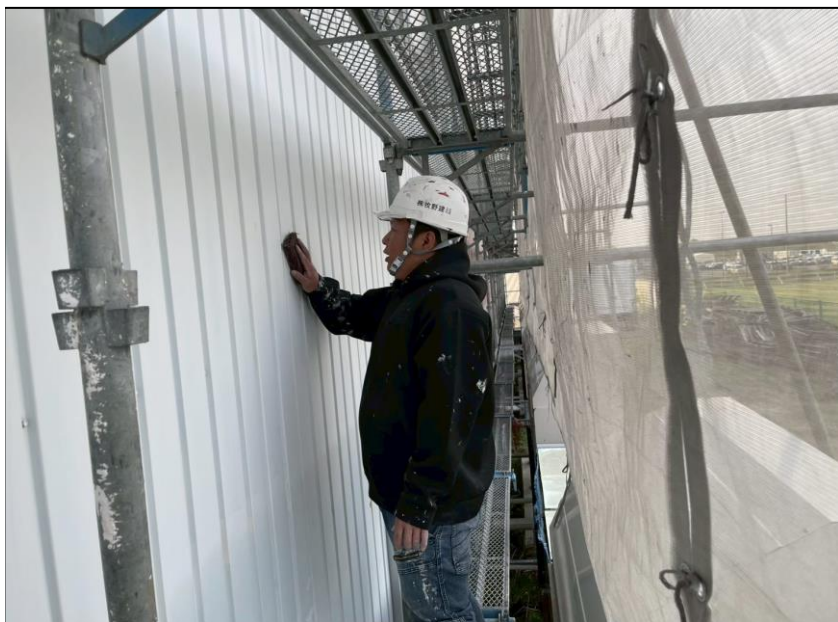

年月日	2024. 9. 28～11. 13
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施




年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	ひさし下鉄骨
使用材料	電動サンドペーパー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施 錆びていた箇所については、電動工具を使用いたしました。



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(事務所)
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	電動カップワイヤーブラシ
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	完了

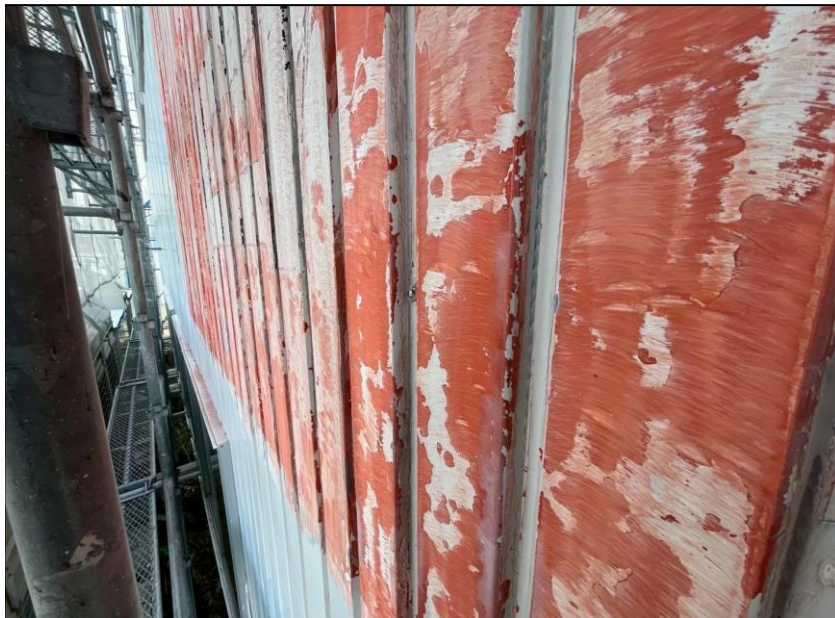

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	電動カップワイヤーブラシ
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	ひさし下鉄骨
使用材料	電動サンドペーパー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	オーバースライダー
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁
使用材料	2液形ウレタン樹脂コーキング
工事内容	材料搬入
備考	6L×20セット プライマー＝8缶 搬入




年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(事務所)
使用材料	マスキングテープ
工事内容	コーキング養生
備考	完了




年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	事務所柱
使用材料	マスキングテープ
工事内容	コーキング養生
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗布
備考	

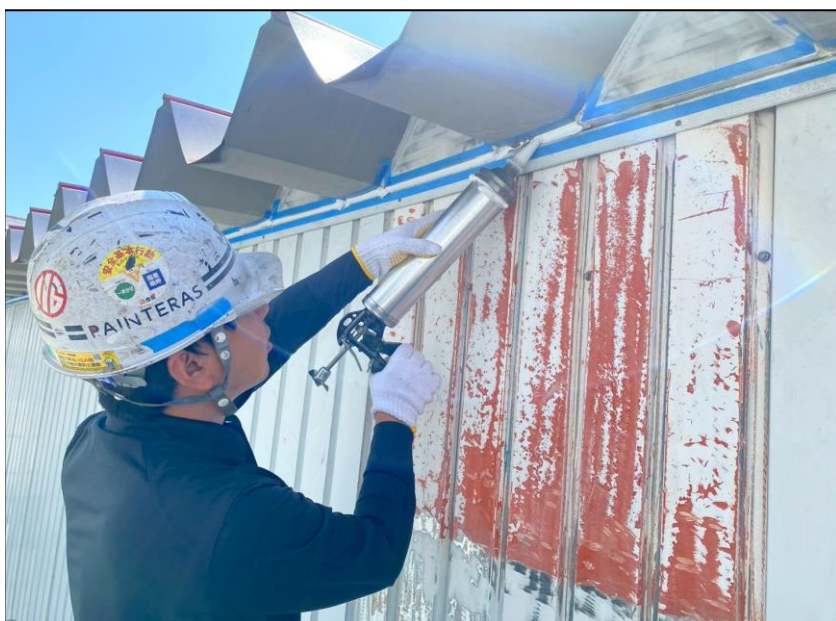

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	

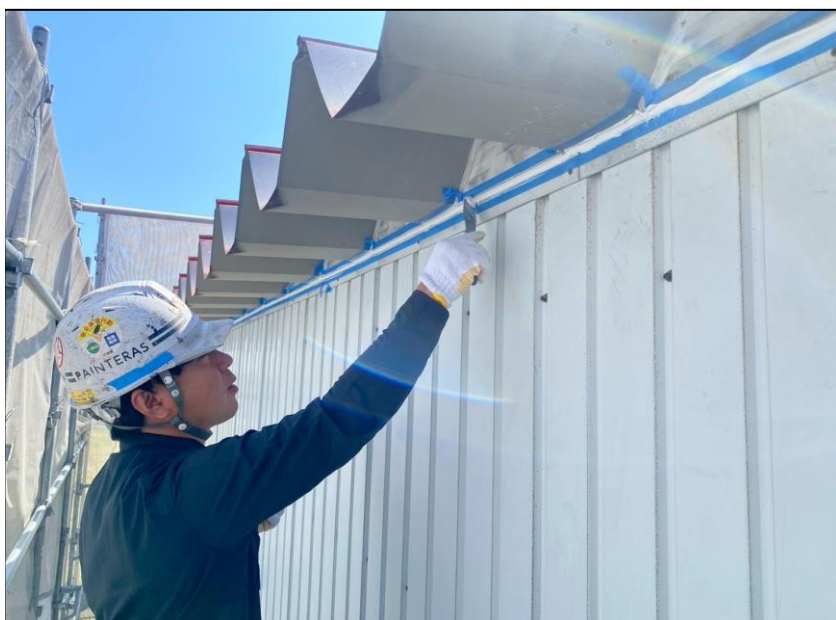


年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(事務所)
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了

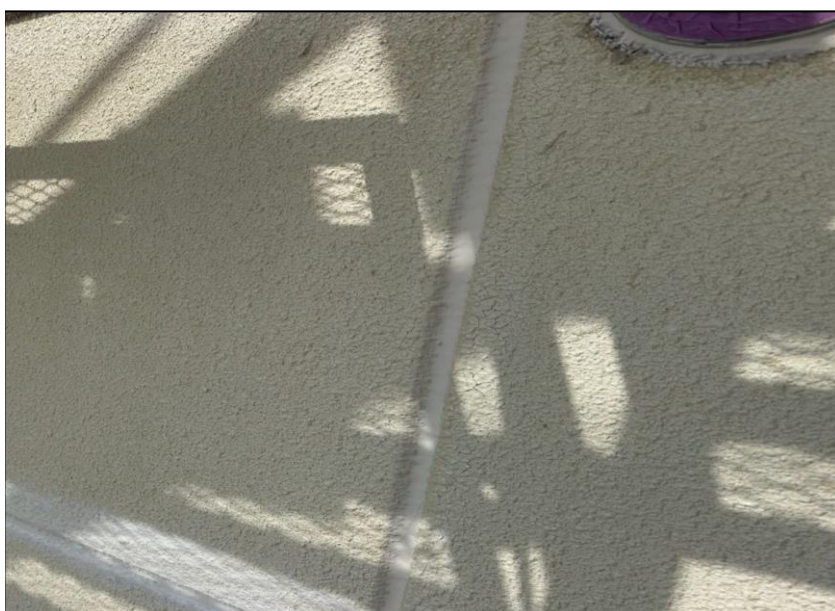

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(事務所)
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁、鉄骨
使用材料	ハイポンプライマーⅡ 色番:ホワイト
工事内容	材料搬入 16 ^キ ×20セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	ハイポンプライマーⅡ
工事内容	さび箇所先行塗り
備考	ボルトが錆びていましたので、ボルトは錆止め2回塗り




年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	ハイポンプライマーⅡ
工事内容	さび箇所先行塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	屋根裏
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	




年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	煙突
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	

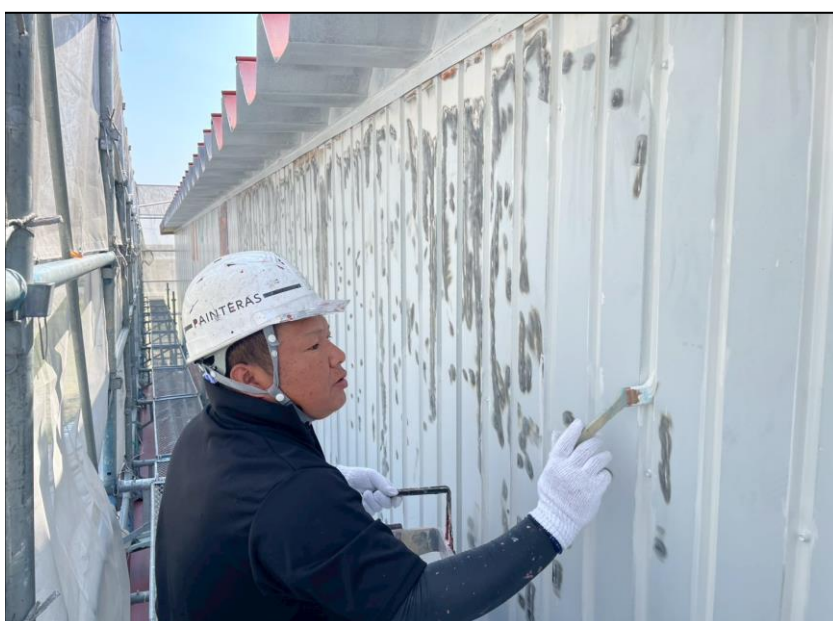

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	

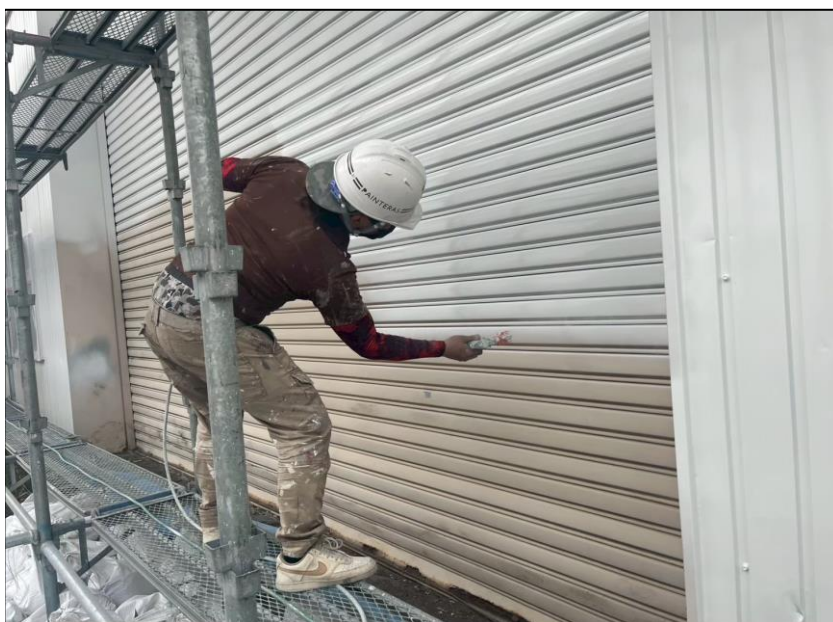


年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	重量シャッター
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	




年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(事務所)
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	煙突
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了

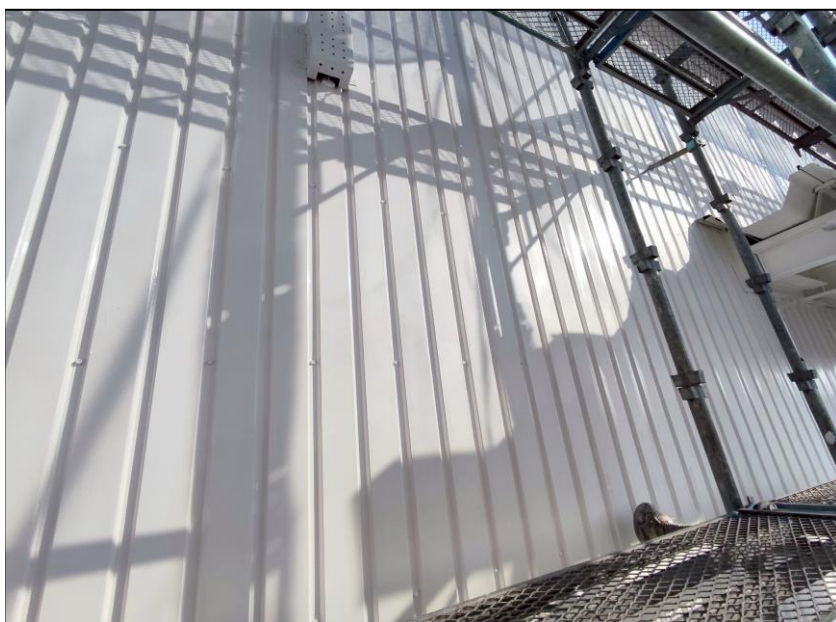

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了

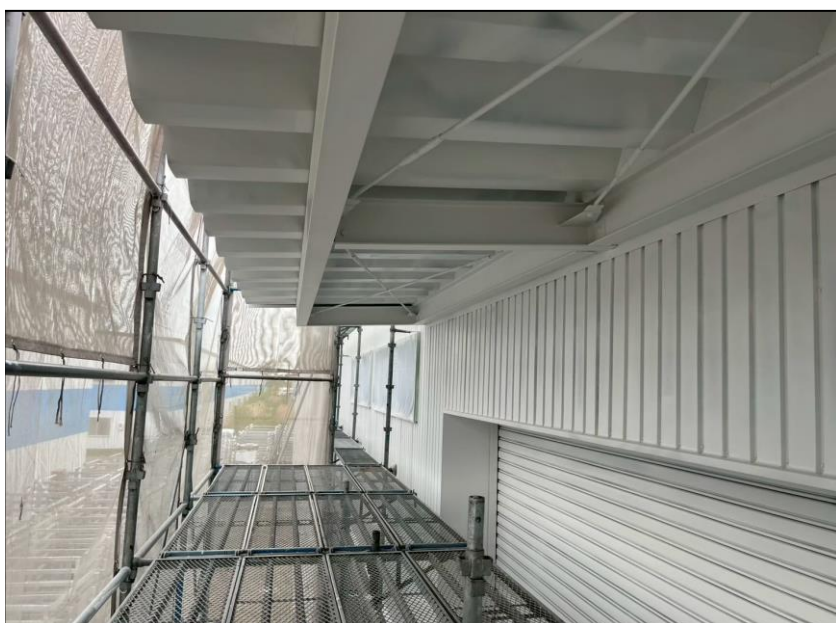

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	ひさし
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	重量シャッター
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁、鉄骨
使用材料	ファインSi 色番:N-90
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×21セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD型 シリコン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現 し、耐候性1種に相当する性 能を持つ塗料



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	ひさし下鉄骨
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	ひさし
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	

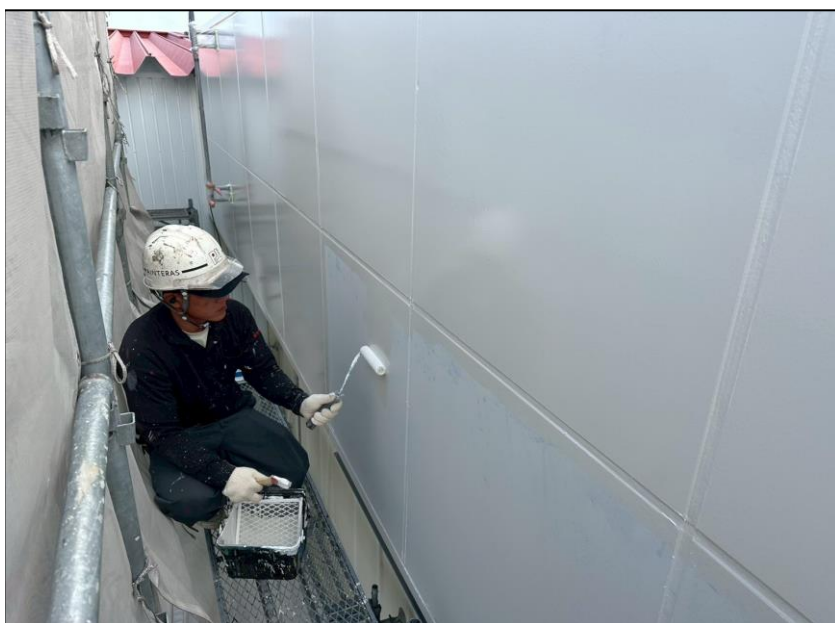


年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(事務所)
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	重量シャッター3方枠
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	ひさし下鉄骨
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	完了

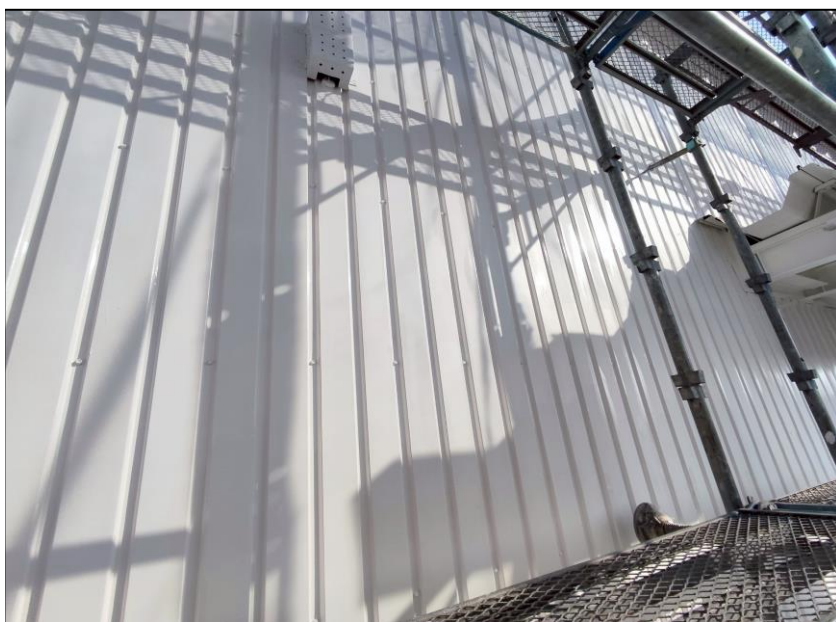

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(事務所)
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	オーバースライダー
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁
使用材料	ファインSi 色番:69-50T
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×3セット 追加プラス2セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD型 シリコン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現し、 耐候性1種に相当する性能を持つ塗料

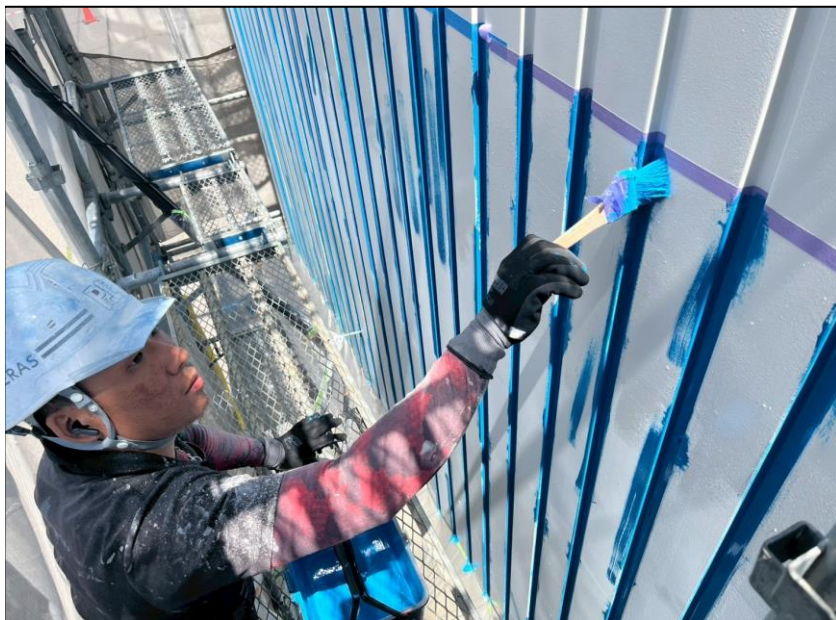

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	ファインSi 色番:69-50T
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	ファインSi 色番:69-50T
工事内容	上塗り
備考	

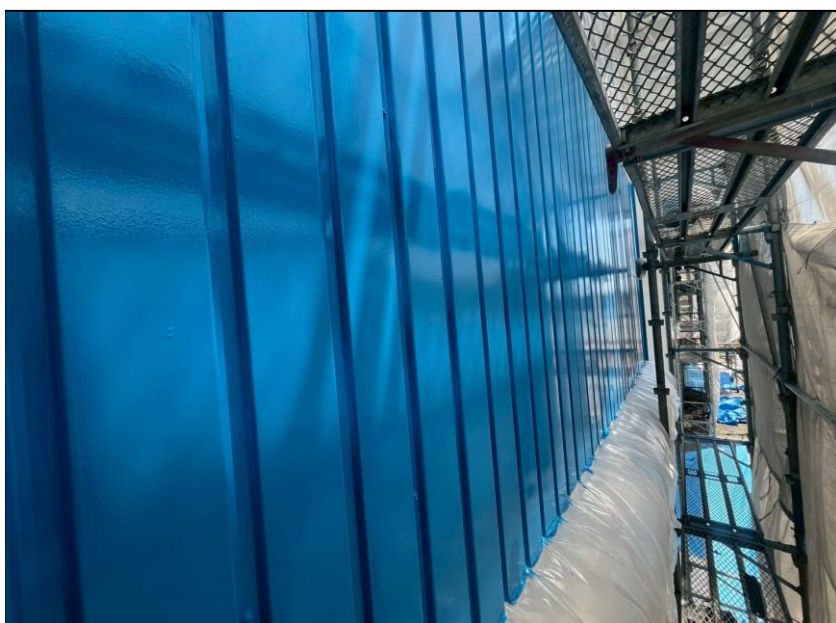

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(倉庫)
使用材料	ファインSi 色番:69-50T
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	ホース格納庫
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了

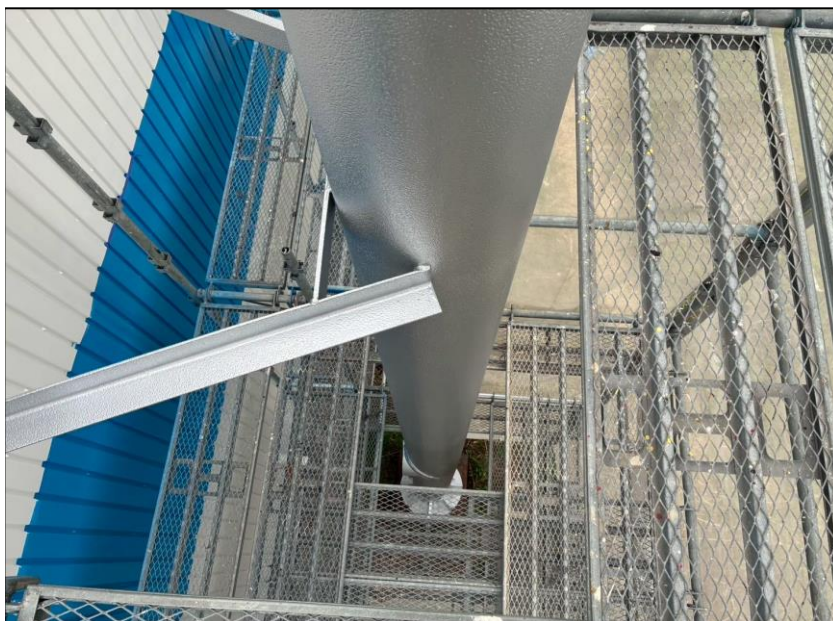

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	ホース格納庫
使用材料	カッティングシート
工事内容	カッティングシート貼り
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	番号版
使用材料	
工事内容	現状
備考	



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(事務所)
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(事務所)
使用材料	ファインSi
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(事務所)
使用材料	耐候性型ステッカー
工事内容	ステッカー貼り
備考	



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(事務所)
使用材料	耐候性型ステッカー
工事内容	ステッカー貼り
備考	完了




年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	外壁(事務所)
使用材料	耐候性型ステッカー
工事内容	ステッカー貼り
備考	完了




年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースG2 色番:ライトグレー
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	

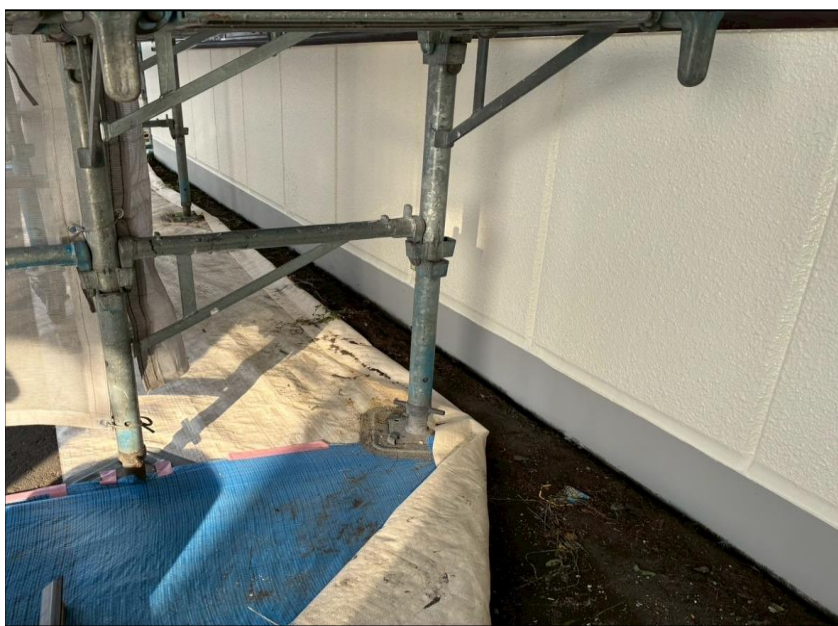

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了

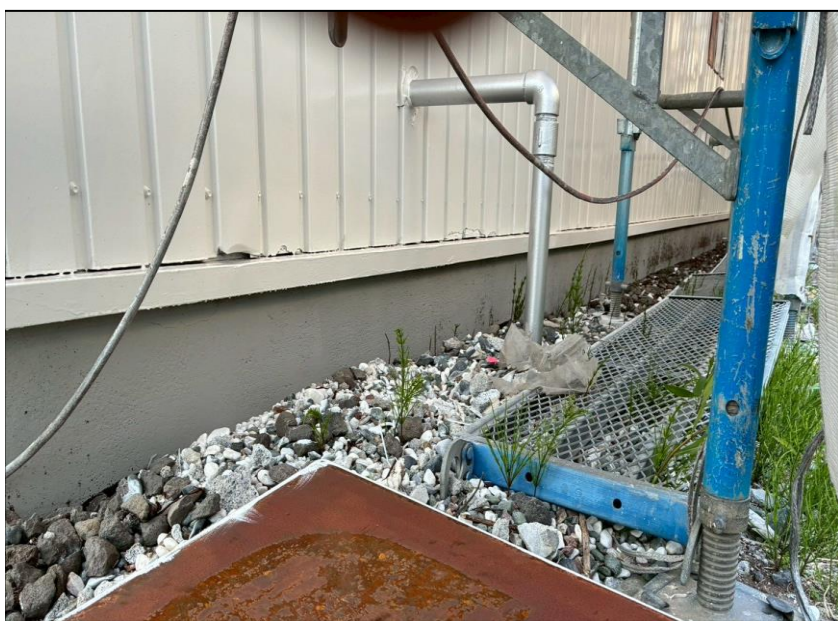


年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	番号版
使用材料	
工事内容	現状
備考	



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	番号版
使用材料	
工事内容	交換前
備考	錆が酷かったのでアルミ複合版で新しく作り変えました。



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	番号版
使用材料	
工事内容	取付
備考	完了

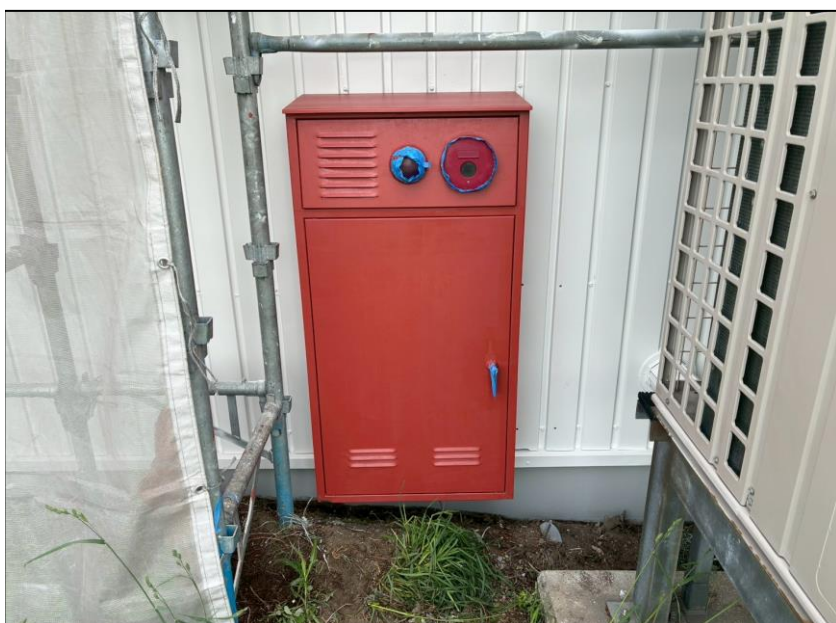

年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	ホース格納庫
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	錆止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	ホース格納庫
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	ホース格納庫
使用材料	カッティングシート
工事内容	カッティングシート貼り
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	消火栓
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	倉庫C棟
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	倉庫C棟
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	倉庫C棟
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	倉庫C棟
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	倉庫C棟
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2025. 5. 7～6. 30
工事部位	倉庫C棟
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	PAINTERAS 株式会社牧野建装

