



年月日	2025. 7. 10
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	仮設足場設置
備考	完了



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	破風
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を洗浄



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	軒天
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリなどの不純物を洗浄



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、藻や苔などの不純物を洗浄



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、藻や苔などの不純物を洗浄



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	バルコニー
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	窓
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの汚れを洗浄



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	基礎
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、藻や苔などの不純物を洗浄




年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	プロパン庫
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	物置
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	屋根
使用材料	インパクトドライバー
工事内容	雪止め撤去
備考	

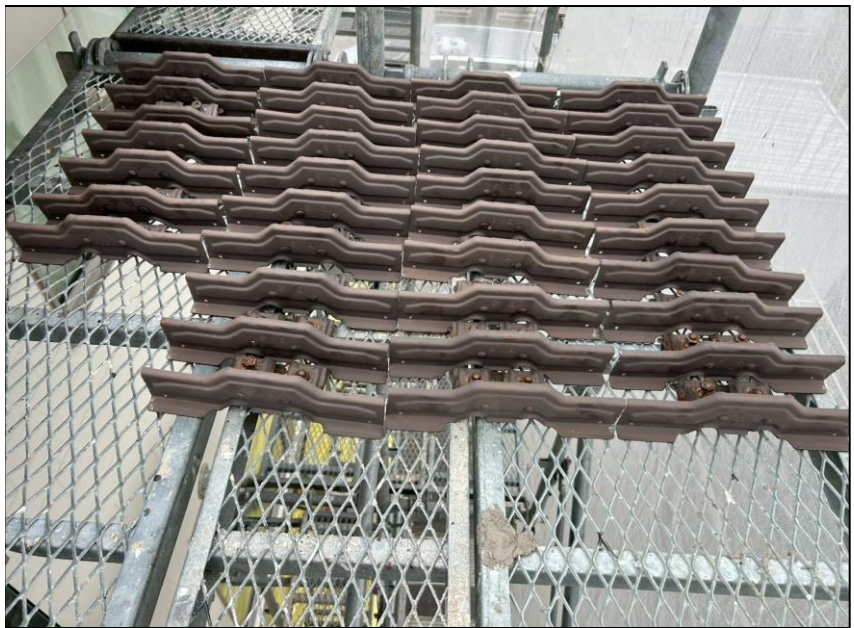

年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	屋根
使用材料	インパクトドライバー
工事内容	雪止め撤去
備考	完了




年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施




年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	破風
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	屋根、破風
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ 色: 赤さび色
工事内容	材料搬入 16 ^キ ×2セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料

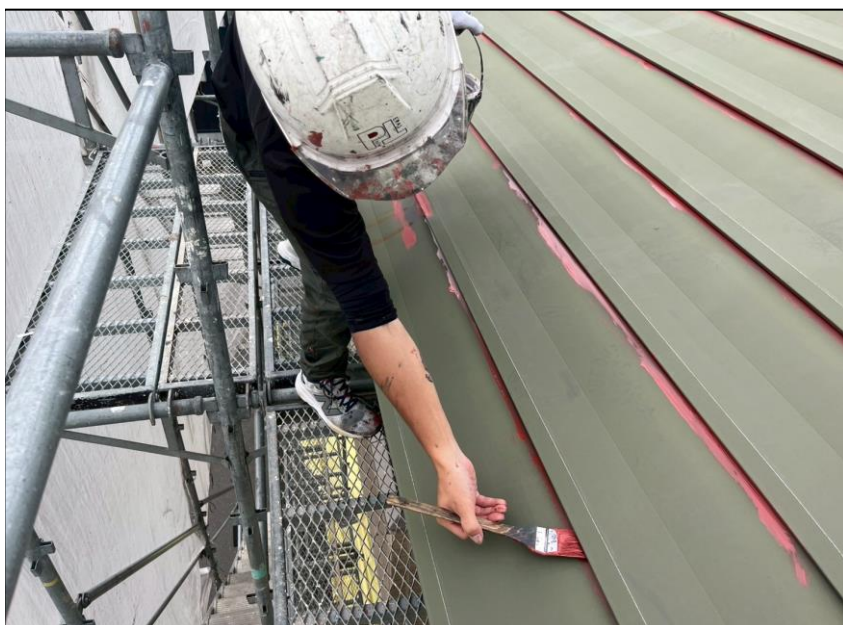


年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。

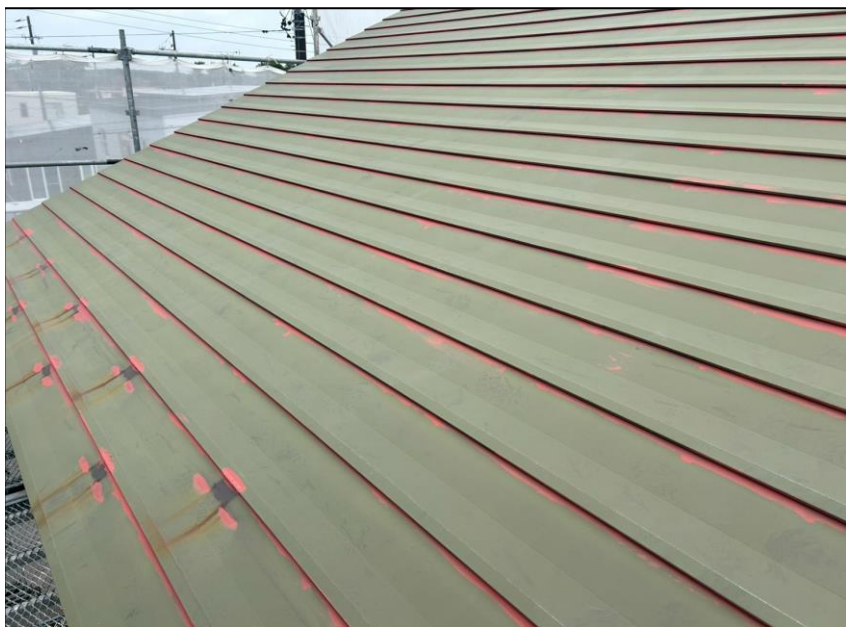

年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	先行塗り完了



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	

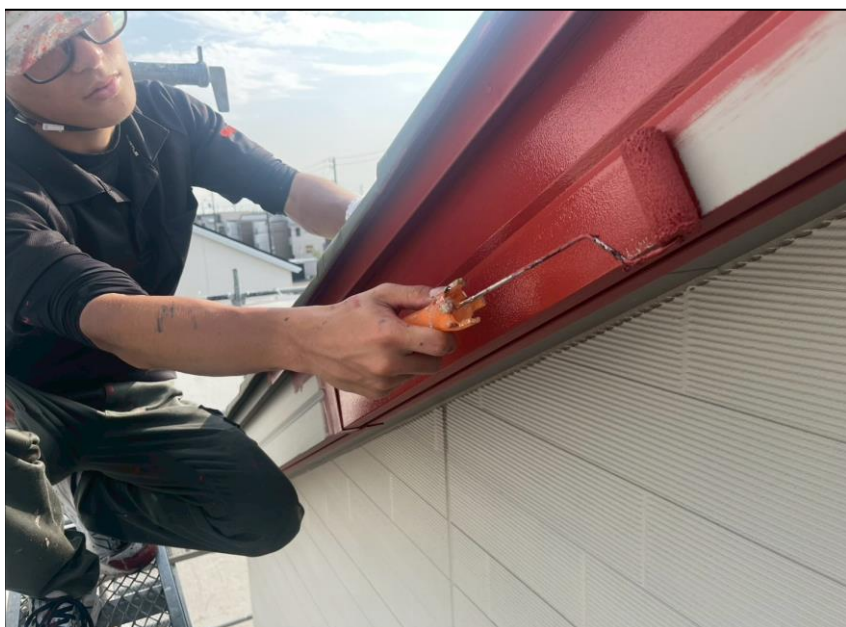

年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	破風
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	完了




年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	破風
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	完了




年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	屋根、破風
使用材料	ファインルーフSi 色番: コーヒーブラウン
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×2セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂トタン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用により、優れた耐候性及び耐久性を発揮します。



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	下塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと中塗り塗料を塗りこんでおります

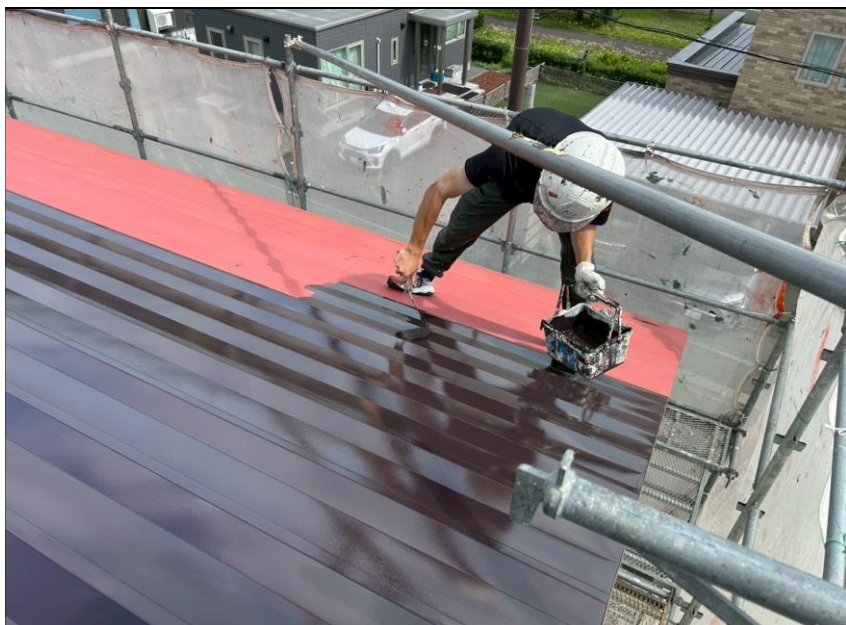

年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	

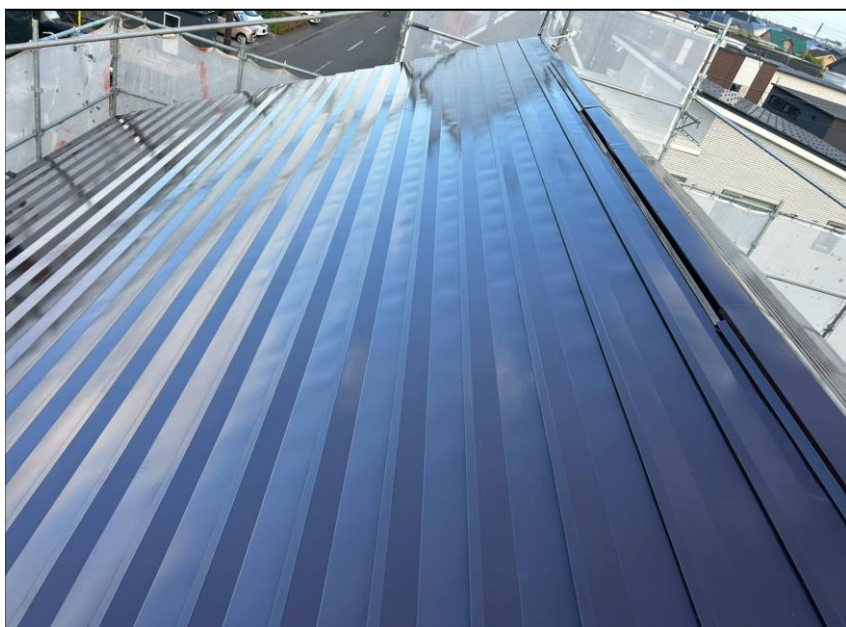

年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	完了



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSi 色番:マウンテングレー
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×1セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂ト タン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用に より、優れた耐候性及び耐 久性を発揮します。



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	




年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	破風
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	完了




年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	中塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。

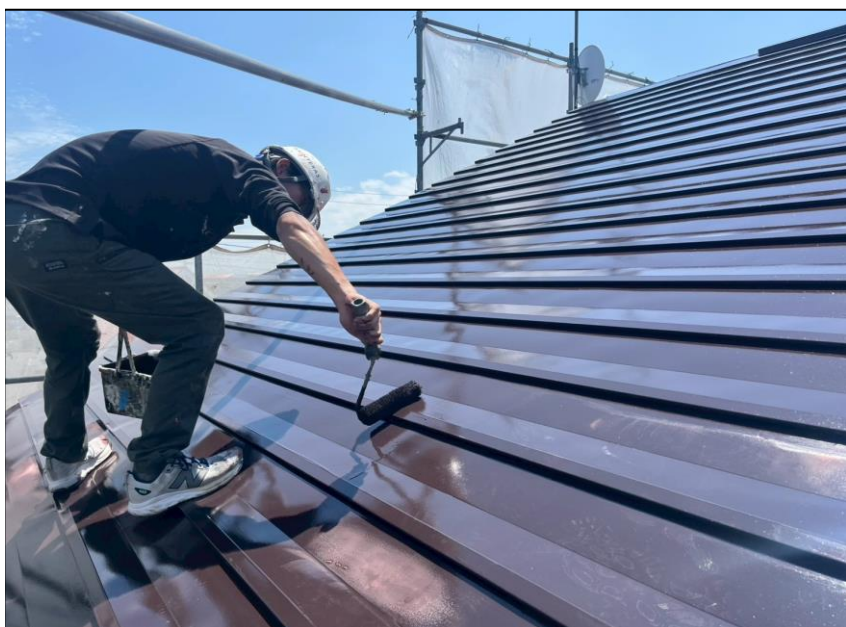

年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	破風
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	

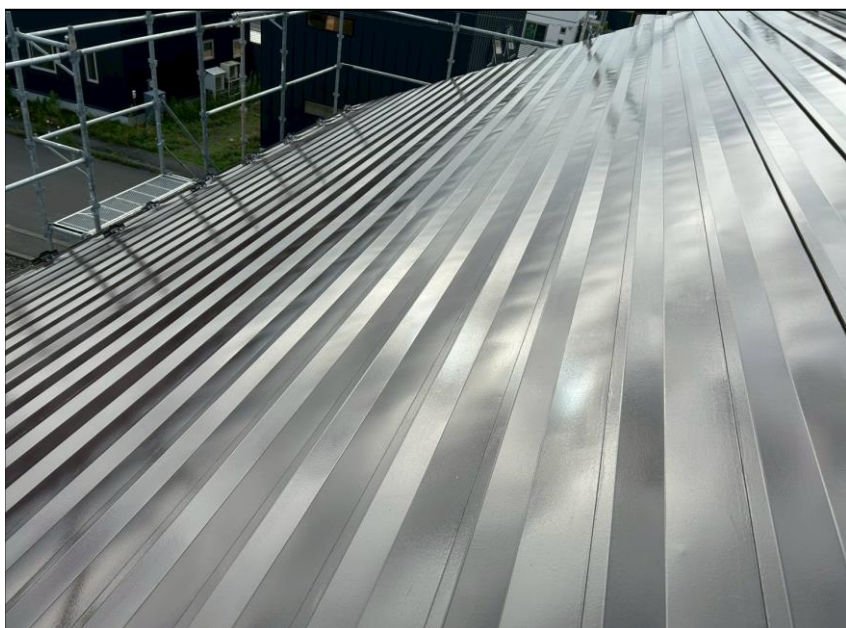

年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	屋根
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	破風
使用材料	ファイルーフSi
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2 色番:既存色合せ
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトSiクリアー
工事内容	材料搬入 15 ^{kg} ×4セット
備考	セラミック系外壁保護クリアー 高耐光性、紫外線吸収、超低汚染、防カビ性に優れているクリアー塗料材です。



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトSiクリアー
工事内容	下塗り
備考	

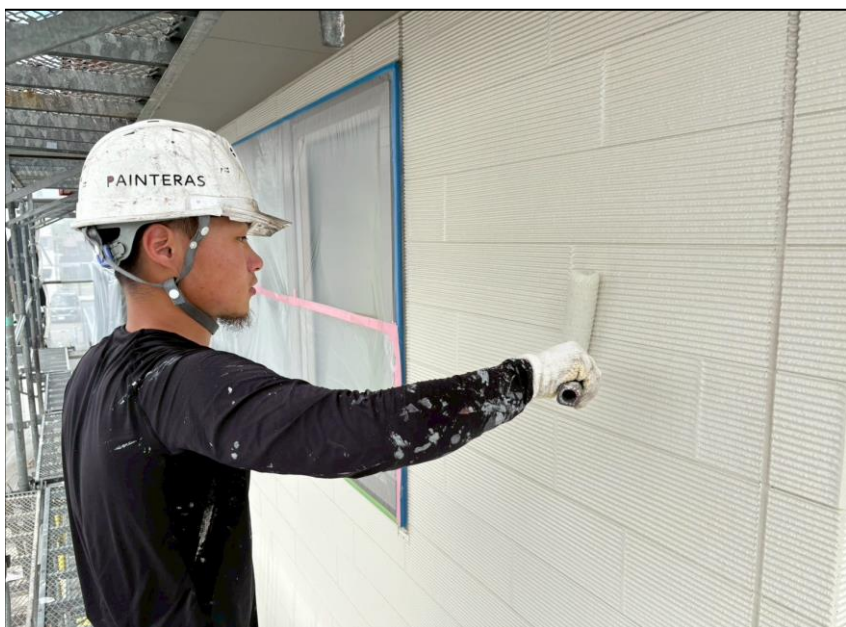

年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトSiクリアー
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトSiクリヤー
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	外壁
使用材料	UVプロテクトSiクリヤー
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番: 22-85C(3分艶)
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×3セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD型 シリコン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現 し、耐候性1種に相当する性 能を持つ塗料




年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	

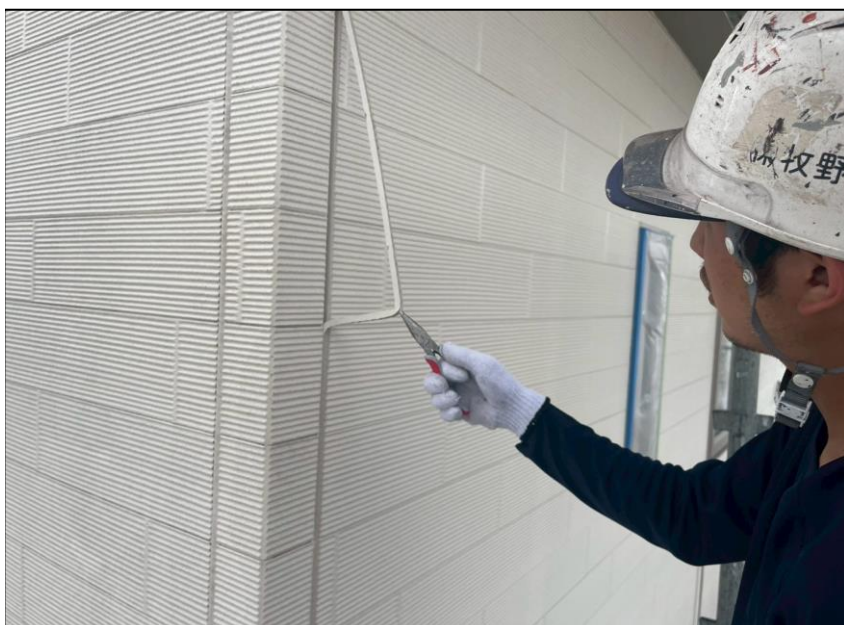

年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去中
備考	

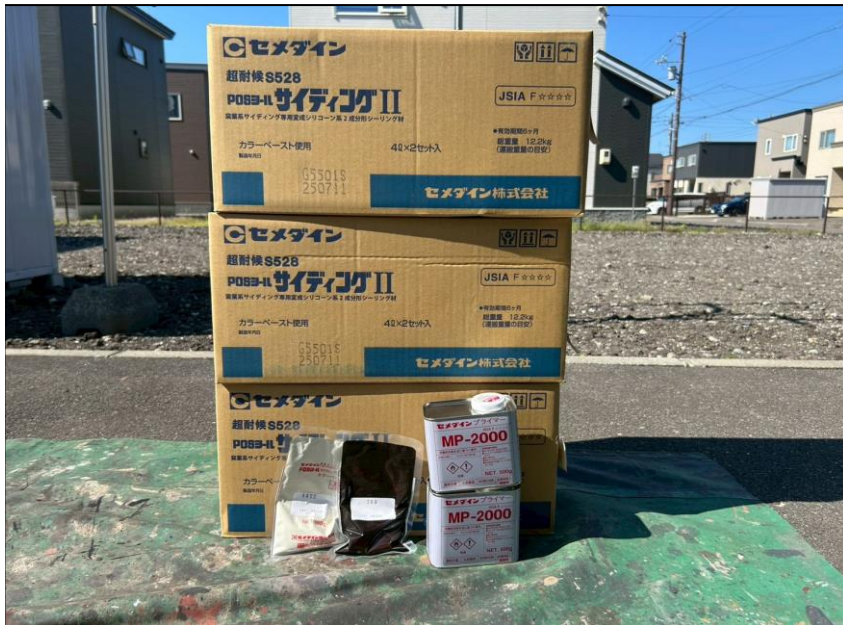

年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	外壁
使用材料	2液形編成シリコン樹脂コーキング 超耐候S528
工事内容	材料搬入
備考	4L×6缶 プライマー＝2缶 搬入



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	外壁
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗り
備考	



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	外壁
使用材料	超耐候S528
工事内容	コーキング材 充填
備考	



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	外壁
使用材料	超耐候S528
工事内容	コーキング材 へら押え(仕上げ)
備考	




年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	コーキング材 へら押え(仕上げ)
使用材料	
工事内容	コーキング材 へら押え(仕上げ)
備考	完了



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	外壁
使用材料	窓下水切り
工事内容	再取り付け
備考	完了



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	プロパン庫
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地処理 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施

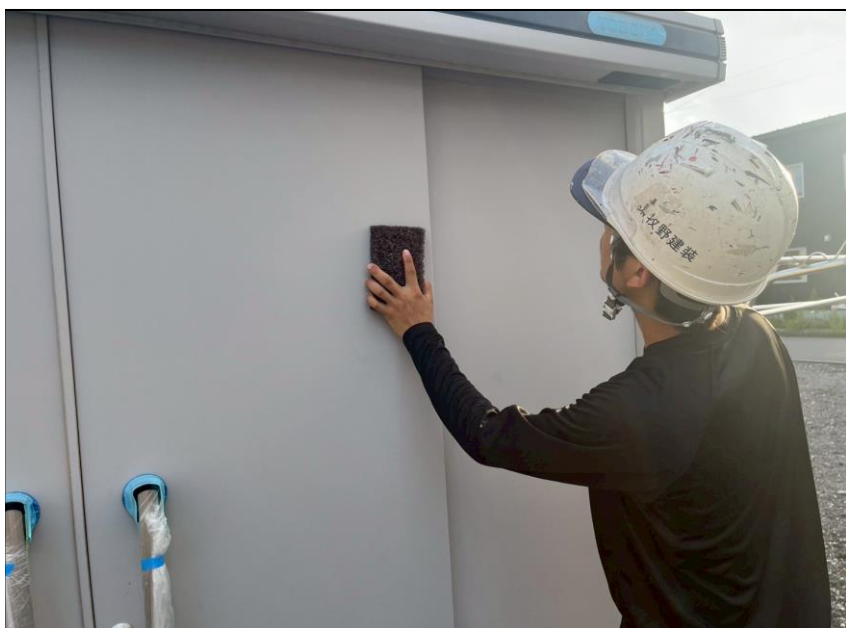

年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	物置
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地処理 (ケレン)
備考	同上



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	プロパン庫
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	物置
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	基礎
使用材料	ディスクサンドペーパー
工事内容	下地処理(ケレン)
備考	完了



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	物置
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	基礎
使用材料	水性ミラクシーラーエコ
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×1缶
備考	優れた耐水性、耐アルカリ性を示し、下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮します。 また、特殊設計により、防かび・防藻機能を発揮します。



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	基礎
使用材料	水性ミラクシーラーエコ
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	基礎
使用材料	キシエース
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×1缶
備考	シリコン系塗膜で低汚染性能とコンクリートの中性化抑制効果を発揮する高耐久の基礎部専用塗料



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	基礎
使用材料	キシエース
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	基礎
使用材料	キシエース
工事内容	上塗り
備考	上塗り



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	木製階段
使用材料	
工事内容	塗装前
備考	



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	木製階段
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	塗装後
備考	



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	窓
使用材料	カッター
工事内容	清掃
備考	全ての窓を清掃



年月日	2025. 7. 10～7. 31
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー
工事内容	清掃
備考	全ての窓を清掃



年月日	2025. 7. 31
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事完了
備考	




年月日	2025. 7. 31
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事完了
備考	



年月日	2025. 7. 31
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事完了
備考	PAINTERAS (株)牧野建装



Before



After-



PAINTERAS

株式会社牧野建装
