



年月日	2025.9.10
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施行前
備考	



年月日	2025.9.10
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施行前
備考	



年月日	2025.9.10
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施行前
備考	




年月日	2025.9.10
工事部位	全体
使用材料	くさび足場
工事内容	仮設足場設置
備考	完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄。



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	パラペット
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上

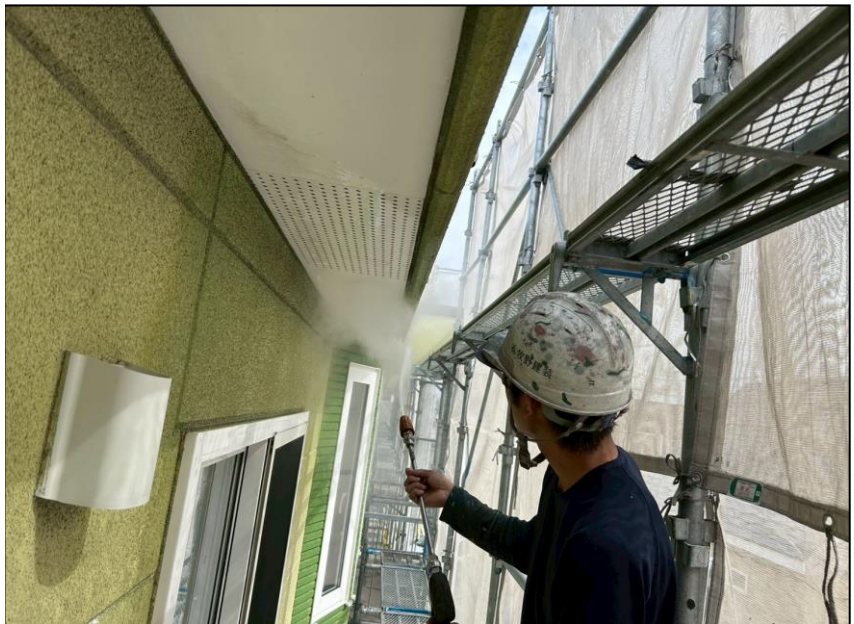


年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	軒天
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を洗浄



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、苔や藻などの不純物を洗浄



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	窓
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮など、窓についた汚れをを洗浄

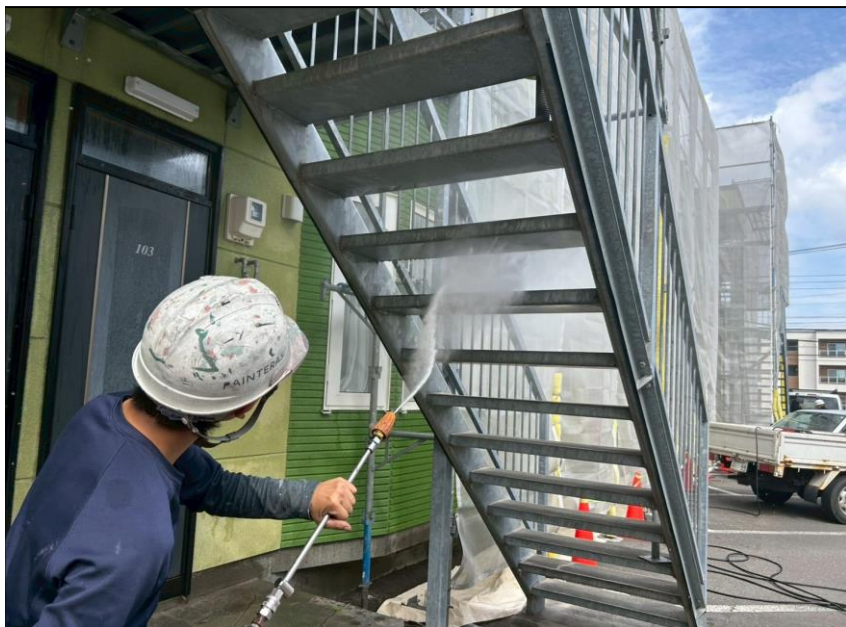

年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	階段
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの汚れをを洗 浄



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	基礎
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、苔や藻などの不 純物を洗浄




年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	物置
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業と共に、洗浄で落とせなかった不純物の除去の実施



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	パラペット
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	同上

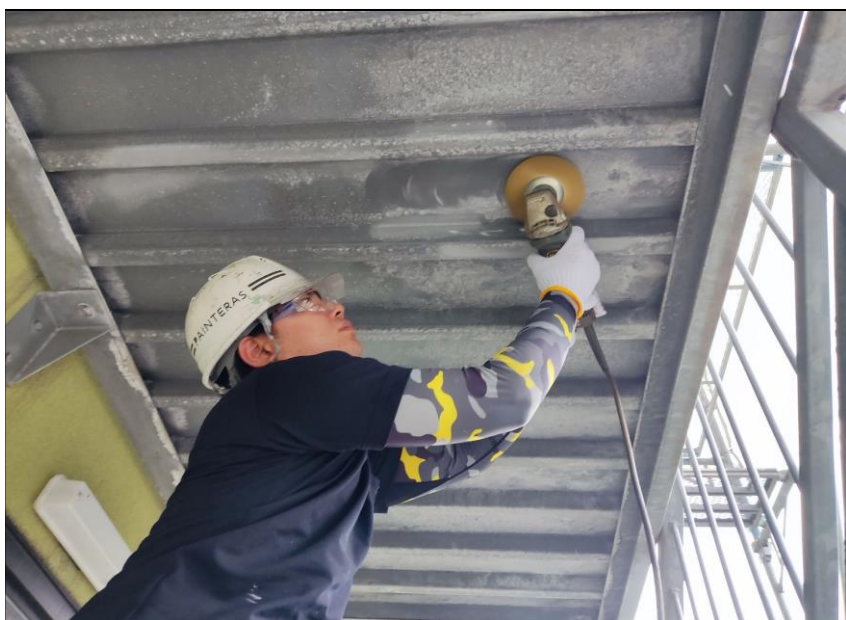

年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	階段(通路下)
使用材料	カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆びている箇所は電動工具を使用して錆び落としの実施




年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	階段(手摺)
使用材料	カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆びている箇所は電動工具を使用して錆び落としの実施




年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	物置
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業と共に、洗浄で落とせなかった不純物の除去の実施




年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	屋根、パラペット、破風
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ 色: 赤さび色
工事内容	材料搬入 16 ^{キロ} ×2セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料

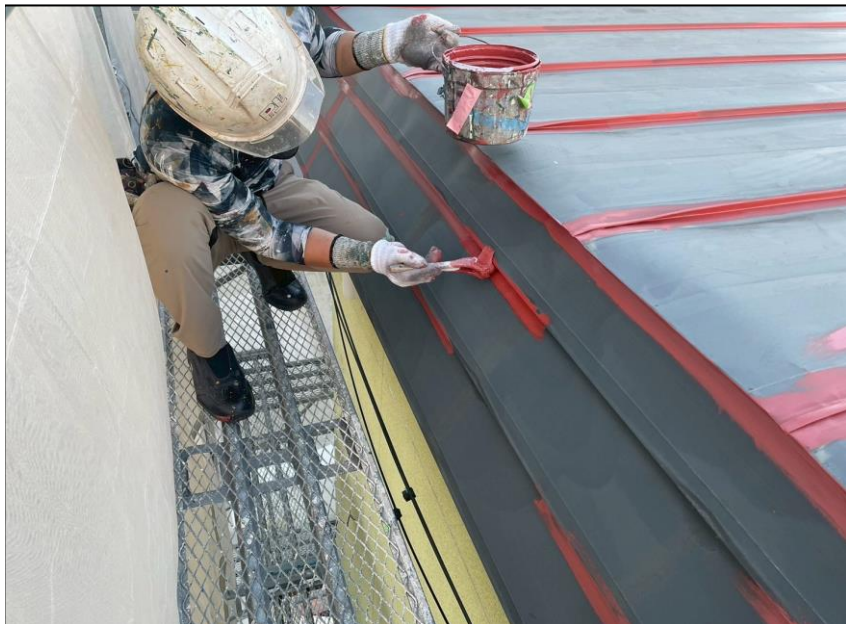

年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	パラペット
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	

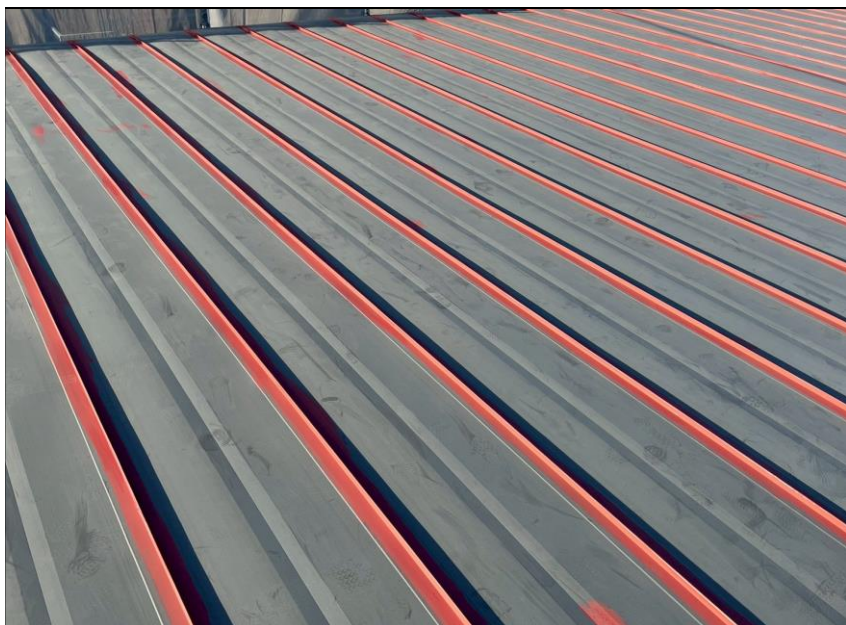


年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	1 番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為に施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。

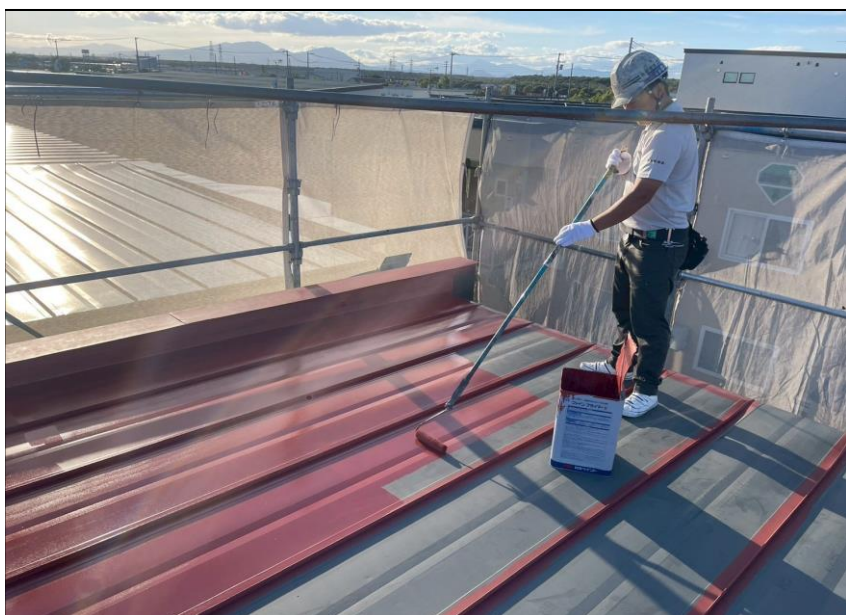

年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了

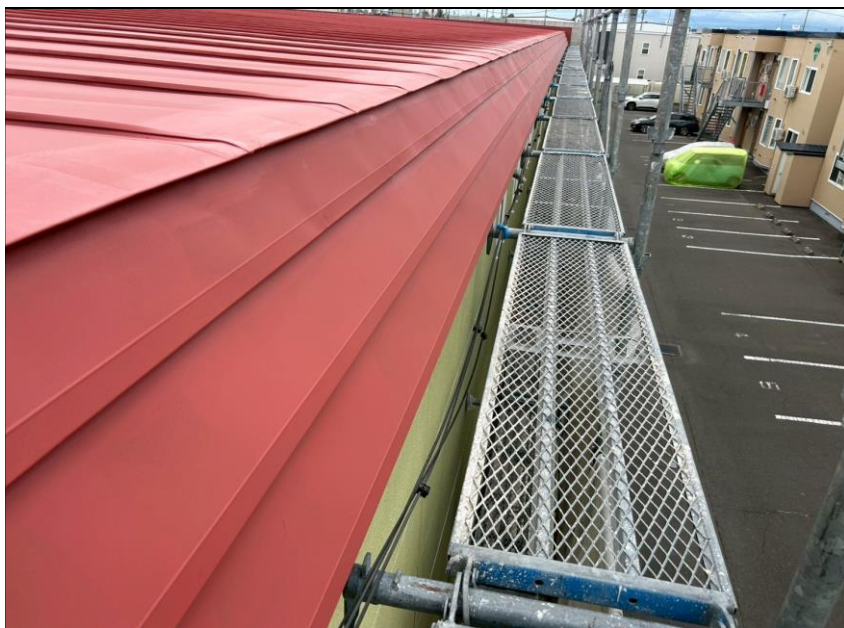

年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	パラペット
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	破風
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	物置
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了




年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	階段
使用材料	ハイポン20デクロ 色:ブラウン
工事内容	材料搬入 16 ^キ ×1セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂亜鉛メッキ下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる亜鉛メッキ下塗錆止め塗料



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	階段
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	階段
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	

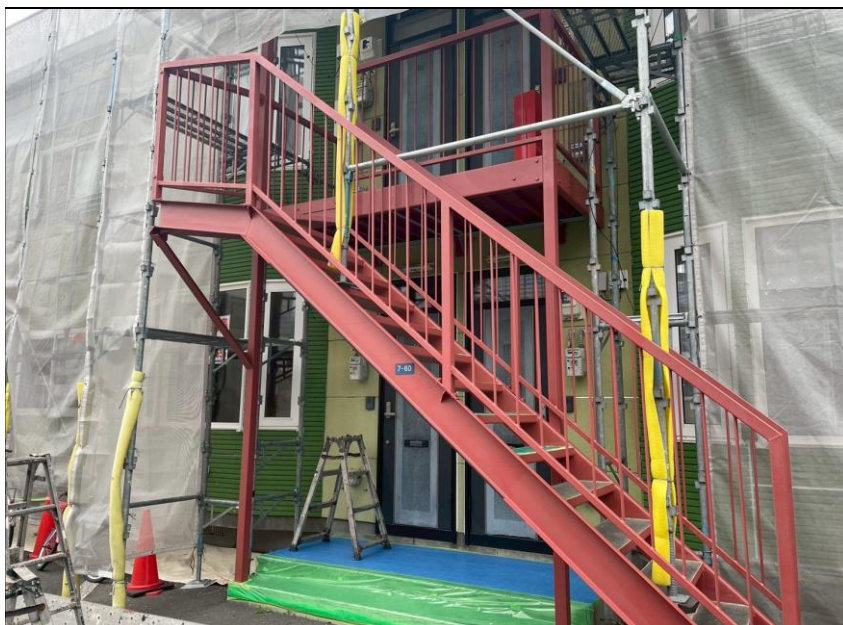

年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	階段
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	階段
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	錆びていた箇所は2回塗りしております



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI 色番:チャコールグレー
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×4セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂トタン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用により、優れた耐候性及び耐久性を発揮します。



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	下塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」をもしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。




年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	先行塗り完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	

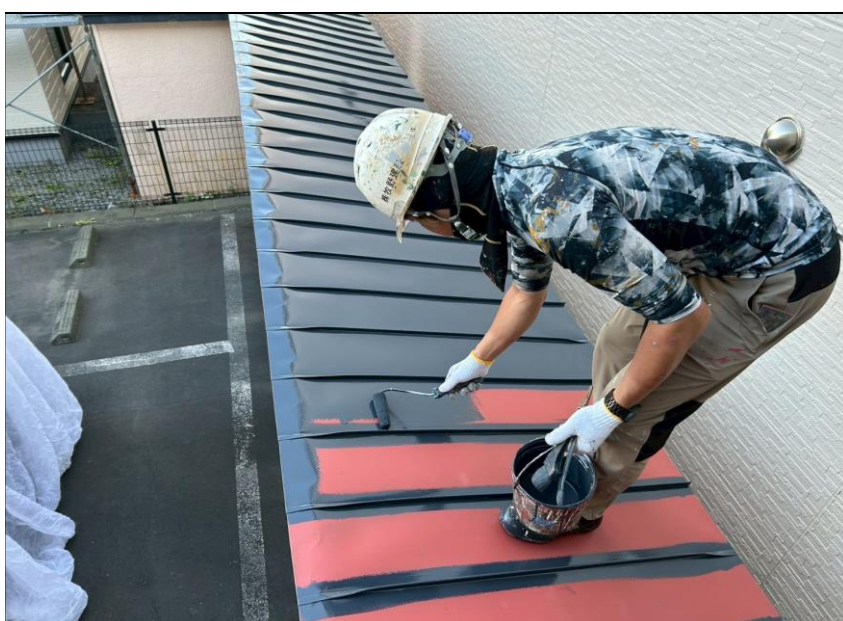


年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	物置
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	完了

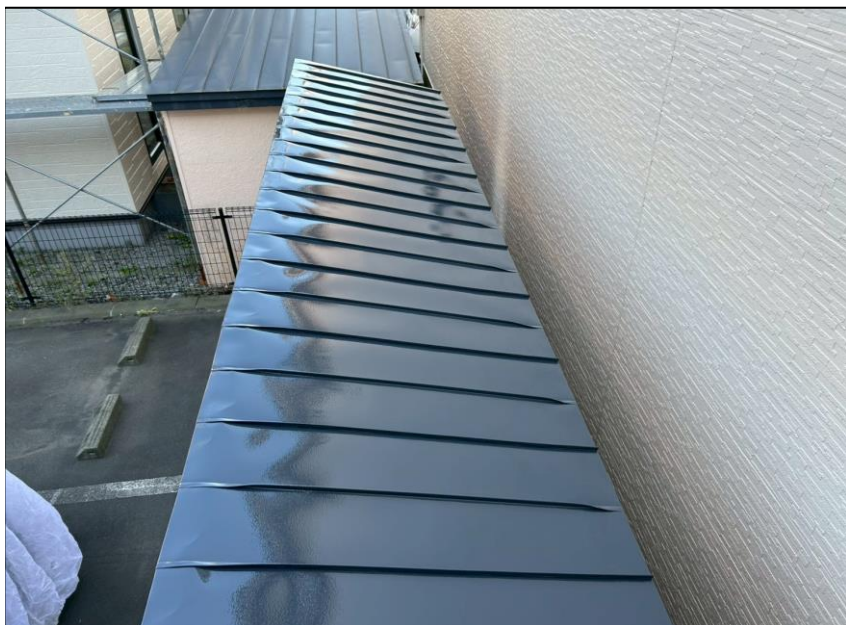

年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	物置
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	下塗り、中塗り作業同様、1 番錆びる箇所「板金面の折 り返し溝の中もしっかりと 上塗り塗料を塗りこみまし た。



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	




年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	階段
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	

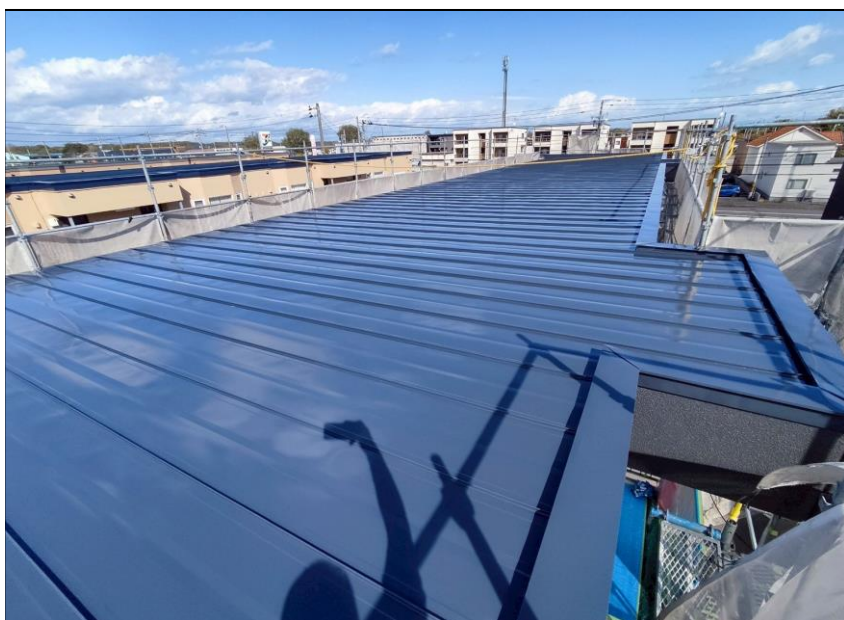

年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	パラペット
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	物置
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了

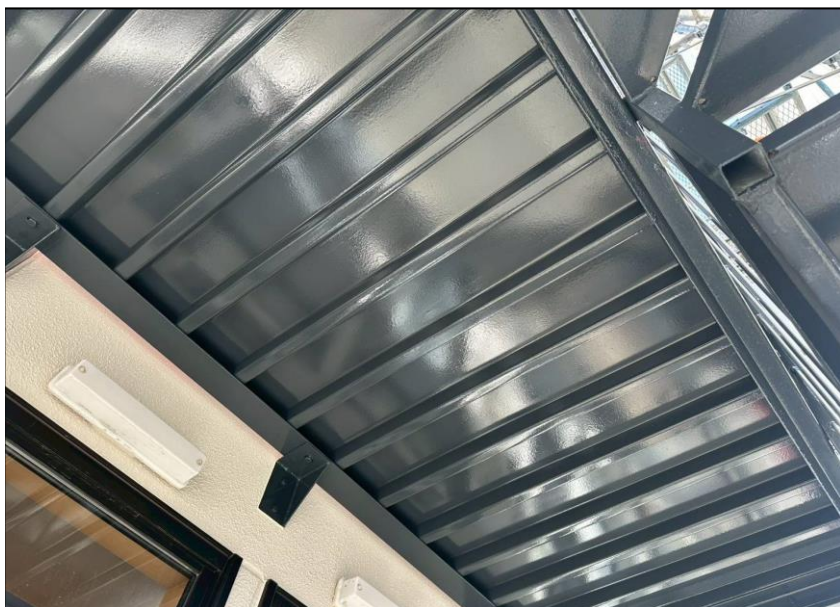

年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	階段(通路裏)
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了

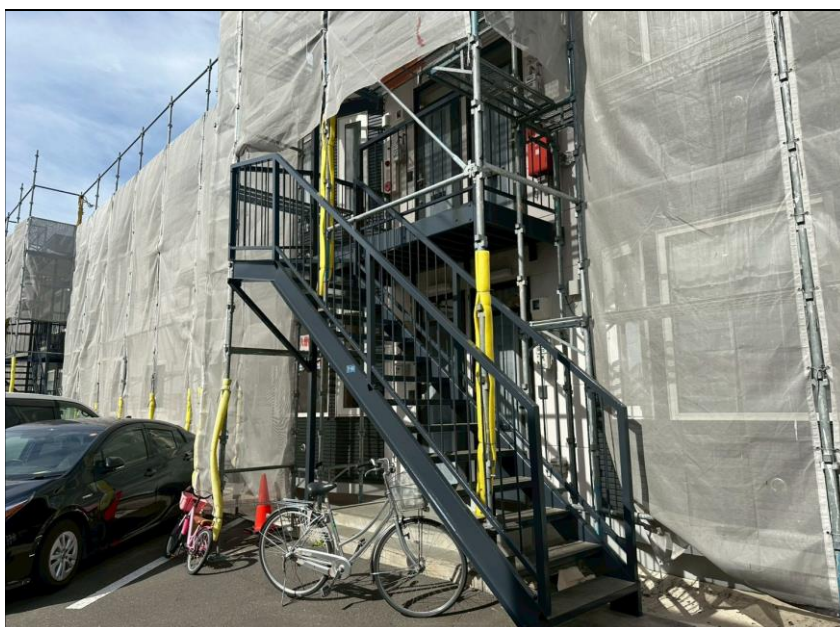

年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	階段(手摺、踏板)
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去
備考	外壁目地は傷んでいた箇所を打ち替えしております



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去
備考	窓周りは全て撤去し、打ち替えしております



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去
備考	完了

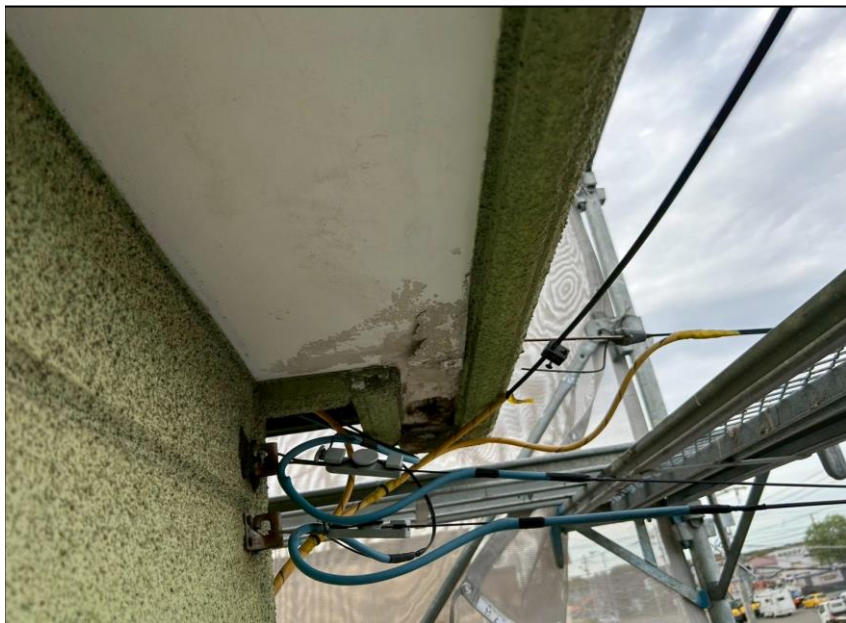

年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	軒天
使用材料	
工事内容	貼替前
備考	腐食して穴が開いている状態でした。



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	軒天
使用材料	
工事内容	既存ボード撤去
備考	完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	軒天
使用材料	11mmスレート板
工事内容	貼替
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁目地、窓周り
使用材料	2液形ウレタン樹脂コーキング
工事内容	材料搬入
備考	6L×6缶 プライマー＝4缶 搬入



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁目地、窓周り
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗布
備考	コーキングはプライマーを塗らないと外壁と密着しません。塗装の仕上がりに関係ない作業ですが、塗りが浅いと早期破断に繋がる為、確実に塗り込むように指導しております。



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁目地、窓周り
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁目地、窓周り
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁目地、窓周り
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	物置外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	物置外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	物置外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了




年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁
使用材料	水性ソフトサーフSG
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×16缶
備考	低汚染形高耐候性水系改修塗装システム ヘアクラックに追随する可とう形改修用仕上塗材E主材で、キメが細かいので、吸い込みが少なく、光沢のある仕上がりが得られます



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁
使用材料	水性ソフトサーフSG
工事内容	下塗
備考	




年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁
使用材料	水性ソフトサーフSG
工事内容	下塗
備考	

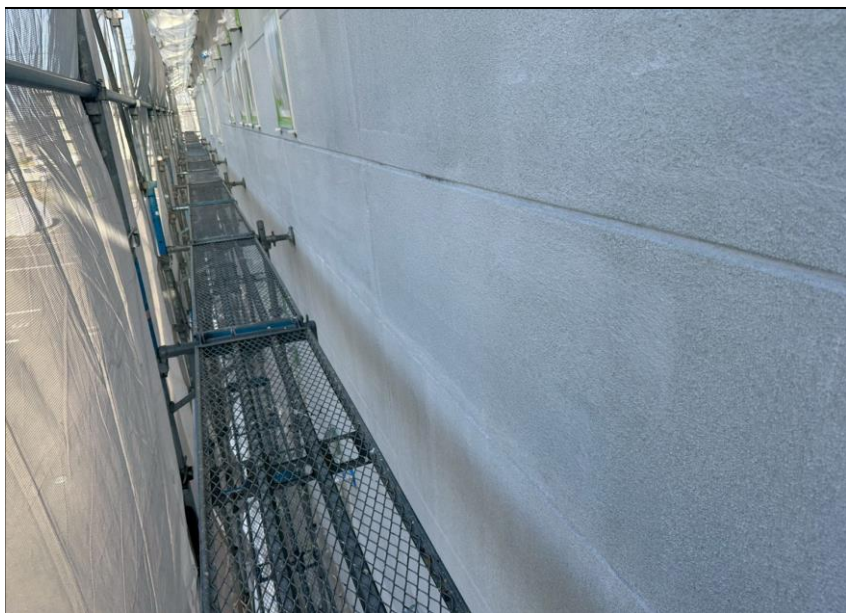


年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁
使用材料	水性ソフトサーフSG
工事内容	下塗
備考	完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁
使用材料	水性ソフトサーフSG
工事内容	下塗
備考	完了

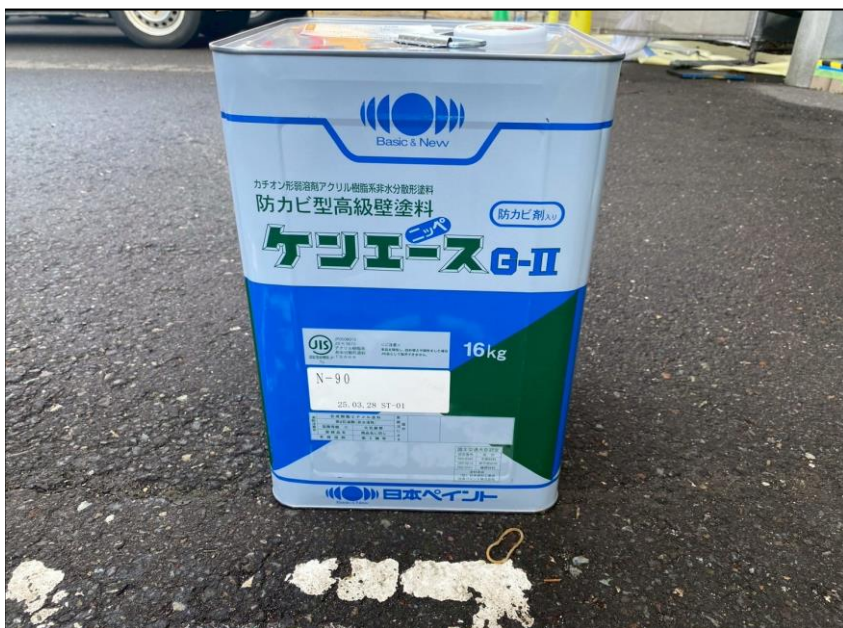

年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料

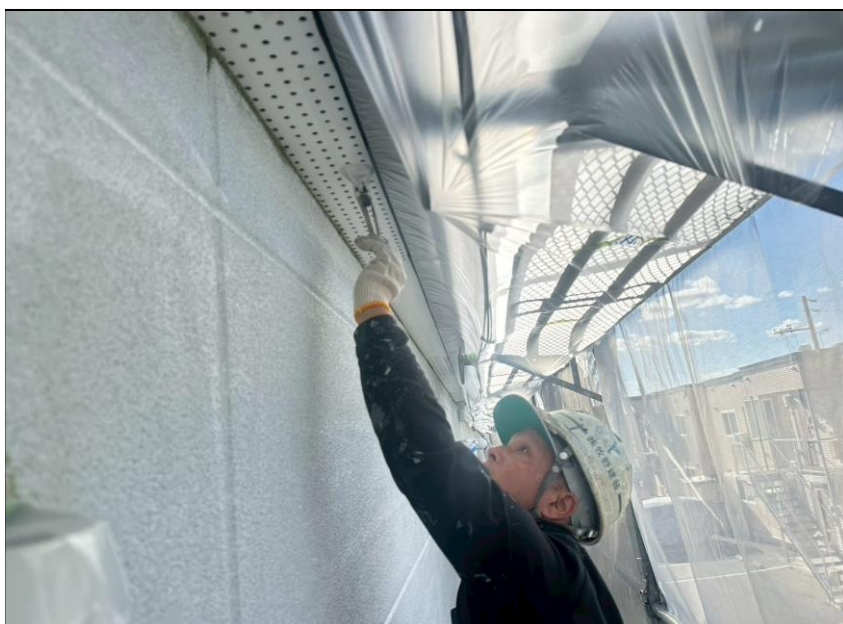

年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	貼り換え箇所、上塗り
備考	完了




年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番: 19-85A(艶あり)
工事内容	中塗り、材料搬入 16 ^キ ×6缶
備考	超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 強靱な塗膜は、超耐久性、超耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。




年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番: 19-85A(3分艶あり)
工事内容	中塗り、材料搬入 16 ^キ ×4缶
備考	同上




年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁(パラペット、出窓)
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番: N-25(3分艶あり)
工事内容	中塗り、材料搬入 16 ^キ ×2缶
備考	同上

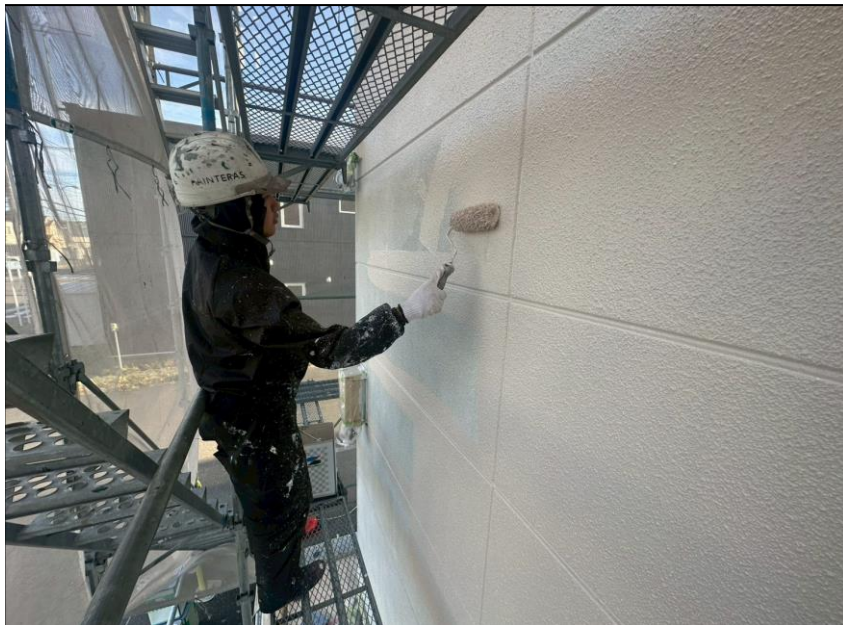

年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番:19-85A(艶あり)
工事内容	中塗り
備考	

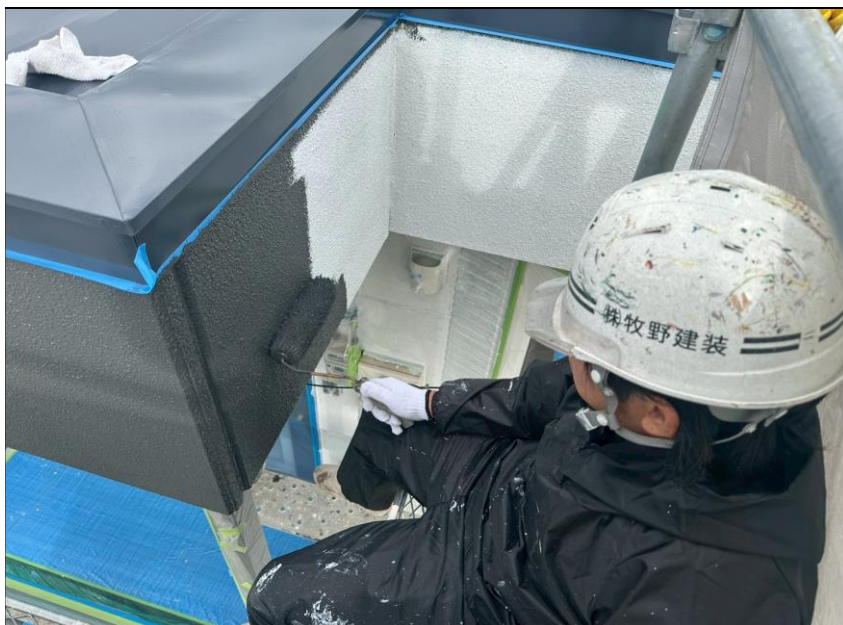

年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁(パラペット)
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番:N-25(3分艶あり)
工事内容	中塗り
備考	

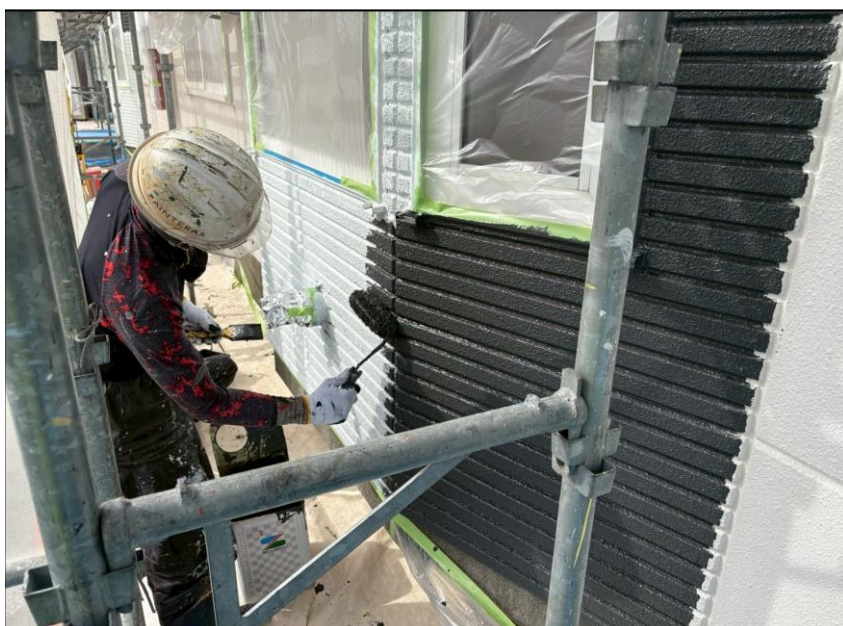


年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁(出窓)
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番:N-25(3分艶あり)
工事内容	中塗り
備考	




年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番:19-85A(3分艶あり)
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁(パラペット)
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番:N-25(3分艶あり)
工事内容	上塗り
備考	

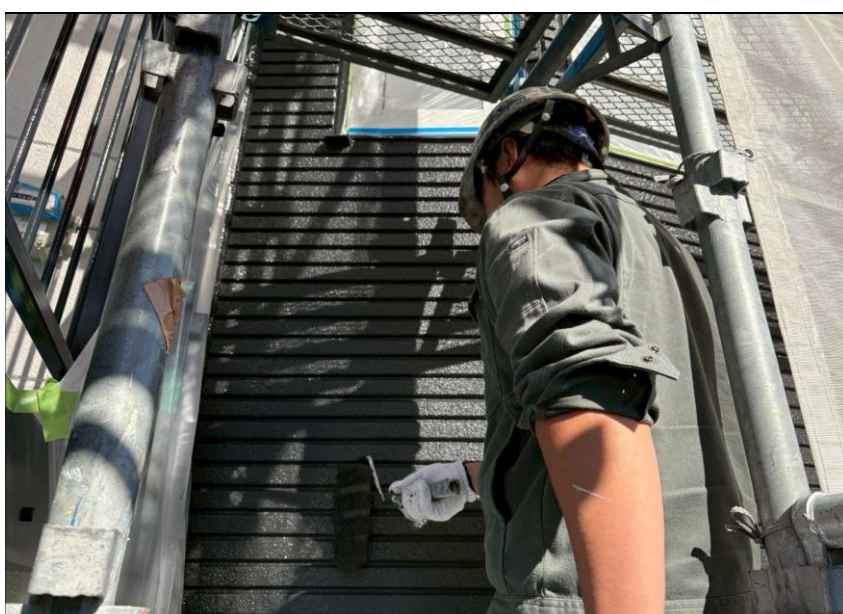

年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁(出窓)
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番:N-25(3分艶あり)
工事内容	上塗り
備考	

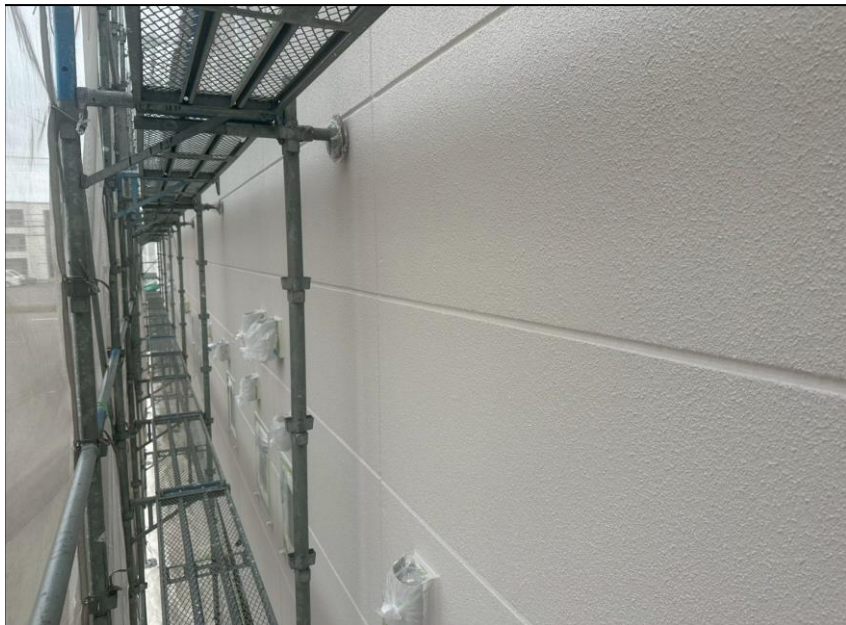

年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番:19-85A(3分艶あり)
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁(パラペット)
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番:N-25(3分艶あり)
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	外壁(出窓)
使用材料	エスケープレミアムシリコン 色番:N-25(3分艶あり)
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	火災報知器
使用材料	サンドペーパー #180
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	火災報知器
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	火災報知器
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	火災報知器
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	ホームタンク
使用材料	サンドペーパー＃180
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	ホームタンク
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	錆箇所補修塗り



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースG II
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースGⅡ
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースGⅡ
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースGⅡ
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	物置外壁
使用材料	UVプロテクトSiクリアー
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×4セット
備考	セラミック系外壁保護クリアー 高耐光性、紫外線吸収、超低汚染、防カビ性に優れているクリアー塗料材です。



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	物置外壁
使用材料	UVプロテクトSiクリアー
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	物置外壁
使用材料	UVプロテクトSiクリアー
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	物置外壁
使用材料	UVプロテクトSiクリアー
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	物置外壁
使用材料	
工事内容	塗装前
備考	



年月日	2025.9.10～10.15
工事部位	物置外壁
使用材料	
工事内容	塗装後
備考	高圧水洗浄で苔を綺麗に落とし、クリアーを2回塗りして外壁を保護しております




年月日	2025.10.15
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了




年月日	2025.10.15
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2025.10.15
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了

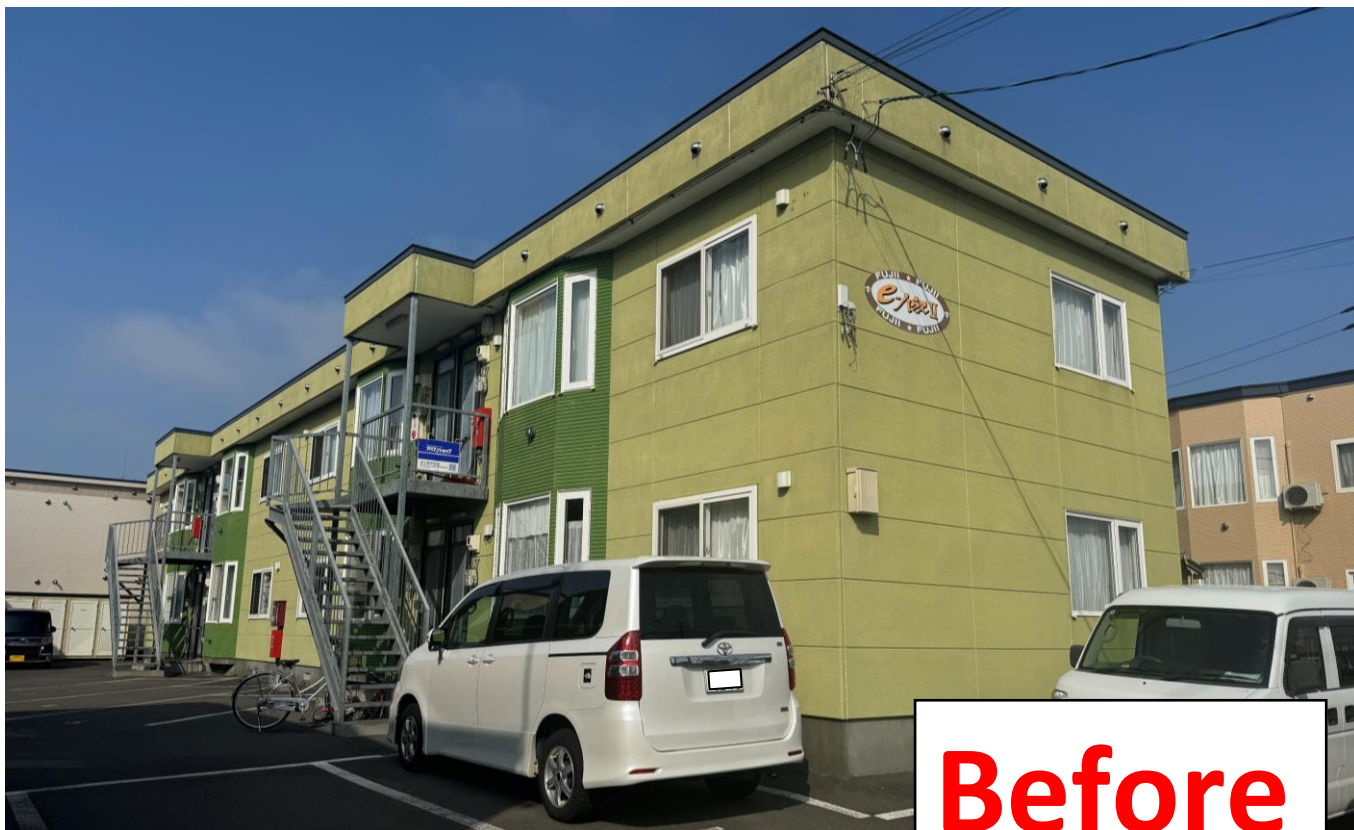

Before



After-



PAINTERAS
株式会社牧野建装

