年月日	2023. 9. 8
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	仮設足場設置
備考	

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 （ケレン）
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	破風
使用材料	サンドペーパー＃180
工事内容	下地調整 （ケレン）
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	階段裏
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 （ケレン）
備考	錆を落とすとともに、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄。

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	破風
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を清掃

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を清掃

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	窓
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの汚れを洗浄

年月日	2023．9．8～10．4
工事部位	土間
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	藻、苔などの不純物や汚れを洗浄。

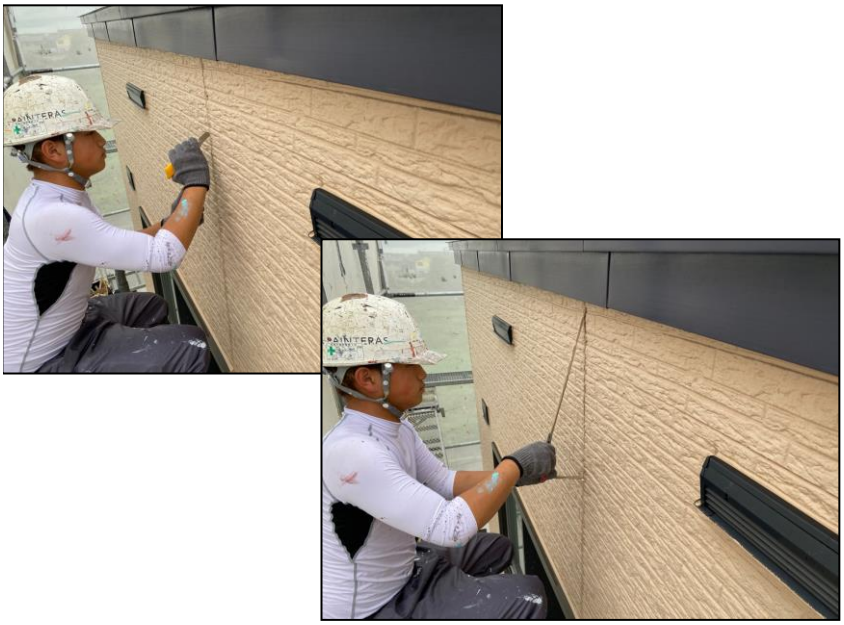

年月日	2023．9．8～10．4
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去中
備考	

年月日	2023．9．8～10．4
工事部位	外壁
使用材料	2液形ウレタン樹脂コーキング
工事内容	材料搬入
備考	6L×5缶 プライマー＝4缶 搬入

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	外壁
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗り
備考	

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え （仕上げ）
備考	

年月日	2023．9．8～10．4
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え （仕上げ）
備考	完了

年月日	2023．9．8～10．4
工事部位	屋根、破風
使用材料	ハイポン20クロ 色：赤さび色
工事内容	材料搬入 16㎏×1セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料

年月日	2023．9．8～10．4
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	錆箇所補修塗り 及び 先行塗り
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為に施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。

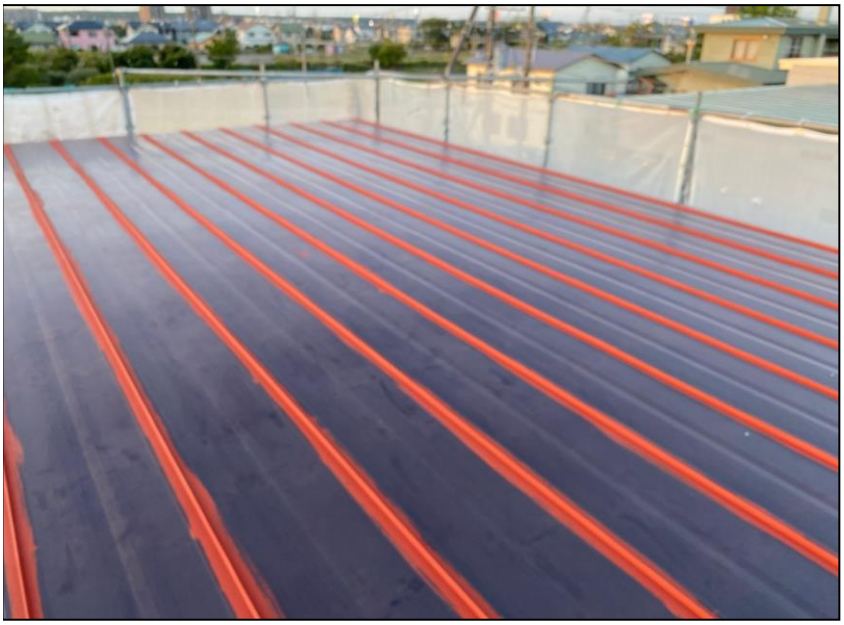

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	錆箇所補修塗り
備考	完了

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 （下塗り）
備考	

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	破風
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 （下塗り）
備考	

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 （下塗り）
備考	完了

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	破風
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 （下塗り）
備考	完了

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	物置屋根
使用材料	ハイポン20デクロ
工事内容	サビ止め塗装 （下塗り）
備考	完了

年月日	2023．9．8～10．4
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI 色番：チョコレート
工事内容	材料搬入 15㌔×2セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂トタン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用により、優れた耐候性及び耐久性を発揮します。

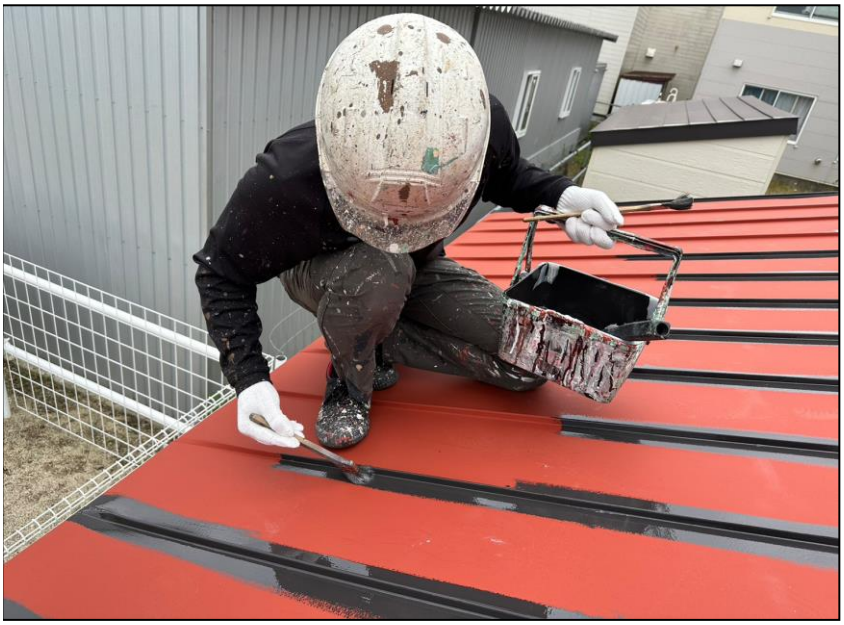

年月日	2023．9．8～10．4
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	サビ止め作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝のももしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。

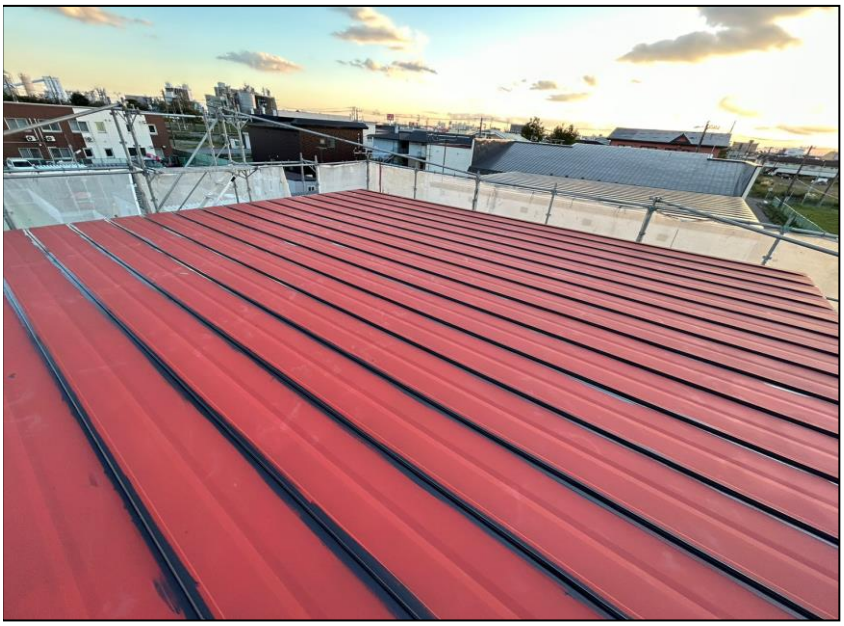

年月日	2023．9．8～10．4
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	先行塗完了

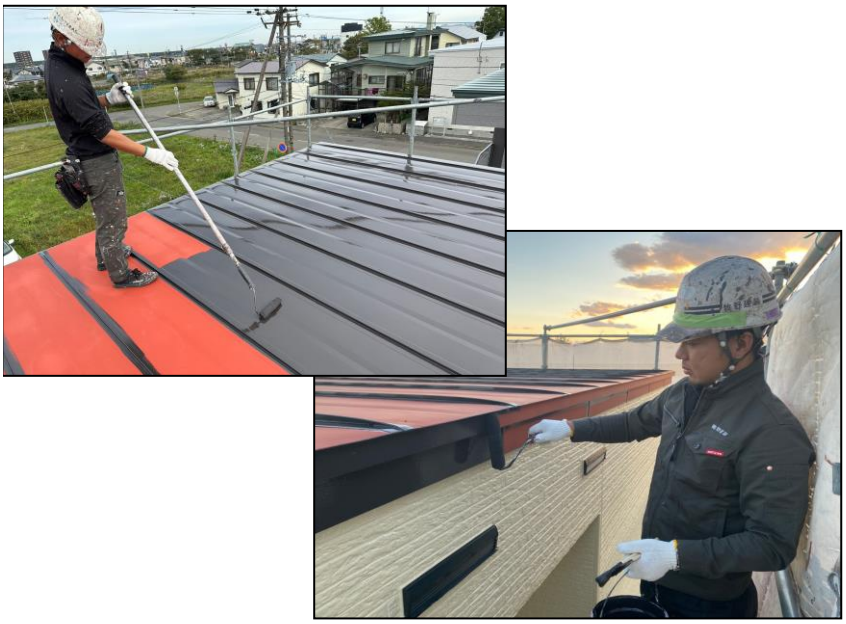

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	屋根、破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	物置屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	物置屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	外壁
使用材料	マイルドシーラーES
工事内容	材料搬入 16㌔×1缶
備考	特殊エポキシ樹脂 浸透、固着性が高く、下地の補強効果に優れている。旧塗膜との密着性が抜群に良い

年月日	2023．9．8～10．4
工事部位	外壁
使用材料	マイルドシーラーES
工事内容	下塗り
備考	

年月日	2023．9．8～10．4
工事部位	外壁
使用材料	マイルドシーラーES
工事内容	下塗り
備考	完了

年月日	2023．9．8～10．4
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料搬入 15㌔×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番：22ー80D
工事内容	材料搬入 15㎏×3セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD型っポリウレタン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で従来にない超低汚染を実現し、耐候性1種に相当する性能を持つ塗料

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	中塗り （上塗り1回目）
備考	

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	中塗り （上塗り1回目）
備考	

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り （上塗り2回目）
備考	

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り （上塗り2回目）
備考	

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り （上塗り2回目）
備考	完了

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り （上塗り2回目）
備考	完了

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	階段裏
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	錆止め塗装 上塗り塗装
備考	完了

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	塗装
備考	完了

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	物置
使用材料	
工事内容	塗装
備考	完了

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	ハイツ樽前NO.2
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	ハイツ樽前NO.2
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了

年月日	2023. 9. 8～10. 4
工事部位	ハイツ樽前NO.2
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了

Before

After-

PAINTERAS

株式会社牧野建装
